

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA

FECHA: Bogotá, 17 de junio de 2020

HORA: De 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR: Videoconferencia

ASISTENTES: Victor Garzón R. Profesional de Apoyo, Empresas Públicas de Cundinamarca, EPC.
Ruth A. Campuzano Profesional, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB.
Alberto Polo, Consultor ETC SAS.
Francisco Belmonte Sánchez, Interventoría Ibervias Ingenieros.
Sergio Andrés Rodríguez, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Ivonne Casas Duarte, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para el proyecto AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE DE LA SABANA DE OCCIDENTE Y TEQUENDAMA QUE TRANSPORTA AGUA SUMINISTRADA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, FASES I, II y IV

Se revisan los compromisos pendientes de la mesa de trabajo del 18 de marzo de 2020, para verificar el cumplimiento de cada uno y la fecha de la nueva programación para su cumplimiento.

DESARROLLO:


1. Se informa del oficio enviado a EPC, donde se evidencia el incumplimiento de los compromisos desde la primera mesa de trabajo del 12 de julio de 2019. Se aclara que se establecerán nuevas fechas de compromisos y que, de no cumplirse se procederá a hacer el segundo requerimiento para posterior devolución.
2. El ingeniero Francisco interventor de las Fases I, II y IV y diseñador de la Fase III informa que los diseños de la fase III se encuentran suspendidos.
3. A continuación se relacionan los compromisos sin cumplir y la fecha programada para entrega y la Fase a la que corresponden.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fechas programadas para compromisos				
		Mesa inicial del 12 de julio de 2019	Mesa del 26 de noviembre de 2019	Mesa del 10 de diciembre de 2019	Mesa del 18 de marzo de 2020	Mesa del 17 de Junio 2020
Radicación al Ministerio de vivienda de la solicitud radicada ante INVIAS, del permiso para intervención Vial.	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	26 de julio de 2019	Se recibe copia de acta de reunión	N/A	24 de abril de 2020	26 de junio de 2020
	Empresas Públicas de Cundinamarca	02 de agosto de 2019	Con INVIAS del 22/08/2019	N/A	24 de abril de 2020	
Entrega de versión final del presupuesto Fase I y Fase II	Consultoría ETC SAS	01 de agosto de 2019	Se programa mesa de trabajo 4 de dic de 2019	13 de enero de 2020	Sin fecha determinada por emergencia sanitaria	26 de junio de 2020
Radicación al Ministerio de Vivienda de la certificación de funcionalidad e integralidad de etapas anteriores de las que depende el proyecto.	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	09 de agosto de 2019	4 de diciembre de 2019	N/A	24 de abril de 2020	26 de junio de 2020
	Empresas Públicas de Cundinamarca	09 de agosto de 2019	4 de diciembre de 2019	N/A	24 de abril de 2020	
Radicación al Ministerio de vivienda de copia del contrato/convenio para la venta/suministro de agua en bloque por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	Empresas Públicas de Cundinamarca	14 de agosto de 2019	6 de diciembre de 2019	N/A	Mediante correo electrónico 19 de marzo de 2020	26 de junio de 2020
Radicación al Ministerio de vivienda los soportes prediales del diseño Fase I y avance Fase IV	Empresas Públicas de Cundinamarca	14 de agosto de 2019	6 de diciembre de 2019	N/A	08 de mayo de 2020	26 de junio de 2020
Radicación al Ministerio de vivienda de la solicitud radicada ante la ANI, del permiso para intervención de corredor férreo.	Empresas Públicas de Cundinamarca	14 de agosto de 2019	6 de diciembre de 2019	N/A	27 de marzo de 2020	26 de junio de 2020
Radicación al Ministerio de vivienda de la solicitud radicada ante la Secretaria Distrital de Ambiente, del permiso de ocupación de cauce Fase I y cruce con cuerpo de agua (subfluvial) y Humedal Guali Fase II	Empresas Públicas de Cundinamarca	14 de agosto de 2019	6 de diciembre de 2019	N/A	27 de marzo de 2020	26 de junio de 2020
Radicación al Ministerio de vivienda de la solicitud radicada ante la Secretaria Distrital de Planeación, de la Certificación que acredite con relación a la	Empresas Públicas de Cundinamarca	13 de	6 de diciembre	N/A	03 de abril de 2020	26 de junio de 2020

ubicación y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollara acorde POT, PBOT, EOT vigente y no existe impedimento para la construcción del mismo.		septiembre de 2019	de 2019			
Verificación de servidumbre con el IDU de la franja de la tubería en el cruce: Puente de la virgen Calle 17 Fase I	Empresas Públicas de Cundinamarca	N/A	13 de diciembre de 2019	N/A	08 de mayo de 2020	26 de junio de 2020
Radicación de respuesta de Lista de Chequeo de la Fase II	Empresas Públicas de Cundinamarca	N/A	13 de diciembre de 2019	N/A	24 de abril de 2020	26 de junio de 2020
Radicación de respuesta de Lista de Chequeo de la Fase IV	Empresas Públicas de Cundinamarca	N/A	N/A	N/A	8 de mayo de 2020	24 de julio de 2020

4. Registro fotográfico

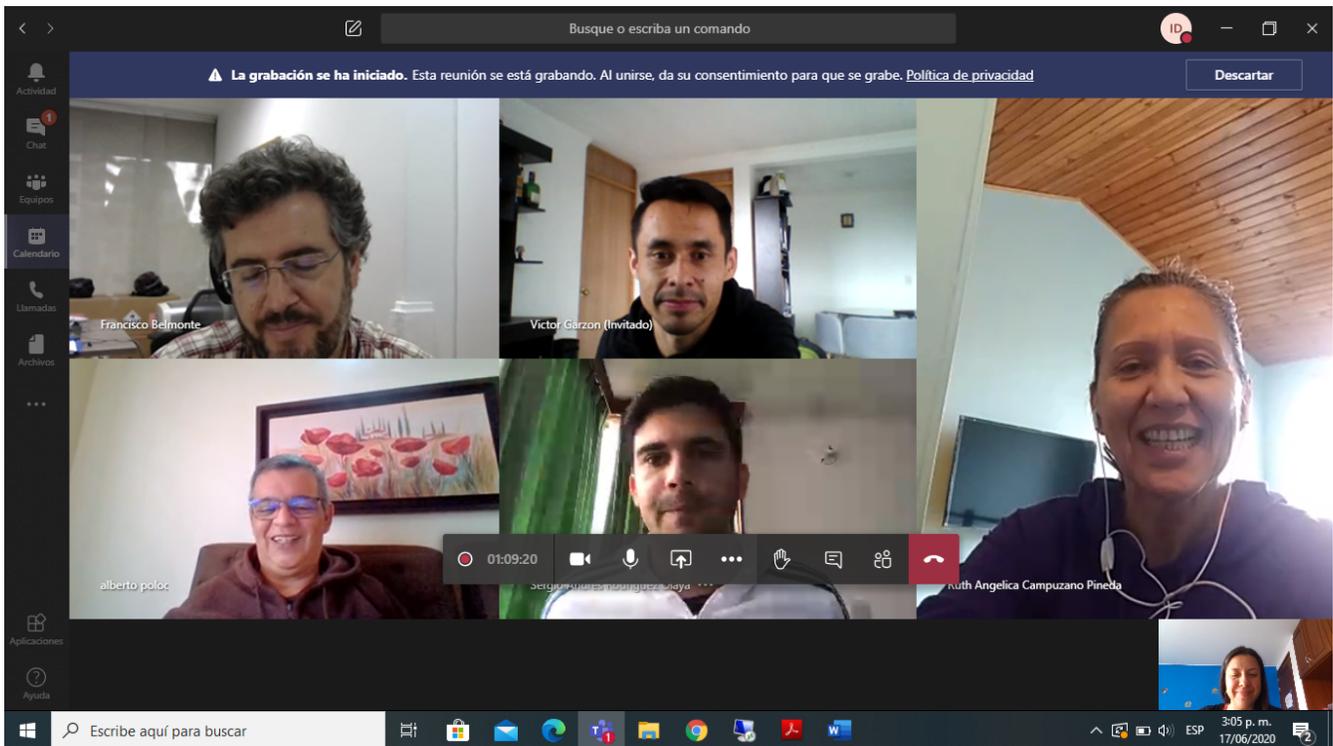

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez
Ivonne Casas Duarte
Fecha: 17/06/2020
