

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 17

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 25 de enero de 2022
HORA:	De 16:00 a 16:42 horas
LUGAR:	Virtual (Microsoft Teams)
ASISTENTES:	<p>Carlos Jair Forero, R.L. Consultoría del proyecto</p> <p>Cristian Alejandro Murcia, Consultoría del proyecto (Ingeniero de apoyo)</p> <p>Armando Rodríguez, Consultoría del Proyecto</p> <p>Jaime Alberto Gutiérrez, Administración Temporal de la Guajira</p> <p>Ghisel Alcira González Grey, Contratista Evaluador Líder SDP DIDE VASB MVCT</p> <p>Sergio A. Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder SDP DIDE VASB MVCT</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Antecedentes
3. Objeto de la reunión: Seguimiento a los avances a los ajustes solicitados.

Proyecto: **OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION METESUSTO-BARRANCAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA CONTINUO AL MUNICIPIO DE BARRANCAS.** Estado: En evaluación documental con observaciones y faltantes.

Proyecto **CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO - LA GUAJIRA** (*anteriormente denominado CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA, OPTIMIZACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN "METESUSTO", OPTIMIZACIÓN PTAP "EL POZO" Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO - LA GUAJIRA).* Nota: *el nombre sujeto a verificación por observación y exclusión de unos de los componentes inicialmente considerados y debe legalizarse mediante radicado).* Estado: En requerimiento, mesas de trabajo y lista de chequeo (Evaluación Etapa 3).

4. Conclusiones y Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes. Se cuenta con asistencia de representantes de la Administración Temporal de La Guajira (AT APSB), la Consultoría y los evaluadores de los proyectos del asunto.
2. Objeto de la reunión: Seguimiento a los avances a los ajustes solicitados de los proyectos del asunto. La reunión fue solicitada por representantes de la Administración Temporal de La Guajira (AT APSB)
3. Intervención de los asistentes
 - a. El ingeniero Jaime Alberto Gutiérrez (Administración Temporal de la Guajira) solicita a los asistentes información respecto al estado de los proyectos radicados en el mecanismo de viabilización del MVCT.
 - b. Respecto a lo anterior, los ingenieros Ghisel González y Sergio Rodríguez (Evaluadores MVCT) comentan sobre cada uno de los proyectos como sigue a continuación:

La Ingeniero Ghisel González menciona sobre el proyecto **OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION METESUSTO- BARRANCAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA CONTINUO AL MUNICIPIO DE BARRANCAS**, que este se encuentra actualmente en el estado de evaluación documental, y con observaciones y faltantes que no han sido subsanado. Por lo anterior, el proyecto no ha podido ingresarse al mecanismo de viabilización bajo la modalidad por requerimientos (como fue requerido por el formulador del proyecto). Revisada la ultima verificación de ajustes se evidenció que las varios de las observaciones y faltantes identificados persisten, como lo son:

- Carta de presentación sin firma
- Certificados y documentos con fechas desactualizadas
- Formato de resumen sin firmas
- Documentos técnicos y planos firmados por interventoría
- Entre otras ampliamente descritas en lista de chequeo y discutidas en mesa de trabajo de 11 de octubre de 2021, como por ejemplo: disponibilidad del servicio, complemento con informes y cálculos de diagnóstico y diseño enfocados en la problemática y aspectos institucionales respecto a la prestación del servicio orientada a la regulación de usuarios planteada con el proyecto.

Se podrá contemplar que la actualización de fechas de las certificaciones se realice en el proceso de evaluación por requerimientos, por lo que se consideraría el ingreso al mecanismo de viabilización con esa anotación. Sin embargo, el resto de documentaciones y claridades deben complementarse para poder continuar con el proceso.

El ingeniero Sergio Rodríguez procede a realizar recuento del proceso que ha surtido el proyecto a la fecha respecto al proyecto **CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO - LA GUAJIRA**, donde se destaco lo siguiente:

- Previo a la radicación del proyecto se asistió a la ET respecto a requisito de presentación y recomendaciones generales, según fue solicitado.
- El proyecto fue radicado por etapas, surtida la verificación de evaluación preliminar (Etapa 1) y presentación ante del comité técnico de esta verificación (Etapa 2). Por la recomendaciones de ese organismo, y los ajustes solicitados se aplazó la decisión de continuar con la Etapa 3 (verificación detallada de los diseños) hasta que se entregue los faltantes y se verifique el cumplimiento de lo solicitado de evaluación del proyecto.
- Las recomendaciones del comité técnico fueron las siguientes en resumen: **a.** No se considera pertinente el componente de optimización El Pozo, dado que no se cuenta con la justificación técnica, la concesión de aguas vigente, no es clara la capacidad de la fuente de abastecimiento y no corresponde a una optimización puesto que no hay ampliación del sistema, sino reemplazo de unos de los módulos y mantenimientos que no son objeto de financiación; **b.** Sobre la estación elevadora, se recomendó la inclusión de sistemas de control de caudal y presión, y medición en línea de conformidad con lo requerido por la normativa técnica; **c.** Incluir informe ejecutivo en el proyecto del asunto, sobre proyecto complementario a presentarse ante el MVCT, que incluye acciones y controles a implementarse sobre la conexiones ilegales, además del análisis técnico que corresponda; y **d.** Se solicita claridad sobre las fuentes de financiación sobre la infraestructura existente construida y se aporte los certificados que correspondan.
- En respuesta a las recomendaciones del comité técnico (anterior punto) el formulador manifestó: **a.** Exclusión del componente que no se considera pertinente; **b.** Inclusión de informe ejecutivo, sobre proyecto complementario presentado en el MVCT (Barrancas), sobre acciones y controles a implementarse sobre la conexiones ilegales, además del análisis técnico que corresponda; y **c.** Se aportó soporte sobre fuentes de financiación.
- En Sesión 52 del comité técnico de proyectos del 16 de septiembre de 20201 - Etapa 2 que corresponde al resultado de evaluación Etapa 1 (Evaluación Preliminar), se aprobó que el proyecto pasase a la Etapa 3, que corresponde a la evaluación integral y detallada del proyecto. El comité del proyecto solicitó se tenga en cuenta y se de claridad sobre lo siguiente: **a.** La viabilidad del proyecto del asunto debe ir de la mano y ser coherente con el proyecto **OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION METESUSTO- BARRANCAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA CONTINUO AL MUNICIPIO DE BARRANCAS**, que busca regular y legalizar las conexiones que se presentan a lo largo de la conducción; **b.** Aclarar sobre fuentes de financiación o aportes de los dos proyectos; se considera que el operador y/o el municipio pueda aportar; **c.** Que se presente plan, acciones a corto y largo plazo, y cronograma del operador sobre acciones tendientes a identificar, solucionar y controlar la problemática sobre conexiones irregulares; y **d.** Se aclare sobre la facturación actual que tiene el Municipio y si se esta pagando el servicio, puesto que es el entendido que con la baja continuidad no se estaría pagando este y quien está asumiendo la operación.
- Mediante oficio de referencia 2020EE0103602 de 30/11/2020 se informa al Municipio el ingreso al mecanismo de viabilización del MVCT. Mediante oficio 2021EE0112780 de 14/09/2021 se solicitan ajustes al proyecto y se anexan listas de chequeo (verificación Etapa 1 y Verificación integral Etapa 3) .

- Se han realizado mesa de trabajo donde realiza exposición de observaciones, revisiones y pendientes, al igual que se han remitido correos electrónicos al respecto.
- En últimas conversaciones con representantes de la consultoría y de la Administración Temporal, se menciona que esta pendiente la verificación por parte de la interventoría que a la fecha persiste y se desconoce cuando se realice esta; previo a la entrega y/o radicación de ajustes es necesario que los proyectos cuenten con la verificación y aprobación de la interventoría.
- Se reitera sobre requisito institucional, donde se aporte e identifiquen las acciones por parte de la ET y operados que solucionen la problemática actual de conexiones irregulares que afectan a la infraestructura existente, y que también se de garantías que con la implementación del proyecto garantice la funcionalidad del mismo. La Ing Ghisel González complementa comentado sobre la pertinencia de vincular al operador al proyecto, presentar la documentación requerida, e invitar a esta entidad a próximas mesas de trabajo


c. Interviene el Ing. Carlos Jair Forero (Director de la consultoría), quien expresa que las atenciones de la observaciones se han realizado y que está pendientes la verificación y aprobación de la interventoría, reiterando lo comentado por los evaluadores de los proyectos del asunto. Solicita el consultor a representantes de la Administración Temporal que se aveigue sobre el estado de las verificaciones por parte de la interventoría.

d. El ingeniero Jaime Alberto Gutiérrez (Administración Temporal de la Guajira) expresa que ante las inquietudes y comentarios expresados sobre las observaciones y faltantes de los proyectos expresados, averiguará estado de los mismos e informará. Se compromete el día Lunes 31 de enero a informar mediante correo electrónico sobre estado de las verificaciones por parte de la interventoría de los proyectos del asunto, y del que esta en revisión documental sobre los pendientes y faltantes que permitan completar los requisitos para el ingreso al mecanismo de evaluación de proyectos.

4. En la reunión no se concreta respecto a entrega de pendientes de los proyectos del asunto, sin embargo se informará el 31 de enero de 2022 sobre el estado de los mismos. Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de los ajustes solicitados al proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO - LA GUAJIRA: documentales, legales, ambientales, técnicos, institucionales, prediales e institucionales.	Carlos Jair Forero, Consultoría del proyecto Jaime Gutiérrez, Admon. Temporal Guajira PDA.	No se comprometen con fecha de entrega, deberá verificarse estado de la revisión con la

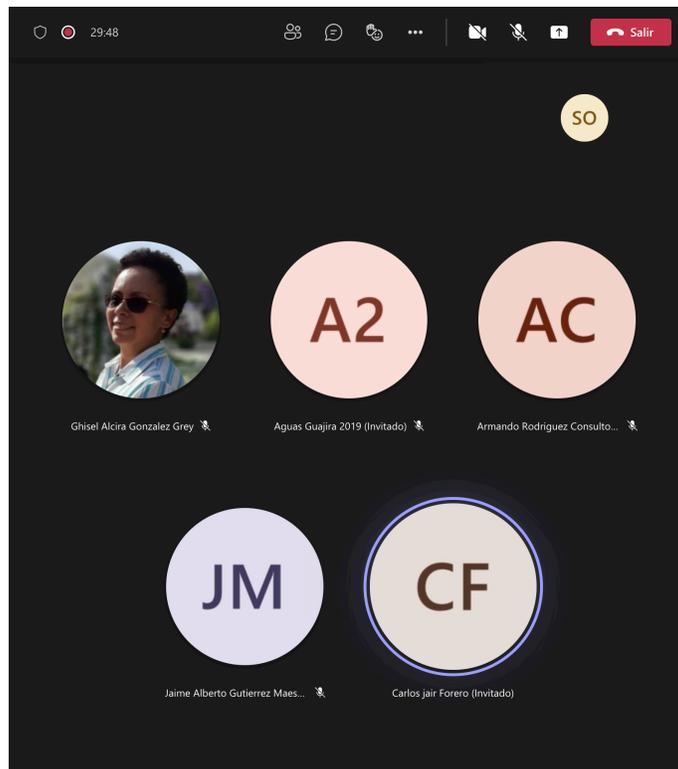

Elaboró: Ghisel Alcira González Grey / Contratista MVCT
Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista MVCT
Fecha: 25-01-2022
