

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 6 de mayo de 2022
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:30 a.m.
LUGAR:	Virtual Microsoft Teams ¹
ASISTENTES:	<p><u>Empopamplona</u> -Arq. Alexander Araque-Jefe de Planeación -Mauricio Flórez -Jefe de Obras</p> <p><u>Contratista de Obra</u> -William Arias – Director Proyecto de Obra -Kelly Parada Residente de Obra</p> <p><u>Contratista de Interventoría</u> -Guillermo Rojas – Representante Interventoría -Yhossen Blanco - Residente de Interventoría</p> <p><u>MVCT</u> -Patricia León Botón – DPR-VASB</p> <p>Se anexa lista de asistencia</p>
INVITADOS:	-----

ORDEN DEL DIA:

- Presentación asistentes
- Descripción detallada del avance de obra: Comparación con las actividades específicas del proyecto y el cronograma de obra. Avance de obra en porcentaje - Presentan Contratistas de obra e interventoría
- Dificultades o alertas identificadas por las partes.
- Actividades de supervisión desarrolladas
- Definición de fecha para visita a campo de seguimiento
- Conclusiones y compromisos

DESARROLLO:

- ✓ Se realiza presentación de cada uno de los asistentes.

¹ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTcwZTEwMDMtYzM0OS00MDQzLTg1YTItYjNjNmVINzISOTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d
 En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

- ✓ Empopamplona SA ESP, presenta el avance del proyecto con la descripción y detalle los siguientes aspectos:

- Antecedentes del Convenio 1122 de 2021
- Protocolo para la Gerencia de Proyectos en el marco de la Reactivación Económica
- Se informan datos relevantes del Convenio y de los Contratos
- Se informa que Empopamplona contrato un profesional para ejercer la supervisión del contrato de interventoría.
- Las fechas de inicio del contrato son del 22 de marzo de 2022 y de terminación del 22 de octubre de 2022.
- Se describe el esquema general del proyecto, esquema de diseño y se informa que al final de la obra se entregará el Manual operativo.
- Se describen las actividades y alcance del proyecto
- La Empresa se encuentra en proceso de contratación de los suministros de tubería y de suministro de equipos y maquinaria.
- Empopamplona SA adicionará el contrato de interventoría para incluir la interventoría a suministros.
- No se han realizado pagos a ninguno de los contratistas de obra o interventoría
- Avance físico del 3,33% con corte al 30 de abril de 2022.
- Se presenta el estado de avance del proyecto por hitos del proyecto

- ✓ El Ing. William Arias y la Ing. Kelly Parada por parte del contratista de obra informan el avance del contrato de obra describiendo los siguientes aspectos:

- Datos generales de los contratos de obra e interventoría.
- Relación del personal del contratista de obra y de interventoría

- ✓ La Ing. Patricia León manifiesta con preocupación que en la presentación del personal del contratista de obra no se relaciona el especialista del geotecnista de obra, dada la importancia de este componente en el proyecto, pues el muro de contención que garantizará la vida útil del proyecto requiere de especialistas en geotecnia para su adecuada construcción y verificación de la estabilidad de la obra conforme a los diseños que se presentaron para la viabilización del proyecto. Así mismo, el proyecto contempla la instalación de instrumentación geotécnica que debe ser verificada y avalada por el respectivo profesional. Adicionalmente, es necesario contar con dicho profesional dado que en la interventoría se cuenta con el mismo y requiere del respectivo par. Por lo anterior, se solicita a Empopamplona SA ESP, en su calidad de contratante realizar las gestiones respectivas para contar con el profesional en geotecnia por parte del Contratista de obra.

- El Ingeniero William Arias y Empopamplona manifiestan que se contratará el respectivo profesional y que se está a tiempo de realizar su contratación para que ejerza las actividades respectivas frente a la construcción del muro de contención y demás subactividades que requieran de esta especialidad.

- ✓ La Ing. Kelly Parada continua con la descripción del avance de obra con las siguientes actividades:

- Adecuaciones preliminares: señalización de obra

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

- Adecuaciones de tierras y de fondo para el vaso de disposición final
- Canales rectangulares 1*1 e=0,10

- ✓ La Ing. Patricia León recomienda revisar los porcentajes de obra de cada una de las actividades que hacen parte del avance de obra dado que se observan varias inconsistencias.
- ✓ La Ing. Kelly Parada continúa describiendo que el avance general de obra programado con corte al 30 de abril de 2022 es del 3% y ejecutado 2,25%.
- ✓ El Ing. William Arias manifiesta que se han tenido varios días de gran lluvia en la región que han retrasado las actividades iniciales de movimiento de tierras.
- ✓ El Ing. Mauricio Flórez manifiesta que se adelantarán las obras necesarias en estas semanas que se espera mejores condiciones climáticas según reportes del IDEAM.
- ✓ Patricia León pregunta por el concepto de la interventoría respecto al avance de obra y de la contratación del especialista en geotecnia por parte del contratista de obra, así como los ensayos de verificación de la capacidad de soporte del suelo y de los materiales que conformarán el muro de contención en tierra armada.
- ✓ El Ing. Guillermo Rojas representante legal de la Interventoría, manifiesta que se tienen las mismas consideraciones que ha manifestado el MVCT. Se realizará una reprogramación de obra y se realizará una reunión con el contratista de obra para conocer los pares técnicos. En cuanto a la construcción del muro de tierra armada no se ha dado inicio como tal. Se informa que la actividad que tiene más avance son las adecuaciones del componente 1 que es para la construcción del vaso norte.

Se informa que en efecto hay un retraso de obra que obedece a condiciones climáticas y que con el fin de lograr la ejecución total se propondrá ajustar el cronograma de obra de aquellas actividades que están al final como el cerramiento de obra que no tiene precedentes de obra.

Así mismo, a través de cada uno de los especialistas se solicitarán las pruebas de campo necesarias.

- ✓ El Ing. William Arias aclara que actualmente se trabaja en labores de excavación y que no se ha llegado a las cotas de diseño, pues faltan aproximadamente 3 metros y por tal motivo no ha sido necesario la toma de muestras para la verificación de la capacidad portante.
- ✓ Patricia León aclara que en efecto los ensayos y las verificaciones de las condiciones geomecánicas de los materiales son de manera especial para la construcción del muro de contención, dadas las particularidades de diseño y de los materiales con los cuales se diseñó dicha estructura. Se recomienda tener de referencia el diseño del muro y las condiciones geomecánicas de los materiales.

 La vivienda y el agua son de todos	Minivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
		PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
			Código: GDC-F-01

-El Ing. Mauricio Flórez manifiesta que en efecto las condiciones manifestadas están incluidas en las especificaciones técnicas del proyecto contratado.

-El Ing. William Arias manifiesta que se realizarán las verificaciones que correspondan y se tomarán los Proctor para establecer el grado de densidad de compactación.

- ✓ Patricia León pregunta si ¿la valla informativa del proyecto ya fue instalada?
-Se informa que ya se cuenta con el diseño definitivo y está en adecuación y ploteo del mismo para lograr instalarla lo más pronto posible. Se informa que se verificará la estructura para la respectiva instalación.

- ✓ Patricia León pregunta por la extracción de lixiviados actual y de la compactación de la masa de residuos, condiciones o recomendaciones que se establecieron en el marco de la viabilización del proyecto.

-El Ing. Mauricio Flórez de Empopamplona informa que se ha mejorado la compactación. Respecto al proceso de extracción de lixiviados se está programando para las próximas dos semanas. La última extracción realizada fue a finales de febrero de 2022.

- ✓ Patricia León pregunta por los informes mensuales de obra e interventoría.

-El Ing. Mauricio Flórez informa que en los primeros 5 días de cada mes, el contratista de obra debe pasar un informe de ejecución a la interventoría y que la misma, tiene 5 días, es decir, hasta el día 10 de cada mes para su respectiva revisión y aval así como su pronunciamiento.

-La Ing. Kelly Parada manifiesta que se elaboró un informe del periodo del 22 de marzo al 30 de abril de 2022.

-Patricia León solicita el cronograma de obra aprobado, los informes de interventoría y el número de empleos calificados y no calificados tanto para obra como para interventoría para poder subirlos al SIGEVAS, y dar cumplimiento a requerimientos de la Contraloría General de la Nación respecto a los documentos que se deben subir a dicho sistema.

- ✓ Se concerta entre todos los asistentes y se programa fecha de visita de obra para el 19 y 20 de mayo de 2022, en el cual se realizará comité ampliado de obra con la participación del municipio de Pamplona, Empopamplona, contratistas de obra y de interventoría y su respectivo personal profesional.

- ✓ Patricia León pregunta por obligación del numeral 12 del ejecutor el Convenio 1122 de 2022 respecto a la contratación del primer empleo por parte del contratista de obra.

-El Ing. Mauricio Flórez, manifiesta que dicha obligación ya fue verificada por Empopamplana y que se presentará el soporte en el próximo informe al MVCT.

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Inclusión del profesional especialista en geotecnia para el contratista de obra	William Arias Empopamplona S.A.	13 de mayo de 2022
2	Instalación de la valla	William Arias	13 de mayo de 2022
4	Remitir al MVCT para subir al SIGEVAS: Cronograma de obra aprobado por la interventoría, informe de interventoría y el número de empleos calificados y no calificados.	William Arias Guillermo	13 de mayo de 2022
5	Evidenciar en el próximo informe de supervisión del convenio 1122 de 2021 los soportes que den cumplimiento a la obligación del numeral 12 del ejecutor respecto a la contratación del primer empleo por parte del contratista de obra.	EMPOPAMPLONA ESP	Próximo informe de supervisión
6	Se programa Comité ampliado y visita de obra para los días 19 y 20 de mayo de 2022	EMPOPAMPLONA ESP Contratista de Obra Contratista de Interventoría Municipio de Pamplona MVCT	19 y 20 de mayo de 2022

FIRMAS: Se anexa lista de asistencia

Elaboró: Patricia León – MVCT-VASB-DPR

Fecha: 9 de mayo de 2022

Soporte reunión virtual:

Seguimiento proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA FASE II"

29:59

Solicitar control

Gente Chat Reacciones Salas Más

Cámara Micrófono Comparte Salir

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (7) Silenciar a todos

AB Aura Patricia Leon Boton Organizador

AL Alexander Araqu... (Invitado) Invitado de la reunión

GR Guillermo Rojas ... (Invitado) Invitado de la reunión

JR JHOSEN Y DEYMAR BLANCO R... Externo

KP Kelly Parada... (Invitado) Invitado de la reunión

MF Mauricio Flórez (Invitado) Invitado de la reunión

W william (Invitado) Invitado de la reunión

Comité de Gerencia No. 1

Agenda

09:00 am - 10:00 am Comité de Gerencia proyecto denominado "OPTIMIZACION DEL RELLENO SANITARIO LA CORTADA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA FASE II" Convenio Uso de Recursos No. 881 de 2021

Mauricio Flórez (Invitado)

14°C Bruma

ESP LAA

9:24 a. m. 6/05/2022

Seguimiento proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA FASE II"

38:11

Solicitar control

Gente Chat Reacciones Salas Más

Cámara Micrófono Comparte Salir

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

02. Datos relevantes del Convenio y de los Contratos

Contrato obra No.	MVCT - 001 - 2022	Contrato Interv. No.	MVCT - 002 - 2022
Fecha de suscripción No.	15/MARZO/2022	Fecha de suscripción No.	16/MARZO/2022
Valor del Contrato	\$ 3.839.340.969	Valor del Contrato	\$ 353.196.751,91
Fecha Acta de Inicio	22/MARZO/2022	Fecha Acta de Inicio	22/MARZO/2022
Plazo	Siete(7) meses	Plazo	Siete(7) meses
Fecha de Terminación inicial	21/OCTUBRE/2022	Fecha de Terminación	21/OCTUBRE/2022
Suspensión No.1	N.A.	Suspensión No.1	N.A.
Acta de Prorroga No.1 a la Suspensión No. 1	N.A.	Acta de Prorroga No.1 a la Suspensión No. 1	N.A.
Tiempo de Suspensión	N.A.	Tiempo de Suspensión	N.A.
Fecha de Reinicio No. 1	N.A.	Fecha de Reinicio No. 1	N.A.
Fecha de Terminación	N.A.	Fecha de Terminación	N.A.


Mauricio Flórez (Invitado)

MF Mauricio Flórez... AL Alexander A... JR JHOSEN Y... GR Guillermo R... W william (Invi... KP Kelly Parada... AB

14°C Bruma

ESP LAA

9:32 a. m. 6/05/2022

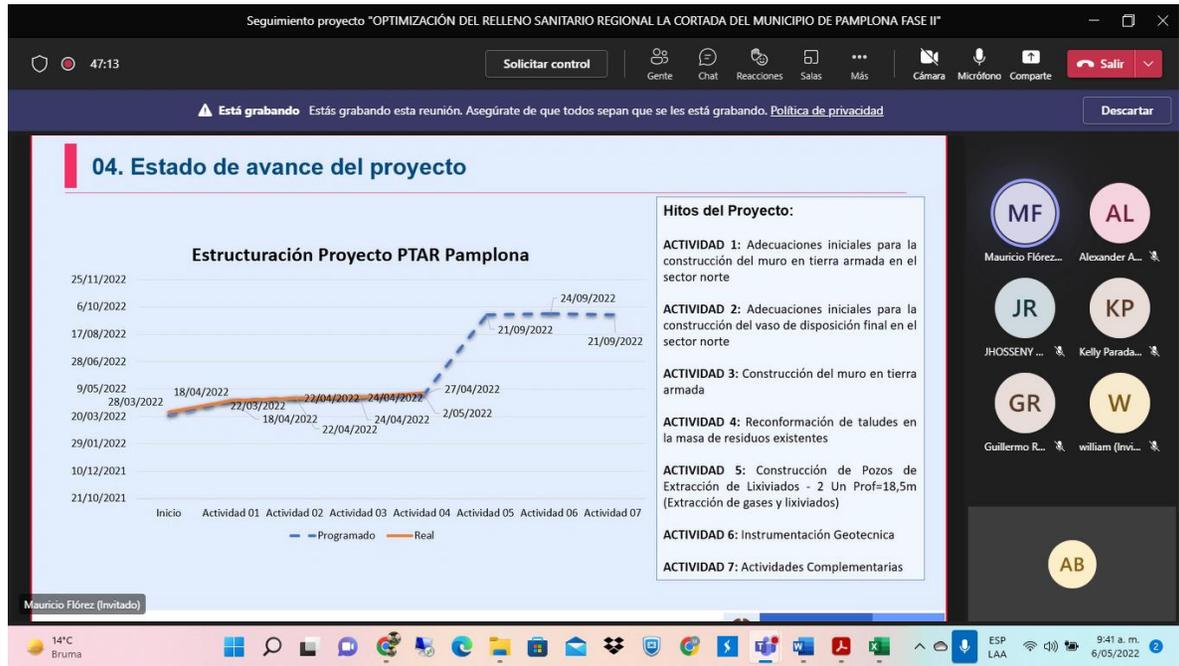

Seguimiento proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA FASE II"

01:02:05 | Solicitar control | Gente | Chat | Reacciones | Salas | Más | Cámara | Micrófono | Comparte | Salir

Está grabando | Política de privacidad | Descartar

AVANCE DE OBRA

Actividades realizadas.

- Implantación del proyecto
- Adecuaciones preliminares
- Adecuaciones vaso de disposición Final
 - Descapote manual
 - Excavación mecánica en material común
- Manejo de Aguas Lluvias canales y alcantarillas
 - Canales rectangulares 1*1 e=0,10 y fondo e=0,15

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona
EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

Kelly Parada (Invitado)

14°C Bruma | ESP LAA | 9:56 a. m. 6/05/2022



La vivienda y el agua
son de todos

Minivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-01

Seguimiento proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA FASE II"

01:03:38 Solicitar control Gente Chat Reacciones Salas Más Cámara Micrófono Comparte Salir

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Antes / Ahora

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona
EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

MF W
Mauricio Fl... william (Invi...
KP JR
Kelly Parada (In... JHOSENY ...
AL GR
Alexander A... Guillermo R...
AB

14°C Bruma 9:58 a. m. 6/05/2022

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

LUGAR: Virtual-Plataforma Teams FECHA: Mayo 6 de 2022 HORA: 9:00 am-10:30 am

TEMA: Seguimiento a la ejecución del proyecto Optimización Relleno Sanitario “La Cortada” de Pamplona, Fase II PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Empopamplona ESP, Contratistas y residentes de obra e Interventoría

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática
1	Mauricio Flórez	Jefe de obras	EMPOPAMPLONA	3158081876	rmauricioflorez@gmail.com	Seguimiento relleno
2	Guillermo Rojas Rodríguez	Representante Legal	Interventoría	3153984613	inguirojas@hotmail.com	Reunión técnica
3	KELLY YOHANNA PARADA ARIZA	ING. RESIDENTE DE OBRA	Contratista de Obra	3156135532	kellyta_302@hotmail.com	Reunión de seguimiento Optimización relleno sanitario La Cortada Fase II
4	William Arias	Director de Obra	Contratista de Obra			Seguimiento ejecución proyecto Relleno Sanitario Pamplona
5	Jhosseny Deymar Blanco Rojas	Ing. Residente de Interventoría	Interventoría		jhosseny.blanco@ustabuca.edu.co	Seguimiento ejecución proyecto Relleno Sanitario Pamplona
6	Alexander Araque	Jefe de Planeación	EMPOPAMPLONA SA	3153713287	planeacionempopamplona@gmail.com	Seguimiento ejecución proyecto Relleno Sanitario Pamplona
7	Patricia León	Contratista	MVCT-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Seguimiento ejecución proyecto Relleno Sanitario Pamplona

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>
