

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 04 de abril de 2023
HORA:	De 15:01 a 15:29 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Daynna Flórez – Consultoría (Ingeniera Profesional de Apoyo Hidráulico) Tito Saavedra – Consultoría (Especialista Hidráulico) Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Objeto de la reunión.
3. Comentarios de los asistentes
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación de la consultoría y profesionales del MVCT-VASB (Ver lista de asistencia).

No asistieron de parte Aguas del Chocó Gestor PDA.

2. Objetivo de la reunión:

Se solicitó a representantes del formulador informar sobre los avances de los ajustes solicitados al proyecto denominado **CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL CHOCO**, el cual cuenta con observaciones y faltantes de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial. En la presente reunión se realizará seguimientos sobre los compromisos adquiridos por el formulador los cuales algunos se encuentran vencidos de acuerdo a última programación realizada el 31 de marzo de 2023.

3. Intervención de los asistentes y/o temas abordados.
 - En la presente sesión se realizará seguimiento a los avances de pendientes con que cuenta el proyecto del asunto frente a componentes legales, documentales,

ambientales, técnicos, financieros y prediales. El componente institucional ya cuenta con visto bueno de parte de profesional del MVCT encargada de su evaluación. Respecto de los últimos compromisos adquiridos frente a fecha de entregas de ajustes y pendientes del proyecto se presentan atrasos.

Según dicha programación, a la fecha se debió recibir los siguientes para la respectiva revisión por parte de profesionales del MVCT y se encuentra pendiente a la fecha:

- Presentación de ajustes definitivos del Diagnóstico Situacional, Análisis de Alternativas, Hidrología y Diseño Hidráulico de Acueducto y Alcantarillado. Se han presentado ajustes parciales los cuales han sido verificados y algunos de estos han presentado subsanaciones, sin embargo no se ha presentado lo requerido de manera integral y en cumplimiento.
 - Entrega de plano general de redes y estructuras y acueducto con el fin de validar Topografía. Lo anterior se requiere para verificar respecto de la última implantación si el trabajo adelantado es coherente con el planteamiento del proyecto, sin embargo se destaca que la información cumple con lo solicitado por la normativa.
 - Presentación de ajustes al Diseño Eléctrico.
 - Presentación de disponibilidad de servicio de energía para zona de PTAR
 - Entrega de ajustes pendientes del Componente predial: plano predial. En este caso el documento fue remitido para la verificación, sin embargo requiere de ajustes y formulador se comprometió a entregar ajustes el 05 de abril de 2023.
 - Presentación de ajustes al Componente Ambiental (Evidencia de radicación de trámites de permisos – Ocupación de Cauce, Permiso de Vertimientos, PSMV, y permiso de ocupación de cauce). A la fecha se han recibido certificaciones por parte de CODECHOCO sobre la evidencia de los trámites en curso respecto de los permisos de ocupación de cauce, PSMV y vertimientos, estando pendiente la requerida para los permisos de ocupación de cauce.
- El Ing. Rodríguez (MVCT), menciona que a nivel general, los documentos del proyecto cuentan con las firmas pendientes por parte de profesionales responsables de elaboración e interventoría.
 - Sobre los diseños hidráulicos, el Ing. Rodríguez (MVCT) comentó que se han recibido parciales los cuales han sido verificados pero que no se cuenta aún con la totalidad de los requerido por lo que se solicita información sobre avances y fechas de entrega. Se esperaba la entrega total de los mismos para el día 31 de marzo de 2023.

De parte del Ing. Rodríguez se remitió correo electrónico el 13 de marzo de 2023 al representantes del formulador con pendientes hidráulicos de los sistemas de acueducto y alcantarillado (incluido diagnóstico, análisis de alternativas e hidrología), seguido de una revisión realizada sobre ajustes parciales compartidas por medio de Whatsapp a la Ing. Flórez (Consultoría) el 03 de abril de 2023 en los cuales se evidencian observaciones y pendientes reiterados.

De parte de la consultoría, los Ingenieros Flórez y Saavedra (MVCT) mencionan que las observaciones serán revisadas y que esperan presentar los ajustes totales para el 10 de abril de 2023.

4. Se realiza seguimiento a los pendientes de tipo documental, legal, ambiental, técnico, financiero y predial sobre los cuales se presentaron atrasos frente a compromisos anteriores adquiridos por el formulador; la fecha límite establecida esta contemplada para el 10 de abril de 2023.

Se realizará seguimiento en la semana del 10 al 14 de abril de 2023.

Cierre de la reunión.


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de ajustes definitivos del Diagnóstico Situacional, Análisis de Alternativas, Hidrología y Diseño Hidráulico de Acueducto y Alcantarillado.	Consultoría PDA del Chocó	03/04/2023 Compromiso vencido. Se han presentado ajustes parciales, sin embargo se encuentra pendiente la entrega integral de los requisitos.
2	Ajustes al Estudio de Suelos	Consultoría PDA del Chocó	10/04/2023
3	Entrega de plano general de redes y estructuras y acueducto con el finde validar Topografía	Consultoría PDA del Chocó	03/04/2023 Compromiso vencido.
4	Presentación de ajustes definitivos del Diseño Estructural	Consultoría PDA del Chocó	05/04/2023
5	Presentación de ajustes al Diseño Eléctrico	Consultoría PDA del Chocó	04/03/2023 Compromiso vencido.
6	Presentación de disponibilidad de servicio de energía para zona de PTAR	PDA del Chocó	04/03/2023 Compromiso

			vencido.
7	Presentación de ajustes al Presupuesto	Consultoría PDA del Chocó	10/04/2023
8	Entrega de ajustes pendientes del Componente predial: plano predial	Consultoría PDA del Chocó	05/04/2023
9	Presentación de ajustes al Componente Ambiental (Evidencia de radicación de trámites de permisos – Ocupación de Cauce, Permiso de Vertimientos, PSMV, y permiso de ocupación de cauce)	Consultoría PDA del Chocó	31/03/2023 Cumplimiento parcial; se encuentra pendiente evidencia de trámite de ocupación de cauce

FIRMAS:

1. Resumen			
Título de la reunión	SEGUIMIENTOS PENDIENTES SIPI		
Participantes que asistieron	3		
Hora de inicio	4/04/23, 3:01:22 PM		
Hora de finalización	4/04/23, 3:29:00 PM		
Duración de la reunión	27 min 38s		
Tiempo medio de asistencia	20 min 6s		
2. Participantes			
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	4/04/23, 3:01:29 PM	4/04/23, 3:29:00 PM	27 min 31s
TITO SAAVEDRA	4/04/23, 3:05:53 PM	4/04/23, 3:16:21 PM	10 min 27s
Daynna Florez (Invitado)	4/04/23, 3:06:36 PM	4/04/23, 3:28:57 PM	22 min 20s

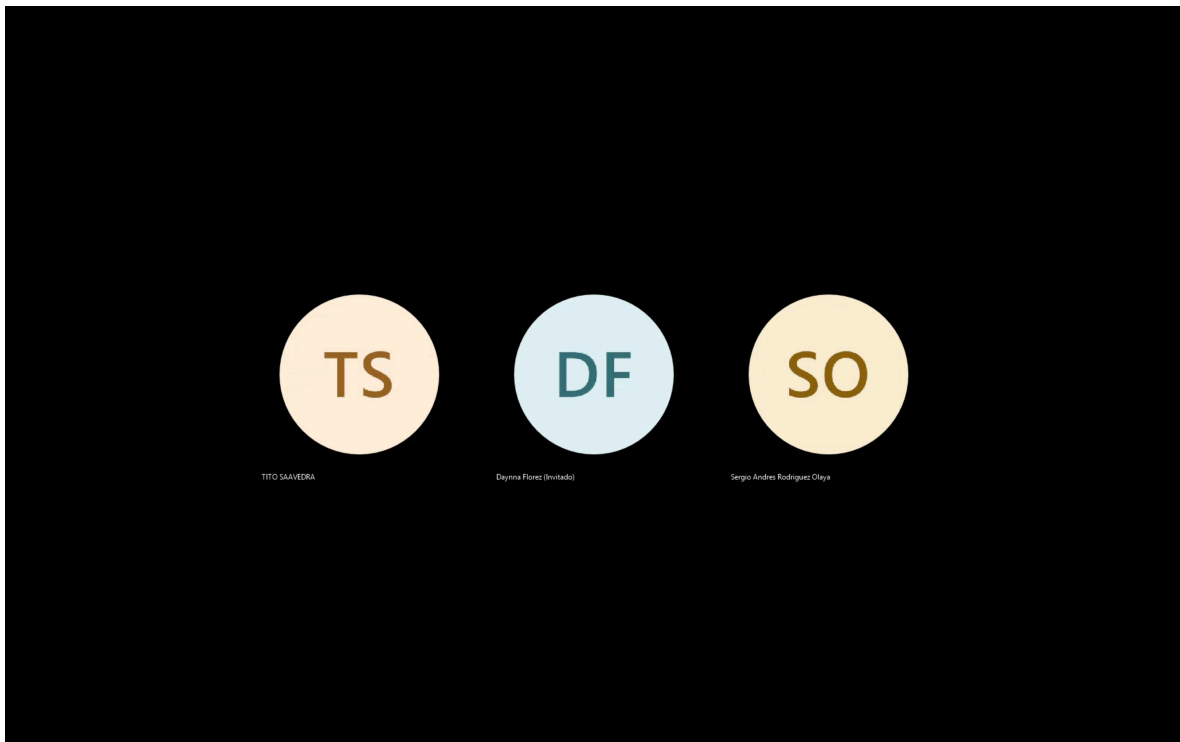

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos
SDP-DIDE-MVCT-VASB
Fecha: 04-04-2023
