

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 28

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 27 de julio de 2023
HORA:	De 15:00 a 15:33 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Víctor Garzón, Profesional de apoyo EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. (Gestor PDA) Oscar Castaño, Profesional de apoyo EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. (Gestor PDA) Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. (EPC - Gestor P.D.A.), de y profesional del MVCT.

2. Objetivo de la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Seguimiento a los pendientes con que cuentan los proyectos:

- **AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE DE LA SABANA DE OCCIDENTE Y TEQUENDAMA QUE TRANSPORTA AGUA SUMINISTRADA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ - FASE I REFUERZO FONTIBÓN**
- **AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE DE LA SABANA DE OCCIDENTE Y TEQUENDAMA QUE TRANSPORTA AGUA SUMINISTRADA POR LA EAAB, FASE II REFUERZO MUNICIPIOS**
- **AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE DE SABANA DE OCCIDENTE Y TEQUENDAMA QUE TRANSPORTA EL AGUA SUMINISTRADA POR LA EAAB, FASE IV ESTACIÓN DE BOMBEO FONTIBÓN**

3. Desarrollo de la reunión.

- Respecto del proyecto denominado **AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE DE LA SABANA DE OCCIDENTE Y TEQUENDAMA QUE TRANSPORTA AGUA SUMINISTRADA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ - FASE I**, el evaluador de proyecto menciona que este cuenta a la fecha con pendientes de tipo documental, legal, institucional, técnico, financiero y predial.

El 15 de mayo de 2023, fue presentada a EPC la actualización realizada a las observaciones y pendientes con que cuenta el proyecto mediante oficio con referencia 2023EE0040319, el cual está acompañada con la respectiva lista de chequeo. La actualización mencionada pretendía hacer corte de los pendientes a la fecha puesto que con el proyecto se han presentado documentaciones complementarias que subsanan algunas de las observaciones realizadas con el primer requerimiento realizado en el año 2019.

A continuación se realiza un resumen general de las observaciones y pendientes con que cuenta el proyecto a la fecha:

- Estado: En requerimiento
- Valor radicado: \$50.772.773.932 - Nota: con los ajustes asciende a \$66.298.831.710 aproximadamente, sin embargo deberá actualizarse

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

con las condiciones de mercado una vez se cumplan los demás requisitos pendientes con el proyecto.

- Pendientes institucionales – Aportar el certificado de paz y salvo subsidios de municipios, NO presentan diagnóstico ESP Mosquera, formatos desactualizados. La aprobación del componente será condicionada a la actualización de los contratos venta en bloque de agua por parte de EAB a municipios.
- Pendientes ambientales – Aportar el permiso ocupación de cauce en trámite y actualizar sobre el estado del mismo.
- Pendientes documentales y legales- ajuste de formatos y certificaciones, también la documentación deberá actualizarse con las vigencias recientes.
- Pendientes técnicos – (1) Diseño Hidráulico tiene pendiente presentar el informe y modelación de la funcionalidad Fase I; (2) Estudio de suelos deberá aportarse firmado y está pendiente verificar la coherencia entre los planos entibados y lo indicado en informe técnico.
- Pendientes financiero – se requiere actualizar las cotizaciones vigentes de mercado
- Pendientes prediales – Se requieren gestionar servidumbres. Se requiere servidumbre sobre predio fiscal del distrito, trámite que no se ha adelantado y que dependerá de la definición del ejecutor y fuentes de financiación.

Sobre los pendientes mencionados, los funcionarios de EPC comentan que frente al componente técnico están gestionando a través de la Empresa de Acueducto de Bogotá, contratante de la consultoría, la información faltante y a la fecha no han obtenido respuesta de esta entidad frente a lo solicitado. Respecto del componente predial, igualmente se encuentra pendiente la definición del ejecutor del proyecto para realizar la subsanación y trámite de las servidumbres requeridas. Y respecto del componente ambiental, se anuncia que respecto del permiso de ocupación de cauce requerido este sigue en trámite y actualmente la autoridad ambiental realizó requerimientos a la documentación radicada para este permiso la cual EPC se encuentra gestionando.

Representantes de EPC mencionan que tienen comité con los municipios beneficiarios y la Empresa de Acueducto de Bogotá, con la finalidad de realizar seguimiento y compromisos de los pendientes identificados, razón

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

por la cual de momento no se definen fechas de entregas. Dicha reunión se adelantará en la segunda semana de agosto de 2023.

- El evaluador del MVCT menciona sobre los proyectos correspondientes a las fase complementarias (II - Refuerzos municipios y IV Estación de Bombeo), que los mismos se encuentran radicados en el MVCT, con observaciones, pendientes y requerimientos, los cuales no han sido subsanados y requieren de ajustes y/o actualizaciones. Considerándose que los mismos fueron radicados en bajo la Resolución 1063 de 2016 derogada por la actual (Resolución 0661 de 2019), deberán actualizarse con lo requerido por la vigente.
La Fase III (almacenamientos), que es complementarias a las Fase II y IV para su funcionalidad, no ha sido presentada ante el MVCT, y de acuerdo a la última información esta se encuentra en procesos de entregas y revisiones por parte del equipo formulador. I
También se destaca por otra parte, que la Fase IV presenta observaciones de tipo predial que se requiere para la construcción de estación de bombeo que actualmente cuenta con inconvenientes legales para la obtención de los predios necesarios.
- Sobre la continuidad de las Fases II y IV, el evaluador había solicitado en oportunidad anterior a representante de EPC sobre definición en la continuidad de dichos proyectos en el mecanismo de evaluación, debido a que no se han presentados los ajustes, pendientes y/o aclaraciones solicitadas a los mismos, además de la mencionada situación sobre la fase III que incide en los alcances del proyecto y las dificultades prediales sobre la estación de bombeo.

Respecto de la Fase II, menciona representante de EPC que realizarán solicitud de retiro del proyecto radicado, lo anterior motivado a que ya cuentan con la Fase III y este será integrado a los refuerzos de los municipios, sin embargo este no será radicado nuevamente como uno solo, sino por cada refuerzo realizada a cada municipio, por lo que serán varias radicaciones. Solicitó que el evaluador del MVTC que se radique el oficio con la correspondiente solicitud.

Con relación a la Fase IV, mencionan que la intención es continuar con el proceso actual, por lo que no solicitarán el retiro, sin embargo mencionan que aún presentan dificultades con la adquisición del predio. Recuerda el

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Evaluador del MVCT que dicho proyecto se encuentra requerido y con observaciones las cuales deberán ser subsanadas, además considerándose que se debe actualizar a los requerimientos de la Resolución 0661 de 2019.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

Los proyectos cuentan con observaciones y pendientes de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnica, financiera y predial.


Se realizara seguimiento con las partes involucradas para realizar seguimientos y compromisos del proyecto en la segunda semana del mes de agosto de 2023, fechas por concertar.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo; Seguimiento a pendientes y compromisos de la Fase I. Pendientes de tipo documental, legal, técnico, financiero, predial e institucional.	EPC EAB MVCT Municipios beneficiarios	11/08/2023 Fecha por concertar entre las partes.
2	Oficio solicitud de retiro de proyecto Fase II	EPC	No se definió fecha. Se realizará el seguimiento el 11/08/2023

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

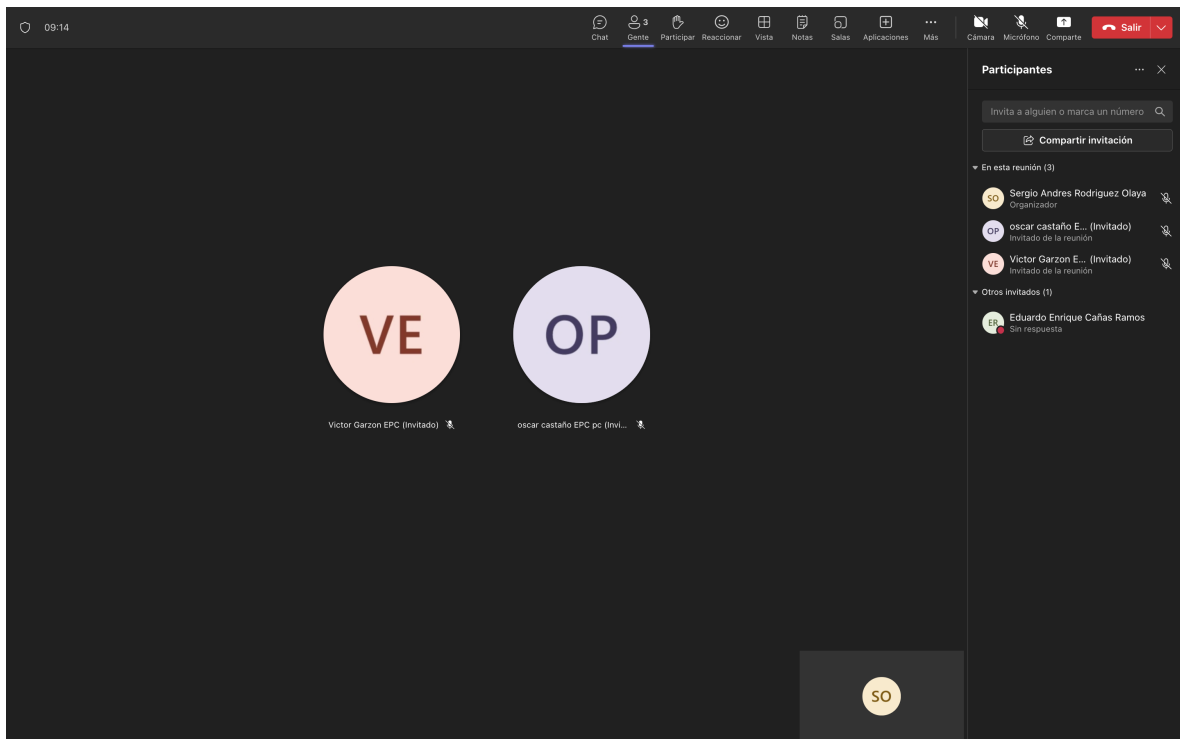

Anexos: (No aplica)

Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 27/07/2023
