

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01 -MESA DE APOYO TECNICO AL SEGUIMIENTO DE PROYECTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de noviembre de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual (Teams)
Presíde:	Gabriel Enrique Bonett Solano y Blanca Mateus

NOMBRE	CARGO
Gabriel Bonett	Apoyo supervisión Minvivienda
Marcela Velázquez	Gestor Minvivienda
Blanca Mateus	Supervisor FINDETER
Claudia Londoño	Gestor FINDETER
Oscar Acevedo	Contratista de obra
Anderson morales	Contratista de obra
Lisette Castiblanco	Director de Obra

ORDEN DEL DÍA

1. Revisar el avance del proyecto por componente

DESARROLLO

1. CONVENIO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 928-2021

Se agenda reunion virtual con el fin de realizar seguimiento al proyecto CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se realizó mesa técnica de seguimiento, verificando el cumplimiento del cronograma de obra componente por componente, este proyecto tiene como fecha de terminación el 19 de enero de 2024, un avance ejecutado del 84,30%, al proyecto le restan 63 días de ejecución para su terminación.

Convenio tripartita 928-2021 tiene fecha de vencimiento el 28 de febrero de 2024.
Avance por componente

PTAP

Obra física 98%

Instalaciones hidráulicas pasamuros e instalaciones

Tuberías con los demás componentes

Se estima terminar el 20 de diciembre terminar las conexiones hidráulicas.

TANQUE SEMI ENTERRADO

Obra física 94% pendiente las instalaciones hidráulicas

Obra civil 100% ejecutado.

Termina el 20 de diciembre 2023.

TANQUE ELEVADO

22% ejecutado vs 66% programado atraso del 44%

Termina el 20 de diciembre 2023. Obra física

Terminar 08 de enero 2024.

El atraso es causado por problemas de rendimiento causado por los sindicatos del municipio la rotación del personal.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

AVANCE POR COMPONENTE


CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO :

DIMENSIONES : 19.60 M LARGO X 11 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTURA

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO : 539 M3

ELEVACIÓN TANQUE: ENTRE 21.5 M A 24 M DE ALTURA, 3 COLUMNAS DE 1.20 M X 1.20 Y 6 COLUMNAS DE 1.20 M X 0.80M A 24 M DE ALTURA, VIGAS INTERMEDIAS DE 0.70 M X 0.50 M

% AVANCE PROGRAMADO	66.00 %
% AVANCE EJECUTADO	22.00%
% ATARASO	44.00 %



CAMARA DE CONTACTO
Termina el 20 de diciembre 2023
Avance del 96%


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

AVANCE POR COMPONENTE

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO:

DIMENSIONES : 12.80 M LARGO X 4.40 M DE ANCHO X 4.5 M DE ALTURA
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO : 253 M3

% AVANCE PROGRAMADO	96.00 %
% AVANCE EJECUTADO	96.00%
% POR EJECUTAR	0.00 %

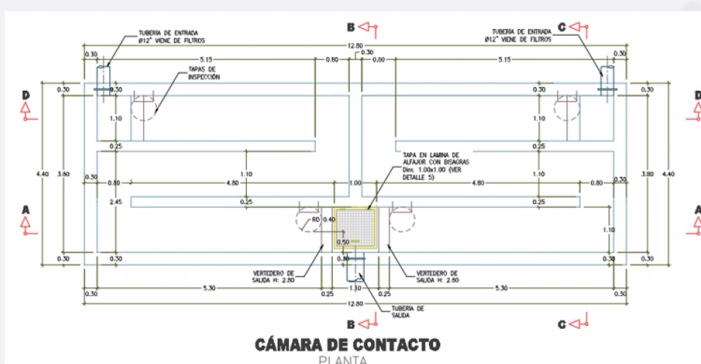

CASETA DE DOSIFICACIÓN

Termina el 13 de diciembre 2023
69% EJECUTADO
Atraso 25% acabados

En la última reunión realizada el 16 de noviembre de 2023, se dejó claridad que el proyecto se debe terminar el 19 de enero de 2024, se dejaron compromisos en cabeza del contratista y FINDETER de iniciar la socialización del manual de operación al operar del proyecto, así como entablar comunicación con el alcalde electo.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

AVANCE POR COMPONENTE


CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE DOSIFICACIÓN :

ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS (POLIMERO CATIÓNICO Y CAL A FLOCULADORES, SODA Y CLORO A CAMARA DE CONTACTO)

DIMENSIONES : 8.40 M DE LARGO X 7.40 M AREA : 62.16 M2

UBICADO: DEBAJO DEL TANQUE DEL DESARENADOR

% AVANCE PROGRAMADO	94.00 %
% AVANCE EJECUTADO	69.00 %
% FALTANTE POR EJECUTAR	25.00 %

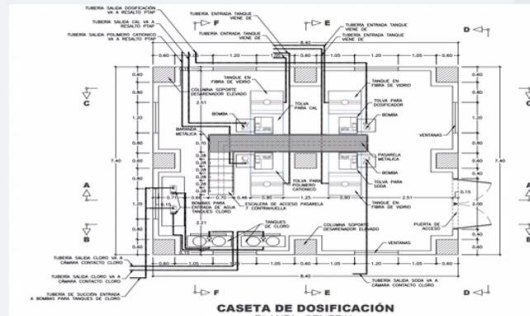

Se agenda una nueva mesa de seguimiento al proyecto el 27 de noviembre de 2023.

Como conclusiones se tiene que el proyecto debe terminar según el cronograma de obra el día 19 de enero de 2024.

Se deben implementar las acciones que permitan culminar el proyecto en la fecha programada.

FIRMAS:

Gabriel
Gabriel Enrique Benett Solano

Gabriel Enrique Bonett Solano
Seguimiento técnico

Anexos: Carpeta digital

Elaboró: Gabriel Enrique Bonett Solano
