	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: GRF-F-59

FECHA		N° DE COMISIÓN		N° DE COMISIÓN SIIF	
-------	--	----------------	--	---------------------	--

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	JUAN PABLO SERRANO CASTILLA
TIPO DE VINCULACIÓN:	FUNCIONARIO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR	
--	----------	---	----------	--

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
28	04	2022				Bogotá – Cúcuta
			29	04	2022	Cúcuta - Bogotá

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Participar recorrido de Obra Aliados Convenio de Uso de Recursos No. 055 de 2017 asistir al Comité de Gerencia "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" Convenio de Uso de Recursos No. 1129 de 2020, asistir al Comité de Gerencia OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA COLORADA, LA RAMPACHALA Y EL SALTO DEL MUNICIPIO EL ULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" y participar al Comité de Seguimiento Convenio de Uso de Recursos No. 055 de 2017 Subproyectos 1, 3 y 4 del "ACUEDUCTO METROPOLITANO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

El día 28 de abril, se hizo desplazamiento aéreo a la ciudad de Cúcuta, seguido a esto, se realizó recorrido de obras, equipo Minvivienda junto a Ecopetrol revisó en campo el avance del subproyecto No. 1 del Acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander, obra que supera el 98% de avance en su ejecución. Desde este miércoles iniciaron las pruebas funcionales del mencionado subproyecto.

También revisamos el avance de la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable "El Pórtico" del Acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander, obra que alcanza el 85% de avance en su ejecución. Este proyecto suministrará agua potable a Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios en Norte de Santander.

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: GRF-F-59

El 29 de abril en horas de la mañana se realizó el Comité de Seguimiento No.47 del Convenio de Uso de Recursos No. 055 de 2017. En el cual se desarrolló la siguiente agenda de trabajo:



Momento HSE:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Seguimiento Compromisos:

03 Seguimiento compromisos del comité No. 46				
No	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa
1	Gestión de recursos ante Min. Hacienda: A la espera del pronunciamiento por parte de MinHacienda. Opciones: 1. Revisar al interior Ecopetrol la posibilidad de dividir la solicitud de reformulación, radicar adición \$21.190 de manera preliminar. 2. Esperar la carta de recursos emita MinHacienda, radicar una única reformulación.	●	MVCT ECOPETROL	24/04/2022
2	Comunicado aportes Gobernación: Presentar el tema al comité directivo del PDA programado para el 7 abr 22, donde incorporan los recursos al presupuesto para que la Secretaría de Hacienda realice los giros.	●	Gobernación	20/04/2022
3	Factibilidad CENS/ Se adelantarán las siguientes acciones: 1. CENS radicó ante el INVIAS la solicitud del permiso para cruce de la autopista; proyectan tener viabilizada aprobada próxima semana. 2. A la espera de la comunicación que emitirá CENS el próximo lunes donde indicarán las fechas terminación de la red a construir, a la vez concretar la solución temporal propuesta por CENS que permitirá tener la disponibilidad de la energía para adelantar las pruebas.	→ ●	EMSPD Alcaldía Cúcuta- Los Patios- Villa Rosario Gobernación	28/03/2022
4	Recibo áreas de levantamiento de Veda: La Gobernación de Norte de Santander recibirá las áreas totales conforme a la resolución del levantamiento de veda y Rehabilitación Ecológica como titular.	●	Gobernación	29/03/2022
5	Interconexión desarenador solicitud EIS: Adelantar reunión conjunta EIS, ECP, interventoría y contratista, levantar acta y elaborar un protocolo de coordinación para realizar los trabajos.	→ ●	Alcaldía Cúcuta	29/03/2022
6	Interferencias llegada a los tanques: Agendar reunión conjunta Gob.- EMSPD- ECP y contratistas, con el objeto de coordinar las interferencias de ambos proyectos.	●	Gobernación	15/02/2022
7	Asistencia a los espacios de entrega al operador. Informe avance de actividad.	→ ●	Ecopetrol	28/04/2022
8	Envío de informes Gerencia Interferencias. Pendiente informe mes Marzo	→ ●	Gobernación	30/12/2021
9	Informe de desembolsos por el FIA: Seguimiento al pago de las actas radicadas en el FIA.	→ ●	Gobernación	Seguimiento Mensual

Temas Relevantes:

04 | Temas relevantes

1. **Otrosí No. 6 – CUR**
 - Reformulación región y viceministerio
 - Actualización de datos en SIPROE – Villa del Rosario
2. **Esquema de entrega de las obras a los entes territoriales** →
3. **Escombrera Villa del Rosario** →
4. **Solicitud de invitación** Alcalde San Cayetano al CUR
5. **CUR No. 48** – Solicitud de la Procuraduría para que se realice en Bogotá
6. **Actuación especial de fiscalización** – Contraloría General de la República

No.	Radicado	No.	Radicado
1	2022EE0013683	12	2022EE0060272
2	2022EE0018082	13	2022EE0063091
3	2022EE0023767	14	2022EE0064220
4	2022EE0032601	15	2022EE0064229
5	2022EE0038085	16	2022EE0064394
6	2022EE0040570	17	Mesas de trabajo
7	2022EE0040926	18	2022EE0067902
8	2022EE0050985	19	2022EE0068936
9	2022EE0051401	20	2022EE0069212
10	2022EE0054888	21	Mesas de trabajo
11	2022EE0057142		

Estado de Avance del Convenio y del Proyecto:

05 | Estado presupuestal Convenio de acuerdo con Otrosí No 5

ENTIDAD	APORTE TOTAL MCOP	APORTE EN ESPECIE MCOP	VALOR VIABILIDAD MCOP	Valor aportado MCOP	% Desembolsos	Saldo Pendiente	EJECUTADO P1 @ Feb 2022	EJECUTADO P3 Y 4 @ Feb 2022
Ministerio ¹	100.446	0	100.446	100.446	100%	0	N/A	122.544
Gob. Nds ²	32.778	7.141	25.637	13.279	52%	12.358		N/A
ECOPEPETROL ³	251.939	15.811	236.129	216.527	92%	19.601	208.659	N/A
Total CUR	385.164	22.952	362.212	330.253	91%	31.959	208.659	122.544

1. Corresponde a 11 desembolsos realizados a Fiduprevisora que suman 97.734 MCOP – MVCT gestiona directamente 2.713 MCOP
2. Corresponde a los pagos realizados por la Gobernación a través del FIA.
3. Corresponde a 4 desembolsos realizados a Fiduprevisora. El día 4 de Marzo se realiza 4to desembolso por un valor de 28.096 MCOP a la subcuenta de Ecopetrol ascendiendo a un valor acumulado aportado de 216.527 MCOP. La Fiducia confirma transacción el día 7 de Marzo.

Corte: 31 de Marzo 2022. Los valores de ejecución y proyección se actualizan mensualmente.

 La vivienda y el agua son de todos	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: GRF-F-59

05 | Avance ejecución presupuestal Convenio CUR

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	VALOR VIABILIDAD	EJECUTADO 2022 (MCOP\$)	TOTAL EJECUTADO (MCOP\$)	Proyección
OBRA CIVIL Y SUMINISTROS	OBRA CIVIL Y SUMINISTROS P1	181.080	11.859	174.078	188.878
	OBRA CIVIL Y SUMINISTROS P3 Y P4	108.253	12.390	107.175	145.789
INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA P1	15.482	2.156	22.968	24.563
	INTERVENTORÍA P3 Y P4	8.337	1.161	8.934	9.794
GERENCIA	GERENCIA DE PROYECTOS P1	10.580	1.131	10.713	11.560
	GERENCIA DE PROYECTOS P3 Y P4	4.578	593	4.969	5.522
CONTINGENCIA Y ESCALACIÓN		26.005	-	-	7.302
AMBIENTAL	PERMISOS AMBIENTALES P1	2.926	-	900	3.827
	PERMISOS AMBIENTALES P3 Y P4	1.214	-	501	1.214
CONSULTORÍA ESTRUCTURACIÓN (MVCT)	P3 Y P4	539	-	-	539
SEGUIMIENTO MVCT	P3 Y P4	2.023	-	-	2.023
SEGUIMIENTO REGIÓN		965	-	965	965
INTERVENTORÍA CONSULTORÍA I (MVCT)		174	-	-	174
TOTAL		362.212	29.289	331.203	402.148

Corte: 31 de Marzo 2022. Los valores de ejecución y proyección se actualizan mensualmente.

Los renglones sombreados, corresponden a las siguientes Notas:


- (1) El Capítulo de Consultoría Estructuración y Seguimiento MVCT no es gestionado por Ecopetrol y por lo tanto no se reflejan los valores ejecutados. Al igual que el renglón de seguimiento del MVCT.
- (2) Los permisos ambientales del P1 fueron reconocidos por Ecopetrol y lo permisos ambientales de P3 y P4 son reconocidos por la Gobernación.
- (3) La interventoría a la Consultoría Estructuración del MVCT no es gestionado por Ecopetrol y por lo tanto no se reflejan los valores ejecutados.



Estado de Avance Subproyecto 1:

05 | Avance contrato de obra P1

SUBPROYECTO 1 - CONTRATISTA OHL

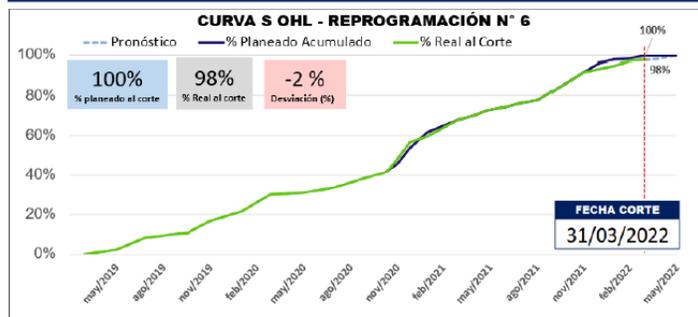

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desarenador: Avance de 99%, Completadas las pruebas de estanqueidad en Tanque de Succión No1. Con esto se completa la liberación de todos los módulos del desarenador.

Edificio de Bombas: Avance de 98%. En ejecución instalación de Etherboard, instalación de escaleras y pasarelas metálicas, construcción de losa en concreto hall de acceso al Cuarto de Control, finalizada instalación de línea del sistema contra-incendio incluyendo instalación de hidrantes y gabinetes, instalación de acometidas de potencia para equipos.

Línea de impulsión y aducción: Continúa instalación de válvulas y juntas de oro para cierres de tramos - avance de 17.6 km Vs 17.6km Planeados. Pendientes 6 m aprox. de cierres. Completado el desarrollo de Pruebas Hidrostática en 17 tramos verificados en 17 Km de líneas.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Desarenador: Completar rellenos perimetrales, rampas y escaleras en concreto acceso al desarenador.

Edificio de bombas: Continuar con las actividades de conexión e instrumentación de equipos principales, finalizar obras de fachada e instalación del aire acondicionado.

Subestación Eléctrica: Iniciar con proceso de energización con CENS.

Línea Impulsión: Finalizar con instalación de accesorios (válvulas y facilidades) y Pruebas de estanqueidad estructura de interconexión el pórtico.


CAUSAS DE LA DESVIACIÓN

Edificio de Bombas: Se supera dificultad en el desarrollo de prueba hidrostáticas en salida de Edificio de bombas, que tuvo impacto en el desarrollo de las actividades mecánicas y eléctricas.

05

Gestión Social

Procedencia Mano de obra

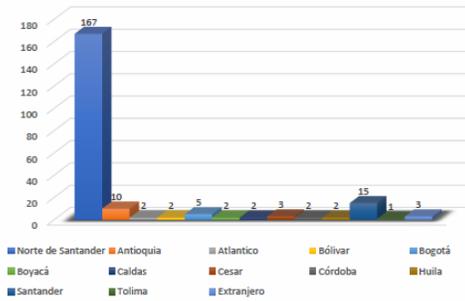


216
Trabajadores

77,3 %
Mano de obra total
procedente de Norte de Santander.

MANO DE OBRA - SUBPROYECTO 1

PARTICIPACIÓN LABORAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

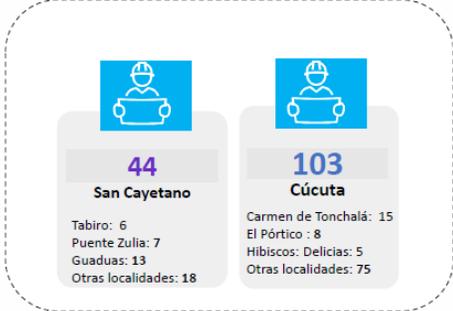

58,7%
Mano de obra calificada
pertenece a Norte de Santander.



05

Gestión social

BIENES Y SERVICIOS - PROYECTO 1



42
Empresas regionales con vinculo comercial

OBSERVACIONES	VALORES
Valor total acumulado facturado a corte 31 de marzo de 2022	\$ 111,340,578,761
Valor total acumulado cancelado por OIR a los proveedores	\$ 102,408,529,025
Facturas pendientes por pagar que están dentro del plazo 30 y 60 días (corresponde 25 empresas nacionales \$ 368.633.563 y 42 empresas de la región \$ 1.341.307.398)	\$ 2,189,738,961
Valor total facturas pendiente de pago (60 empresas nacionales \$ 1.115.575.137 y 34 empresas de la región \$ 1.426.745.647)	\$ 6,742,320,785


AVANCE DESARENADOR



 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 1.0	
		PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 14/03/2022
			Código: GRF-F-59

05 |


ESTRUCTURA PRESEDIMENTADOR

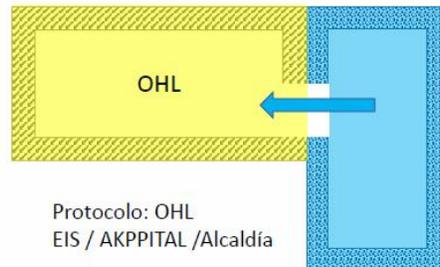

Estado de Avance Subproyectos 3 y 4:

05 | Avance contrato de obra P3 y P4

SUBPROYECTO 3 y 4 - CONTRATISTA SP

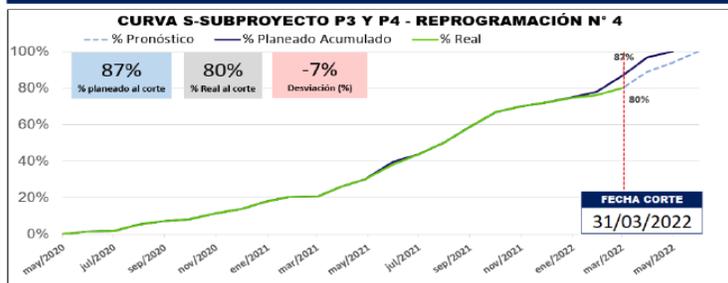

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- P3 –PTAP:**
 Completar la instalación de tubería de descarga y de succión en Edificio de Bombas.
 Completar las actividades de Fachada en Edificio de bombas y Edificio de Cuarto Eléctrico y Control
 Iniciar con el posicionamiento de equipos y conexionados en Edificios.
- P4 – Línea y Tanques:**
 - Finalizar PH en línea de 700mm de y completar la conexión a Tanques de cumbres bajas.
 - Continuar con el desarrollo de excavación e instalación de tuberías de conexión hacia tanques

ACTIVIDADES REALIZADAS

- P3 –PTAP 85%:**
 - En ejecución instalación de tubería del manifold de succión y descarga de las bombas principales, incluyendo la instalación de válvulas.
 - Completada pruebas preliminares a unidades de sopladores.
 Completada la instalación de estructura metálica de la pérgola en la zona de filtros
 - En desarrollo instalación de fachada y mampostería en Edificio de Bombas y Edificio de Cuarto de Control y Eléctrico.
- P4 – Línea 97%:**
 - Se ha Instalado 4,5km de línea de 600mm, 3,4km de línea de 700mm y 0,9km en línea de 400 mm.
 Se encuentran pendientes 468m para instalar
- P4- Tanques 77%:**
 - Cumbres ambos Completados. En desarrollo excavación e instalación de tubería de conexión hacia tanque.
 - 1 de Mayo ambos Completados.



La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Versión: 1.0

Fecha: 14/03/2022

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS


Código: GRF-F-59

05

Gestión Social

MANO DE OBRA - SUBPROYECTO 3 y 4

Procedencia Mano de obra



PARTICIPACIÓN LABORAL - ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA



612
Trabajadores

78,9 %
Mano de obra total procedente de Norte de Santander.

54,6%
Mano de obra calificada pertenece a Norte de Santander.

05

Gestión social

BIENES Y SERVICIOS - SUBPROYECTOS 3 y 4



24

Empresas regionales con vínculo comercial

OBSERVACIONES	VALORES
Valor total acumulado facturado	\$ 61,647,216,756
Valor total acumulado cancelado por SP	\$ 60,348,304,569
Facturas pendientes por pagar acuerdo de 30 y 60 días (corresponde a 61 Empresas Nacionales \$ 983.684.016 y 24 empresas de la región \$ 315.228.171)	\$ 1,298,912,187
Valor total facturas pendientes de pago	\$ 0

03

CENS - P1

CENS Desarenador	<p>Acometida red 34.5 KV en Termotasajero.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ratificación y ampliación a la solicitud de factibilidad para el proyecto 1 <ul style="list-style-type: none"> Tensión de 2.2 MVA de 9:00 am a 9:00 pm Tensión de 6.5 MVA de 9:0 pm a 9:00 am <p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cambio de los CTs ✓ Reubicación Medidores ✓ Cambio acometida de transformadora de Media ✓ Interventoría CENS ✓ Calibración y parametrización Medidores – (Realizado – Instalación por CENS) ✓ Capacitación personal CENS de la Operaciones – CENS Crea Consignatario <p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Calibración y montaje de los PTs – En Proceso ultima semana de abril ➤ Formato de Suscriptor – La EMPRESA – En Proceso ➤ Solicitud de conexión – En Proceso </p></p>
---------------------	--

03

CENS P3 – P4	
CENS El Pórtico	Planta El Pórtico: Acometida red 34.5 KV ✓ Cambio de los CTs – 1ª semana de Mayo ✓ Certificación PTs – 4 semana de Abril ✓ Actividades CENS: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visita de Manto - OK ▪ Área de Manto Pendiente cotización (Enviar cotización a Ecopetrol de los costos para crear el NODO) (Poste de 12 ms + Estructura + bajante + derivación + montaje / en medio de un parque infantil / El cable da suministra Ecopetrol) ▪ Crea el Nodo ▪ Se inicia el proyecto – Se crea la Factibilidad
CENS TKs Cumbres Bajas	Tanque Cumbres Bajas: Acometida en Baja Tensión ✓ Definición y aprobación del Nudo de arranque <ul style="list-style-type: none"> ▪ Construcción de 400 mts de línea <ul style="list-style-type: none"> ▪ 200 mts hay servidumbre de CENS – Construcción en MEDIA Tensión ▪ 200 mts hay servidumbre de GndS – Construcción en BAJA Tensión ▪ Instalación de transformado de Media a Baja Tensión – Ecopetrol ▪ Se crea Nudo / Se inicia el Proyecto / Se crea la factibilidad
CENS TKs 1ª de Mayo	Tanque 1ª de Mayo: Acometida en Media Tensión – Factibilidad Aprobada ✓ Nudo de arranque definido: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Construcción de 300 mts de línea y Transformador - Ecopetrol <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 mts construcción en MEDIA Tensión ▪ Montaje Transformador de Media a Baja tensión - Ecopetrol ▪ 200 mts construcción en BAJA Tensión ▪ Se crea Nudo / Se inicia el Proyecto

03

Reuniones Integración Proyecto – Comisionamiento - Cliente

TEMATICA				AGENDA DESARROLLADA		
Actividad	Tema	Estado		FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1	Socialización Proyecto AMC	Realizado	✓	11/11/2021	REUNION SOCIALIZACION DEL PROYECTO A OPERADOR AMC	ECOPETROL
2	Socialización Procesos AMC	Realizado	✓	25/11/2022	VISTA AL DESARRENADOR – PROYECTO 1	ECP – MASSY ENERGY
3	Socialización suministro de energía eléctrica AMC	Realizado	✓	2/12/2021	PRESENTACION PROYECTO AMC A OPERACIONES (AMP, EIS, ALCALDIA DE LOS PATIOS, SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, ALCALDIA DE CUC)	ECP – MASSY ENERGY
4	Construcción manuales y guías de O&M	En ejecución	🟡	9/12/2021	PRESENTACION PROYECTO AMC A OPERACIONES	ECOPETROL
5	Pruebas funcionales	No iniciado	🔴	16/12/2021	PRESENTACION ESPECIALIDAD CIVIL, MECANICA PROYECTO AMC A OPERACIONES (AMP, EIS, ALCALDIA DE LOS PATIOS, SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, ALCALDIA DE CUC)	ECP – MASSY ENERGY
6	Operación y Mantenimiento infraestructura AMC	No iniciado	🔴	20/01/2022	PRESENTACION ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION PROYECTO AMC A OPERACIONES (AMP, EIS, ALCALDIA DE LOS PATIOS, SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, ALCALDIA DE CUC)	ECP – MASSY ENERGY
7	Puesta en Servicio	No iniciado	🔴	17/02/2022	PRESENTACION ESPECIALIDAD ELECTRICA PROYECTO AMC A OPERACIONES (AMP, EMSFD, ALCALDIA DE LOS PATIOS, EIS)	ECP – MASSY ENERGY
				3/03/2022	PRESENTACION DE LA INGENIERIA EN 3D DEL PROYECTO 1, 3 Y 4 A OPERACIONES AMC, AMC, EIS, PLANEACION	HIV – INGENIERIA – ECP
				10/03/2022	PRESENTACION PROYECTO 3 Y 4 A OPERACIONES AMC (EIS, AMP, AGUAS LOS PATIOS)	GERARDO VARGAS – MASSY ENERGY
				24/03/2022	RECORRIDO DE CAMPO – PRESENTACION PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE TEMPORAL	MASSY ENERGY
				21/04/2022	PRESENTACION DEL PROYECTO AMC A LA OPERADORA CENS CON ASISTENCIA DE OPERACIONES AMC (AGUAS KRITAL, EIS, AGUA DE LOS PATIOS, ALCALDIA DE LOS PATIOS)	GERARDO VARGAS – SP ING



ACTIVIDADES A DESARROLLAR A JUNIO /22

ACTIVIDAD	MAYO			JUNIO					
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9
Revisión, ajustes y entrega manuales y guías de O&M									
Pruebas funcionales									
Capacitaciones de Operación y Mantenimiento infraestructura AMC									
Puesta en Servicio									

03

Convenio Uso Recursos- CUR – Obligaciones.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y DEL DEPARTAMENTO

a) MUNICIPIOS en los numerales 7, 8 y 9 indican lo siguiente:

7. Recibir las obras objeto del convenio por parte del EJECUTOR por medio de Acta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el EJECUTOR le comunique por escrito la disponibilidad para la entrega de las obras; una vez estén culminadas y verificadas por la interventoría contratada por EL EJECUTOR para la vigilancia y seguimiento de las mismas. La entrega y recibo deberá constar en Acta.

8. Incorporar las obras objeto del convenio en sus activos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de las mismas según acta.

9. Garantizar que la infraestructura resultante del objeto del Convenio se entregue al operador de los servicios en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994.

b) DEPARTAMENTO en el numeral 10 indica lo siguiente:

10. Propender porque una vez concluyan las obras objeto del convenio sean recibidas por LOS MUNICIPIOS. Dicho acto se hará constar en el Acta de Entrega y Recibo correspondiente.



La vivienda y el agua son de todos Minvivienda

FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO


PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 1.0

Fecha: 14/03/2022

Código: GRF-F-59

03 | Convenio Uso Recursos- CUR – Obligaciones.

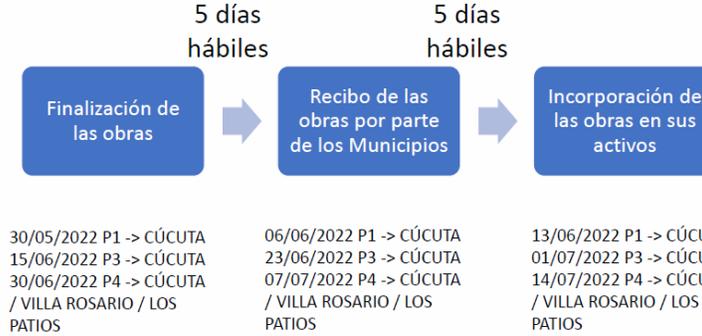

03 |

SUBPROYECTO 3 y 4

TRAZABILIDAD DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PROYECTO AMC EN VILLA DEL ROSARIO



03 | Informe de desembolsos por el FIA

19000--
San José de Cúcuta, 06 de abril de 2022

Ingeniero
Freddy Abalaziano Navarrete Remolina
Administrador del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos
No. 059 (830 10374)
Vegetación de Proyectos y Planificación
ECOPETROL S.A.

Ref. Certificación de pagos del proyecto Acueducto Metropolitano a través del Consorcio FIA.

Respetado Doctor:

Según lo establecido en el convenio interadministrativo de uso de recursos N° 059 del 2017, se relacionan a continuación los pagos girados al proyecto construcción del acueducto metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios.

TERCERO	PAGO N°	CON	FECHA	VALOR DEL PAGO	FUENTE DE RECURSO
OBRAJON S.A. SUBSIDIARIA COLOMBIANA S.A.S.	1 FACTURAS N° 46	19120180	02/11/2018	\$ 2.411.614.189,00	RECURSOS FIA
CORPONOR	2 FACTURAS N° 96	27402020	08/09/2020	\$ 3.099.239.969,00	RECURSOS FIA
	3 FACTURAS N° 96	12402019	02/02/2019	\$ 4.202.372.200,00	RECURSOS FIA
	4 FACTURAS N° 96	18402018	08/04/2018	\$ 4.960.074.000,00	RECURSOS HACIENDA
	5 FACTURAS N° 96	30501809	05/05/2018	\$ 5.402.741,00	RECURSOS FIA
	6 FACTURAS N° 96	12402018	02/02/2018	\$ 7.763.000.000,00	RECURSOS HACIENDA
	7 FACTURAS N° 96	41201806	02/01/2018	\$ 8.095.249.200,00	RECURSOS HACIENDA
	8 FACTURAS N° 96	40801011	07/08/2010	\$ 7.763.000.000,00	RECURSOS HACIENDA
	9 FACTURAS N° 96	40801011	07/08/2010	\$ 3.343.000.000,00	RECURSOS HACIENDA
	10 FACTURAS N° 96	20402021	02/02/2021	\$ 7.763.000.000,00	RECURSOS FIA
EMPRESA HERRERA S.A.	11 FACTURAS N° 96	41112021	07/11/2021	\$ 7.763.000.000,00	RECURSOS FIA
	12 FACTURAS N° 96	25712021	25/11/2021	\$ 3.343.000.000,00	RECURSOS FIA
	13 FACTURAS N° 96	31202021	31/12/2021	\$ 7.763.000.000,00	RECURSOS FIA
	14 FACTURAS N° 96	15412022	15/12/2022	\$ 7.763.000.000,00	RECURSOS FIA

TERCERO	PAGO N°	CON	FECHA	VALOR DEL PAGO	FUENTE DE RECURSO
OBRAJON S.A. SUBSIDIARIA COLOMBIANA S.A.S.	1 FACTURAS N° 46	19120180	02/11/2018	\$ 2.411.614.189,00	RECURSOS FIA
CORPONOR	2 FACTURAS N° 96	27402020	08/09/2020	\$ 3.099.239.969,00	RECURSOS FIA
	3 FACTURAS N° 96	12402019	02/02/2019	\$ 4.202.372.200,00	RECURSOS FIA
	4 FACTURAS N° 96	18402018	08/04/2018	\$ 4.960.074.000,00	RECURSOS HACIENDA
	5 FACTURAS N° 96	30501809	05/05/2018	\$ 5.402.741,00	RECURSOS FIA
	6 FACTURAS N° 96	12402018	02/02/2018	\$ 7.763.000.000,00	RECURSOS HACIENDA
	7 FACTURAS N° 96	41201806	02/01/2018	\$ 8.095.249.200,00	RECURSOS HACIENDA
	8 FACTURAS N° 96	40801011	07/08/2010	\$ 7.763.000.000,00	RECURSOS HACIENDA
	9 FACTURAS N° 96	40801011	07/08/2010	\$ 3.343.000.000,00	RECURSOS HACIENDA
	10 FACTURAS N° 96	20402021	02/02/2021	\$ 7.763.000.000,00	RECURSOS FIA
EMPRESA HERRERA S.A.	11 FACTURAS N° 96	41112021	07/11/2021	\$ 7.763.000.000,00	RECURSOS FIA
	12 FACTURAS N° 96	25712021	25/11/2021	\$ 3.343.000.000,00	RECURSOS FIA
	13 FACTURAS N° 96	31202021	31/12/2021	\$ 7.763.000.000,00	RECURSOS FIA
	14 FACTURAS N° 96	15412022	15/12/2022	\$ 7.763.000.000,00	RECURSOS FIA
TOTAL				\$ 13.300.467.000,00	RECURSOS FIA

La presente relación de pagos se relaciona con el acta 31 de marzo de 2022

Alineamiento:

FRANCISCO ALBERTO BERRONT GALVIS
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico
Cobertura de Bogotá, Santander

Asunto: FRENTE ALICIA BERRONT GALVIS - Noveno de Agua Potable y Saneamiento Básico
Punto: FRENTE ALICIA BERRONT GALVIS - Documento de Agua Potable y Saneamiento Básico
Proyecto: Agua Potable y Saneamiento Básico



	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: GRF-F-59



Se acordó realizar el Comité de Seguimiento No.48 del Convenio de Uso de Recursos No. 055 de 2017 en la ciudad de Bogotá el 19 de mayo de 2022.

El día 29 de abril de 2022, se realiza desplazamiento aéreo a la ciudad de Bogotá.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

Conclusiones y recomendaciones:

El agua y el saneamiento son una prioridad en Norte de Santander, por ello, con soluciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, seguiremos trabajando de manera articulada con el departamento de Norte de Santander para mejorar la calidad de vida de los Nortesantandereanos.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD

JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	GLORIA PATRICIA TOVAR ALZATE	NOMBRE	JUAN PABLO SERRANO CASTILLA

ANEXOS	
PASABORDOS	x
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	x

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/gti-plt-01-politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales-2.0.pdf>

	FORMATO: CERTIFICADO DE PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-26

EL SUSCRITO: Gloria Patricia Tovar Alzate

CARGO: Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial **C. C. No.** 40381591

CERTIFICA QUE:

EL SEÑOR: Juan Pablo Serrano Castilla **C.C. No.** 77094276

CARGO: Subdirector de Programas **DEPENDENCIA:** DIDE

CON EL OBJETO DE:

Participar recorrido de Obra Aliados Convenio de Uso de Recursos No. 055 de 2017 asistir al Comité de Gerencia "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" Convenio de Uso de Recursos No. 1129 de 2020, asistir al Comité de Gerencia OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA COLORADA, LA RAMPACHALA Y EL SALTO DEL MUNICIPIO EL ULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" y participar al Comité de Seguimiento Convenio de Uso de Recursos No. 055 de 2017 Subproyectos 1, 3 y 4 del "ACUEDUCTO METROPOLITANO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

PERMANECIÓ EN LA CIUDAD DE: Cúcuta.

DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DE: 28 y 29 de abril de 2022



FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

Bogotá, 04 de mayo de 2022

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Avianca VUELO
AV9320

BOGOTA CUCUTA
BOG **CUC**

HORA EN SALA 06:14 GRUPO Z ASIENTO 2A STATUS AV*G

PASAJERO Serrano Castilla / Juan Pablo FECHA 28 Abr EQUIPAJE DE MANO SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER




Pase de abordar Avianca

[Eliminar pase](#)

Origen
BOGOTA
Jue, 28 Abr |07:14
Bogota El Dorado Intl, T1

Destino
CUCUTA
Jue, 28 Abr |08:30
Cucuta Camilo Daza, T

Tu talla L incluye
Equipaje de mano: SI/YES
Equipaje en bodega: 3X23kg.

Código de reserva
3LSP8R

Tiquete electrónico
134698951545901

LATAM AIRLINES FECHA 29/04/22 SALIDA 4:20 p. m.

CÚCUTA BOGOTÁ
CUC **BOG**

PASAJERO Juan Serrano Castilla VUELO LA4183 EMBARQUE 3:35 p. m.

TERMINAL 1 PUERTA 2 GRUPO 3 ASIENTO 3F



SEQ 001

Listo 


LATAM Boarding Pass
Se actualizó: hace 3 días

[Eliminar pase](#)

Actualización automática

Permitir notificaciones

Ver en pantalla bloq.

Mostrar en función de la hora o el lugar.

NUMERO DE ORDEN
LA0358487PNU1

SECUENCIA
001

RESERVA
JODIGG

OPERADOR DEL VUELO
LATAM AIRLINES



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.



Fecha: 28/04/2022.
Visita de obra subproyecto 1 en el municipio de Cúcuta.
