

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### ACTA No. 03

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 12 de diciembre de 2023
HORA:	De 10:00 a 10:29 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p><b>Por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso Coservicios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Marlén Pérez, Profesional de apoyo</li><li>• Pedro Nel González, Director de Operaciones</li><li>• Julio César Naranjo, Profesional Topografía</li></ul> <p><b>Por parte de la Consultoría:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laura Olmos, apoyo técnico (Dibujante)</li></ul> <p><b>Por parte de la Interventoría:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Xiomara Alcantar, Dirección Interventoría</li></ul> <p><b>Por parte del MVCT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB</li></ul>
INVITADOS:	No aplica

#### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

#### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de la empresa prestadora de servicios públicos Coservicios, interventoría y profesional del MVCT.

No se conectaron por parte del municipio de Sogamoso.

2. Objetivo de la reunión.

El evaluador líder MVCT asignado al proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO-BOYACÁ”** convoca la mesa de trabajo para realizar seguimiento a los compromisos de entrega de pendientes y subsanaciones.

3. Desarrollo de la reunión.

- El proyecto cuenta con observaciones de tipo documental, legal, ambiental, técnico, financiero y predial, las cuales fueron remitidas formalmente al formulador mediante oficio 2023EE0094081 del 05/10/2023.
- El Ing. Sergio Rodríguez (MVCT), menciona que, de acuerdo a la última comunicación con representantes del formulador (correo electrónico de 27 de octubre de 2023) mencionaron que se contaría con los ajustes para la primera semana de diciembre, sin embargo a la fecha estos siguen pendientes. Por lo anterior el Ingeniero Rodríguez solicita información sobre avances.
- Debido a la cantidad de observaciones con que cuenta el proyecto, la Ing. Xiomara Alcantar (Interventoría), menciona que se vienen realizando avances sobre los mismos, sin embargo no se cumplen con las fechas estipuladas, por lo que requieren de tiempo adicional para las entregas.

Reporta la Ing. Alcantar, menciona que el estudio de topografía se encuentra subsanado, por lo que solicita al profesional del MVCT que se adelante la revisión de este componente el cual será compartido a través de una carpeta virtual. Sobre los demás pendientes técnicos, NO se especifica fecha de entrega de los mismos, sin embargo se estima que el 20 de diciembre del presente curso se puedan tener más avances relacionados con el diseño hidráulico.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Sobre lo anterior, el Ing. Rodríguez (MVCT), menciona que los documentos del proyecto deben ser presentados integralmente, sin embargo, con el ánimo de avanzar, se está en la disposición de recibir los ajustes parciales o a medida que estos se vayan adelantando.

Sobre la carpeta virtual, aclaró el Ing. Rodríguez (MVCT), que se puede trabajar con la información compartida por ese medio con el fin de adelantar las revisiones sobre los avances que se vayan presentando, sin embargo una vez de conformidad se deberá radicar el proyecto de manera oficial ante el MVCT. Por otro parte, cada vez se cargue información en la carpeta virtual, nueva y/o modificada, deberá notificarse al profesional del MVCT.

- Por parte de Coservicios, el Ing. Julio César Naranjo solicitó a representante de la interventoría gestionar reunión con profesionales de la consultoría e interventoría encargados del estudio de topografía, para que en la mesa de trabajo se exponga a los profesionales del MVCT el trabajo que se adelantó para subsanar dicho componente para efectos de comentarios y observaciones por parte de los evaluadores en caso que se presente.

La Ing. Alcantar (Interventoría), quedó de confirmar la fecha, la cual se estima se realice en la presente semana (hasta el 15 de diciembre/2023).

- Por parte de Coservicios, la Ing. Marlen Pérez, solicita a la consultoría e interventoría mayores avances y celeridad frente a las subsanaciones en curso, así como la asistencia de los profesionales responsables del diseño e interventoría puesto que en la presente estos no se hicieron presentes. Sobre los demás componentes, solicitó a la consultoría gestionar reuniones con el MVCT para que se reporten avances en los diferentes componentes
- En la mesa de trabajo a realizarse el 20 de diciembre de 2023, el Ing. Rodríguez (MVCT) solicitó a representante de la interventoría contar con la fechas de entrega de los demás ajustes solicitados al proyecto.
- Sobre la gestión de los trámites ambientales, se menciona que estos se encuentran pendientes puesto que se requieren los diseños definitivos para presentar la solicitud.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

El proyecto cuenta con pendientes de tipo documental, legal, ambiental, técnico, financiero y predial. El componente institucional se encuentra de conformidad de acuerdo con la revisión realizada por profesional de la Subdirección de Gestión Empresarial del VASB MVCT.

Se esperaban las subsanaciones solicitadas al proyecto para la primera semana de diciembre de 2023, sin embargo no se cumplió compromiso.

Entre el 12 y 15 de diciembre de 2023, se espera realizar reunión con representantes del formulador quienes presentaran avances en los ajustes realizados sobre el estudio de topografía.

El 20 de diciembre de 2023 se realizará seguimiento al avance de los demás ajustes solicitados al proyecto, y se espera que en la mesa de trabajo el formulador comprometa nuevas fecha de entrega de ajustes.


**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo: Seguimiento avances topografía	Consultoría Interventoría ESP Municipio MVCT	15/12/2023
2	Mesa de trabajo: Seguimiento avances componente técnica y se realizarán	Consultoría Interventoría ESP	20/12/2023

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	compromisos de entregas de ajustes	Municipio	
		MVCT	

**FIRMAS (Imágenes de la reunión virtual):**

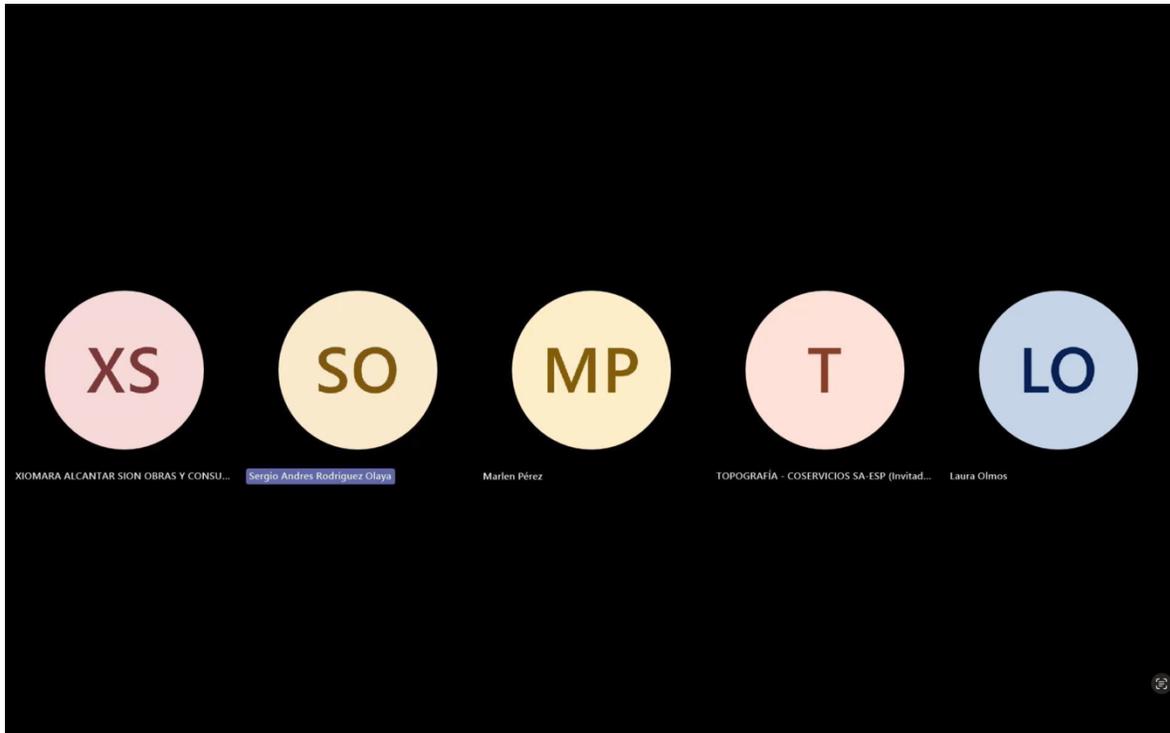

Anexo(s): No aplica

Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB  
 Fecha: 20/12/2023
