	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA COMITÉ – 4 DE OCTUBRE 2023.

DATOS GENERALES

FECHA:	4 de octubre 2023
HORA:	De 8: 15 A.M p.m. a 10: 30 p.m. horas 2
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	Ingeniero Darío López, apoyo a la supervisión -Vallecaucana de aguas (entidad contratante) Ingeniera Gloria Elena Granada. Directora de Interventoría de la Unión Temporal, Eva. Ingeniero José Gentil Gómez. Consorcio de Bocatomas Zarzal del contratista. Ingeniera Sara de Jesús Lozano Hinestroza – Ingeniera de seguimiento MVCT Dra. Ana Isabel Medina Secretaria de infraestructura Municipio de Zarzal.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes en el comité
2. Revisar estado de los compromisos adquiridos en el último comité – 26/09/2023
3. Estado de los permisos, predios, servidumbres licencias y/o autorizaciones adicionales requeridas para garantizar la ejecución normal del proyecto.
4. Estado de avance del proyecto Construcción para la optimización de la estación de bombeo sector cumba en el municipio de Zarzal, incluye red de aducción hasta el sistema de tratamiento y unidades de almacenamiento
5. Otros temas (nueva designación supervisor del municipio, inconvenientes en la obra, probable presentación de reformulación del proyecto, TRM costos de interventoría).

DESARROLLO:

1. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES (ver datos generales –Asistentes)
Siendo las 2 p.m am del día **4 de octubre 2023**, se realiza comité técnico para el proyecto ***Construcción para la optimización de la estación de bombeo sector cumba en el municipio de Zarzal, incluye red de aducción hasta el sistema de tratamiento y unidades de almacenamiento.***

2. Revisar estado de los compromisos adquiridos en el último comité de fecha 26/09/2023

Se realiza lectura de los compromisos adquiridos y posterior se describe su estado de acuerdo con el responsable

Compromisos comité anterior	responsable	Estado de compromisos
Consolidación de tareas por parte del supervisor asignado del municipio de Zarzal antes de salir a vacaciones.	Municipio de Zarzal	El municipio aclara que la persona que está actualmente encargada sale a vacaciones desde la fecha de hoy 12 de octubre regresando el 4 de noviembre de 2023, que la nueva persona encargada (ingeniero Luis Montaña) conoce bien el estado y el proceso del proyecto. El ejecutor Valle del Cauca indica que tiene los números de contactos.
Ayudar a gestionar que la ANI contrate la interventoría para poder solicitar el permiso	Vallecaucana de Aguas	El ejecutor señala que tema lo estaba ayudando a mover la alcaldesa de zarzal que ya habló con un funcionario la cual responden que está en camino de que lo hagan. Pero pues no hay fecha todavía para tenerlo.
Gestionar recibo de pago para modificar concesión de aguas y que Acuavalle pague Hacer gestión para obtener pronto el permiso ante PISA.	Vallecaucana de Aguas	Se indica por parte del ejecutor las actividades adelantadas señalando lo siguiente: Se ha estado visitando al ingeniero de infraestructura de la gobernación y gracias a toda esa gestión quedaron que el día de mañana 13/10/2023 les van a entregar ya una primera respuesta y ahí el ingeniero de infraestructura me adelantó que había 3 observaciones que van a salir para subsanar y así Procederán a organizar para volver a radicar y que ya quede listo este proceso.
Presentar en power poin todo el sustento para la reformulación que va requerir el proyecto de acuerdo con lo expresado por el contratista y ejecutor en comité del 26 y 27 de septiembre de 2023	Vallecaucana de Aguas (contratistas obra e interventoría)	El ejecutor señala que ya fue presentado por parte del contratista e interventor la reformulación a Vallecaucana de agua la cual se encuentra en revisión, señalando que son aproximadamente 55 ítem que requieren cambios. Se generaron algunas inquietudes por parte del ejecutor respecto a: 1. TRM cuando el contratista que ganó la licitación pasó su propuesta el dólar estaba a un precio y al momento ya de comprar la tubería importada estaba muy alto en la TRM entonces hay que reconocerlo entonces le queríamos preguntar eso en qué parte se incluye si eso va en la misma reformulación como un ítem más o eso se trata diferente. 2. Respecto al otro si para el contrato de la interventoría donde se requiere ampliar plazo los recursos si pueden ser aportados por el MVCT así como una parte de los recursos

	para la reformulación? 3.Sobre la presentación de la reformulación ante el MVCT si los recursos que van aportar son de la Gobernación? El MVCT da respuesta a las inquietudes indicando lo siguiente: 1.Respecto al incremento El MVCT señala que realizará la consulta al grupo de viabilización de proyectos del MVCT. 2.Se cita el numeral sexto de la cláusula tercera respecto a las obligaciones del municipio la cual se realiza la lectura de dicha obligación. Señalando que es obligación del municipio gestionar los recursos que se requieran para la finalización del proyecto. (ver minuta del CUR) El municipio indica que no cuenta con los recursos necesario para apoyar financieramente la reformulación, sin embargo Vallecaucana de agua señala que ya tienen un CDP cuyos recursos son de la Gobernación del Valle del Cauca, que respalda el valor que requiere la reformulación. MVCT recomienda incluir el valor adicional que se requiere para el contrato de la interventoría. 3.Por último se indica en el comite por parte del MVCT que todas las modificaciones que se realicen al proyecto se debe presentar ante el MVCT para su respectiva aprobación para la cual debe ser allegado con sus respectivos soportes y justificación técnica, financiera anexando CDP si requiere más recursos. La presentación debe ser radicada por el municipio de Zarzal y aprobada por la interventoría y visto bueno del ejecutor..
--	--

3. Estado de los permisos, predios, servidumbres licencias y/o autorizaciones adicionales requeridas para garantizar la ejecución normal del proyecto, se anexa matriz compartida por el contratista señalando el estado de avance y tramites adelantados, la cual se relaciona a continuación (ver matriz)

4. Estado de avance del proyecto a la fecha

Avance de obra: 12.36%

Avance financiero: 53.80%

Avance en tiempo: 56.4 %

Las Actividades ejecutadas esta semana fueron:

1) FRENTE 1 (BOCATOMA):

- demoliciones caseta no.2

2) FRENTE 2 CUADRILLA 1

- excavaciones,
- cama de arena
- instalación de tubería hd 18 plg hasta k0+898 hd
- entibados
- rellenos con material de sitio y material importado
- instalación de codos 45, 22.5, 11.25 grados
- instalación de niples pasamuros sobre cámaras ventosas y cámaras de purga
- instalación de tee hd 18"
- instalación unión autoportante
- construcción de cámara ventosa.
- construcción anclajes de concreto

3)FRENTE 2 CUADRILLA 2:

- instalación tubería hd 18 plg hasta el k1+921
- excavaciones
- cama de arena
- entibados
- rellenos con material de sitio y material importado
- instalación de codos de 45, 22.5, 11.25 grados
- concreto para anclajes

5. Otros temas (Resolución permiso de concesión de agua otorgado por la CVC, inconvenientes en la obra).

Inconvenientes de la obra

El contratista indica que se han encontrado un suelo conglomerado ático que les ha dificultado ese avance que están mirando a ver cómo pueden volver a nivelarse en este momento tienen un retraso de 8 días respecto a la instalación, entonces eso será tema de análisis para ver cómo podemos resolver sacar esta brecha que tienen. con la interventoría están identificando los tipos de suelos estaba contemplado entre el dentro de los estudios de suelos fue analizado y tenemos que generar un informe que un este, un valor unitario por conglomerado, porque evidentemente señala el contratista, no son excavación normal.

Permiso concesión de agua actual:

Señala el ejecutor que se

el permiso de ocupación de cauce, se encuentra relacionado con el permiso de concesión de agua otorgado por la CVC.

Se espera aclarar por qué el permiso es sobre el mismo río, está pendiente pago para realizar visita por parte de la CVC.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Subsanar las observaciones requeridas por PISA para el permiso, radicar de nuevo.	Empresa Vallecaucana de Aguas.	20/10/2023
3	Presentar la relación de las actividades ejecutadas del 26 al 12 de octubre de 2023	Empresa Vallecaucana de Aguas.	12/10/2023
4	Continuar con los trámites requeridos para la ejecución de la obra. Respecto a los permisos ante las autoridades competentes (CVC, PISA, ANI otros). Presentar avance de tramites (soportes radicados).	Municipio de Zarzal	Hasta obtener los permisos
5	Revisar reformulación presentada por el contratista al ejecutor	Empresa Vallecaucana de Aguas.	30/10/2023
6	Realizar trámite ante PISA presentar los ajustes requeridos	Empresa Vallecaucana de Aguas. Municipio de Zarzal.	23/10/2023
7	Gestionar los pagos pendientes para la visita técnica ante la CVC	Municipio de Zarzal	25/10/2023
8	Revisar con el equipo de evaluación de proyectos del MVCT el incremento de acuerdo al TRM.	MVCT	20/10/2023
9	Programar próximo comité técnico	MVCT	27/10/2023

Matriz

Relación de estado de permisos estado y gestión adelantada

Lista de Asistencia:

FIRMAS:

Ingeniero Darío López

Apoyo a la supervisión -Vallecaucana de aguas (entidad contratante)

Ingeniera Gloria Elena Granada.

Directora de Interventoría de la Unión Temporal,

Dra. Ana Isabel Medina


Secretaria de infraestructura Municipio de Zarzal.

Ingeniero José Gentil Gómez.

Consorcio de Bocatomas Zarzal del contratista.

Ingeniera SARA LOZANO

Contratista MVCT

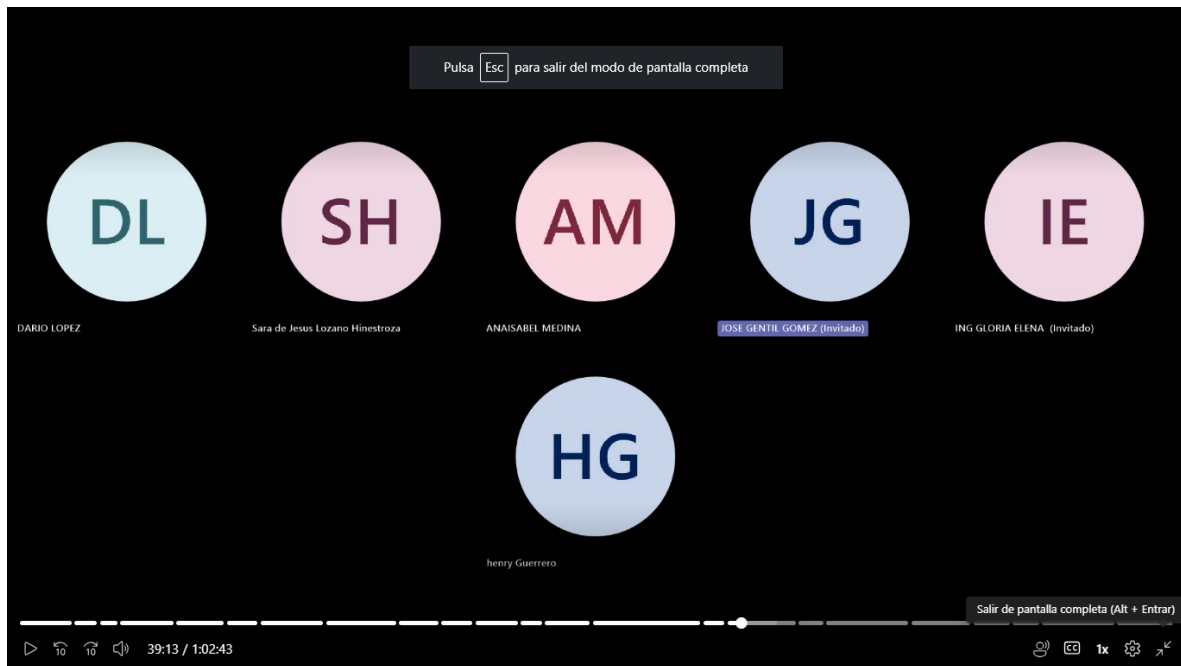

Se anexa a la presente acta audio de la reunión

Elaboró: Sara Lozano

Fecha: 12/10/2023
