

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

## ACTA

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	22 de noviembre de 2023
HORA:	2:30 - 4:30 Pm
LUGAR:	Reunión virtual MVCT
ASISTENTES:	Alcaldía de Ipiales, oficina de planeación de Empoobando, Oficina Financiera de Empoobando.

### **ORDEN DEL DÍA:**

Comité de seguimiento 22 de noviembre CUR 1144-2021 Ipiales cuyo objeto es: Optimización del sistema de acueducto y construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable municipio de Ipiales departamento de Nariño .

### **DESARROLLO**

La supervisión por parte del Empoobando da a conocer qué en el mismo momento de celebración del comité ha entregado o ha enviado vía correo electrónico el resultado del análisis del informe previo Entregado por parte de la interventoría. Al respecto El Ministerio manifiesta que dará lectura al mismo y Realizará la convocatoria para el siguiente comité.

Igualmente se verifica en la plataforma sigeVAS y se observa que dicho informe no se encuentra cargado y se solicita realizarlo.

El supervisor por parte de Ipiales informa que mediante comunicados 8401601287 del 17 de agosto de 2023, 8401601299 del 28 de agosto de 2023 y 8401601375 de 18 de noviembre de 2023 solicitó a la interventoría del contrato aclarar y subsanar lo solicitado por parte del MVCT y que recibió respuesta con respecto al informe previo donde el interventor observó que el diseño debe sufrir una serie de modificaciones. mismas que se revisarán por parte del MVCT .

Igualmente el MVCT solicita informar sobre la fecha de vencimiento de la concesión de agua, y Empoobando informa que finaliza en marzo de 2024. Por lo tanto se requiere que Empoobando documente las gestiones realizadas en búsqueda de la prórroga de la concesión de agua.

Se solicita informar cual fue la conclusión del interventor frente al diseño de planta nueva, considerando el tipo de agua a tratar. El supervisor por parte de Empoobando informa que el tratamiento estaría condicionado a la optimización de la bocatoma y frente a ello se recuerda la obligación que le asiste al municipio de optimizar la bocatoma considerando el numeral segundo de la cláusula tercera del CUR 1144-2021 que a la letra reza: “a ejecutar con recursos propios, el

	<b>FORMATO:</b> ACTA  <b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

componente de optimización de bocatoma, toda vez que hace parte integral del proyecto y es requerido para garantizar el adecuado funcionamiento del proyecto. (...)”.

Por su parte, el supervisor de Empoobando informa que el Municipio de Ipiales destinó recursos para que Empoobando en calidad de ejecutor, adelante el proceso de contratación de este componente, y que a la fecha ya cuenta con acto administrativo de adjudicación.

Se solicita el cargue de los informes de ejecución por parte de la supervisión de Empoobando con base en la información reportada por parte del interventor del proyecto. Dichos informes se deben entregar al MVCT y deben cargarse en la plataforma en los cinco días subsiguientes al mes causado.

Empoobando explica que se encuentran a la espera del acta de avance para definir el porcentaje de ejecución. Al respecto el MCVT aclara lo contemplado en la cláusula Décima primera del CUR 1328-2023, que establece que el municipio y el ejecutor realizarán los informes de la ejecución el proyecto dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, en los cuales se incluye el estado de avance técnico, administrativo y financiero, donde el informe no puede estar supeditado al reporte financiero y que debe diferenciarse la ejecución física de la ejecución financiera. Para el informe físico se debe hacer seguimiento al cronograma de ejecución, mismo que se ha venido insistiendo su entrega por parte de este MVCT.

Se reitera la entrega del informe previo con las suficientes evidencias técnicas de lo analizado por parte del interventor del contrato, aspecto que se contempla dentro del informe que a la fecha entrega Empoobando y al cual se le dará estudio por parte del MVCT.

Empoobando manifiesta que para éste último informe el interventor realizó la entrega del cronograma de trabajo y se manifiesta que a la fecha se tiene un porcentaje de avance del proyecto igual al 8%.

Igualmente se explica cómo elaborar el cronograma ejecutivo para medir el porcentaje con base al alcance del proyecto para las actividades específicas que se reportan en sigevas.

El MCVT explica también la necesidad de adelantar el trámite correspondiente para el desembolso No 2 correspondiente al valor líquido cero. (PGN 2021).

Culminada la reunión de seguimiento del proyecto, fueron adquiridos algunos compromisos por las partes intervinientes en el proyecto objeto del CUR No. 1328-2023, las cuales se relacionan a continuación:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remitir al MVCT y cargue en sigeVAS de informes de supervisión actualizados	Empoobando	27/11/2023

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

2	Reporte en SIGEVAS semanal del avance del proyecto programado vs ejecutado	Empoobando	23/11/2023
---	--	------------	------------

Para constancia de lo anterior se firma lista de asistencia parte de los convocados hoy 22 de noviembre, del año 2023.

## FIRMAS

Los participantes de este comité fueron:


Marcela Enríquez G, apoyo a la supervisión por parte del MVCT

Juan Manuel Sarasty, supervisor contrato de obra e interventoría por parte de Empoobando

Omar Bernal, por parte de Planeación de Empoobando

Julio Vicente Burbano, gerente Empoobando

María Eugenia Meneses, funcionaria de Financiera de Empoobando

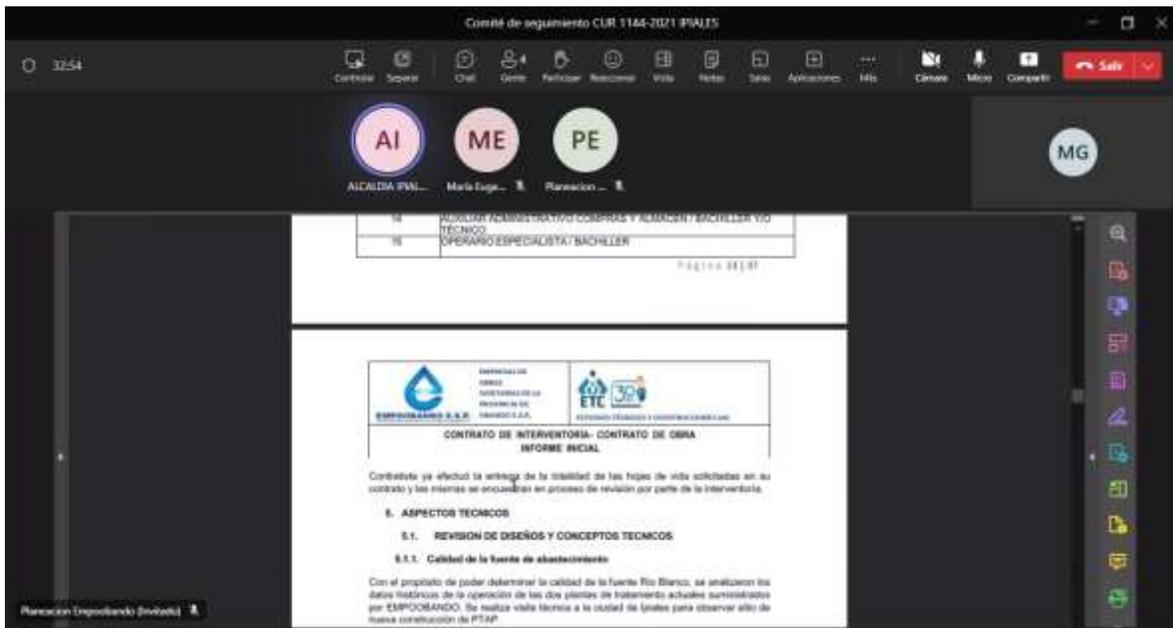

Elaboró: Marcela Enríquez García - Contratista Subdirección de Proyectos MVCT.

Fecha: 22 de noviembre de 2023.
