

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 29

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 16-01-2024
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am horas
LUGAR:	Virtual.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Nicolas Ortiz, Ingeniero de Apoyo PDA de Bolívar. Manuel Medina, Secretario de Planeación – San Juan de Nepomuceno. Daniela Maria – Consorcio Interalcantarillado F2
INVITADOS:	Freddy Álvaro Lozano España – Gestor Zona Norte – Subdirección de Proyectos MVCT Juan Sebastián Clavijo Romero – Cotroller Zona Norte – Subdirección de Proyectos MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación Asistentes
2. Presentación del proyecto por parte de PDA de Bolívar
3. Dudas y/o inquietudes del Municipio.
4. Compromisos

DESARROLLO:

1. Se realiza la presentación de los asistentes a la reunión.
2. EL PDA de Bolívar informa que se realizó una reunión con la veeduría, el pasado 15 de enero de 2024 donde se socializo el proyecto, luego de esto inicia con la presentación del mismo, donde muestra los avances de obra, la justificación de las suspensiones anteriores y por qué el proyecto se reformulo el pasado 6 de noviembre de 2023 ante el comité técnico del MVCT.
El apoyo del MVCT indico que el presente comité se desarrolló con el fin de articular y trabajar mancomunadamente con la nueva alcaldía municipal y el ejecutor.
3. Luego de la presentación el secretario indico que no tenía ninguna duda respecto al proyecto, pero solicita que se le allegue la información y los planos actualizados del proyecto.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

4. A continuación, se detallan los compromisos pactados en la presente reunión:

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Visita a obra	PDA Bolívar	17-01-2024
2	Socialización con el operador del Municipio	PDA Bolívar	18-01-2024
3	Entrega de planos del proyecto	PDA Bolívar	17-01-2024

FIRMAS:

The screenshot displays a web application titled 'Comité de gerencia San Juan de Nepomuceno'. The main content area is divided into several sections:

- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:**
 - Alcance:**
 - Suministro e instalación de 27.664 m de redes secundarias de alcantarillado en tubería de PVC de 8"
 - Suministro e instalación de 3.020 m de colector en tubería de PVC así:
 - 82 m de 10"
 - 2.442 m de 12"
 - 219 m de 14"
 - 101 m de 16"
 - 176 m de 20"
 - 1076 conexiones domiciliarias incluyen conexión de 6" y cajilla de inspección.
 - 344 pozos de inspección
 - Construcción EBAR incluye 4 bombas de 15-20 HP, 60,2 l/s y altura de elevación de 13 MCA
 - Construcción de 2 desarenadores para un caudal de 180 l/s; 2 sedimentadores primarios para 57 l/s; 2 filtros percoladores diseñados para 57 l/s y lechos de secado cada uno de 179,6m2.
 - Beneficiarios:**

Se beneficiarán de manera directa el 44% de la comunidad del municipio de San Juan Nepomuceno del departamento de Bolívar, con población actual de **12.440** habitantes en 2022 y una población proyectada de **16.289** habitantes en 2046.
 - Ejecución:**

El porcentaje de ejecución de la obra **física** hasta la fecha de suspensión es de 7.99%
El porcentaje **financiero** es de 7.25%.
 - Impacto:**

Mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones de salubridad del total de la población urbana y su área de influencia, presente y futura afectada históricamente por vertimientos de aguas residuales a cielo abierto y sus efectos nocivos como la atracción de vectores transmisores de enfermedades, así como la remediación ambiental por la contaminación actual de suelos y cuerpos de agua superficiales, y subterráneos que puedan existir; el proyecto representa un incentivo indiscutible para la economía de la región, no sólo por la construcción de las obras civiles, la demanda de mano de obra no calificada, los empleos directos e indirectos y la demanda de servicios no especializados, si no, también, promoviendo la construcción de otras obras de infraestructura de gran envergadura como la pavimentación de calles, la construcción de andenes y equipamiento urbano y, en general, constituye un estímulo fundamental para el futuro desarrollo socioeconómico de la región.

El municipio no cuenta con un sistema de recolección, transporte, evacuación ni tratamiento de las aguas residuales de la población urbana, se pasará de cobertura cero a cobertura del 44% del casco urbano.
 - Cobertura:**
- Logos:** Aguas Bolívar, Vivienda, and logos for 'INTERALCANTARILLADO F2' and 'OFASE 2 SAN JUAN'.

On the right side, there is a vertical list of user avatars and names: CF (CONSORCIO INTERALCA...), NZ (Nicolás Ortiz Zuñiga), MM (Manuel Medina (Invitado)), and VR.

The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the date 'ENERO 2024' and several open applications including 'Calendario | Microsoft...' and 'COMITE DE GERENCL...'.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Comité de gerencia San Juan de Nepomuceno

28:07

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

Mostrar conversación

SEGUIMIENTO

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

AVANCE FINANCIERO OBRA: 7,25%

PAGOS OBRA

ACTA No	VALOR	VALOR ACUMULADO	ESTADO
1	\$ 1,282,531,217.31	\$ 1,282,531,217.31	Pagada
2	\$ 427,316,415.03	\$ 1,709,847,632.34	Pagada

PAGOS INTERVENTORIA

ACTA No	VALOR	VALOR ACUMULADO	ESTADO
1	\$43,554,786.96	\$ 43,554,786.96	Pagada
2	\$31,538,622.96	\$ 75,093,389.92	Pagada
3	\$31,538,622.96	\$ 106,632,012.88	Pagada
4	\$31,459,767.01	\$ 138,091,779.89	Pagada
5	\$40,528,200.89	\$ 178,619,980.58	Pagada
6	\$30,040,360.00	\$ 208,660,340.58	Pagada
7	\$30,040,360.00	\$ 238,700,700.58	Pagada
8	\$30,040,360.00	\$ 268,741,060.58	Pagada
9	\$30,040,360.00	\$ 298,781,420.58	Pagada

INTERCANTARILLADO PE
Nicolás Ortiz Zuñiga

CONSORCIO FASE 2
SAN JUAN

8

ENERO 2024

Calendario | Microsoft... Comité de gerencia S... COMITE DE GERENCL

10:29 a. m.

CF
CONSORCIO INTERCALA...
NZ
Nicolás Ortiz Zuñiga
MM
Manuel Medina (Invitado)
VR

Comité de gerencia San Juan de Nepomuceno

29:25

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

Mostrar conversación

SOCIALIZACIONES



Se realizó jornada de socialización de suspensión con veedores ciudadanos, líderes sociales y comunidad de los barrios beneficiarios de la segunda fase.

INTERCANTARILLADO PE
Nicolás Ortiz Zuñiga

CONSORCIO FASE 2
SAN JUAN

9

ENERO 2024

Iniciar sesión en Outlo... Calendario | Microsoft... Comité de gerencia S... COMITE DE GERENCL

10:30 a. m.

CF
CONSORCIO INTERCALA...
NZ
Nicolás Ortiz Zuñiga
MM
Manuel Medina (Invitado)
VR

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Comité de gerencia San Juan de Nepomuceno

30:02

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

Mostrar conversación

AJUSTES A LOS DISEÑOS- REFORMULACIÓN

MOTIVOS POR LOS CUALES SE REQUIERE AJUSTAR EL PROYECTO

HIDRÁULICA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

- Aumento de diámetros por inclusión de potencial de expansión en los barrios periféricos al proyecto.
- Cambio en el trazado de algunos tramos del colector principal
- Construcción de sifón invertido en tramo del colector principal
- Instalación de tubería mediante tecnología de perforación sin zanja

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

- Cambios en la capacidad de las bombas
- Cambios en el componente eléctrico

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

- Cambios en la capacidad de los procesos unitarios de la planta
- Cambios en la capacidad de los sistemas de bombeo internos de la planta

Radicación de los documentos de reformulación por parte del PDA: 10 de abril de 2023

10

INTERCANTARILLADO PE CONSORCIO FASE2 SAN JUAN

Nicolás Ortiz Zuñiga

CF CONSORCIO INTERCALA...

NZ Nicolás Ortiz Zuñiga

MM Manuel Medina (Invitado)

VR


ENERO 2024 Iniciar sesión en Outlo... Calendario | Microsoft... Comité de gerencia S... COMITE DE GERENCL

Comité de gerencia San Juan de Nepomuceno

36:34

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

5. Cambios en estación de bombeo EBAR

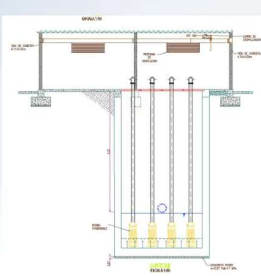

Cambios eléctricos

Como consecuencia del aumento a la capacidad de las bombas en la EBAR y el ajuste a las condiciones eléctricas actuales del municipio se realizan ajustes al componente eléctrico.

VIABILIZADO	AJUSTADO
4 bombas sumergibles de 15-20 HP, caudal de diseño de 60,2 L/S y una altura total de elevación de 13 MCA	4 bombas sumergibles de 25 HP, caudal de diseño de 69,7 L/S y una altura total de elevación de 15 MCA

15

INTERCANTARILLADO PE CONSORCIO FASE2 SAN JUAN

Nicolás Ortiz Zuñiga

NZ Nicolás Ortiz Zuñiga



CF CONSORCIO INTERCALA...

MM Manuel Medina (Invitado)

VR

ENERO 2024 Administrar informes... Calendario | Microsoft... Comité de gerencia S... COMITE DE GERENCL

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

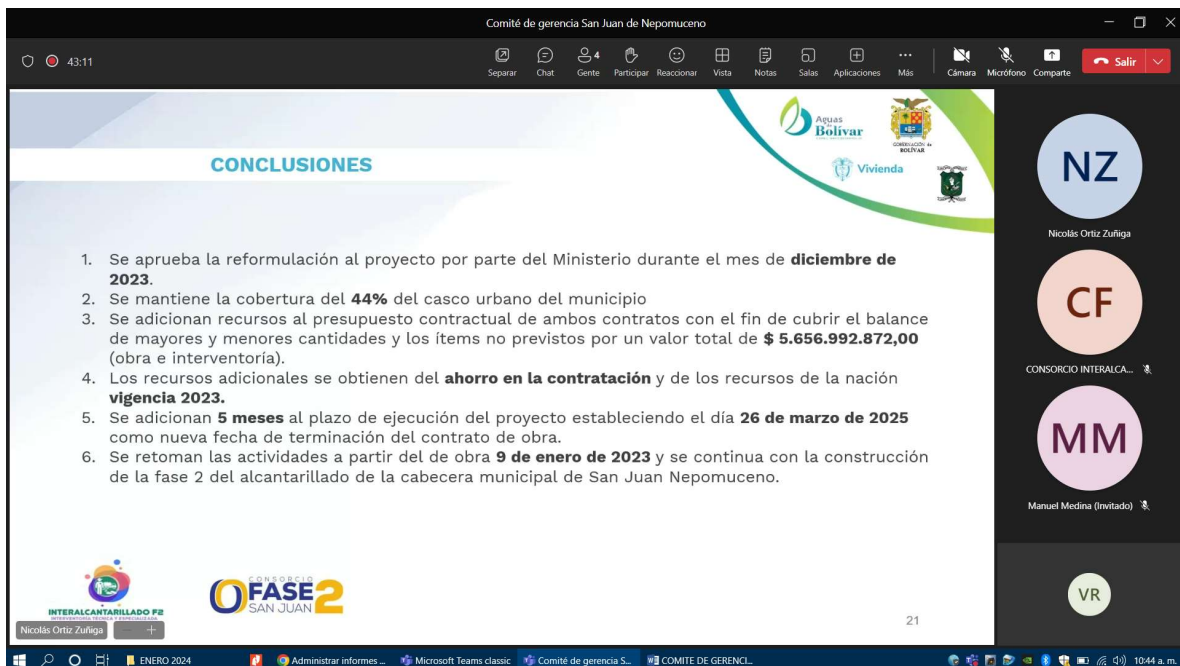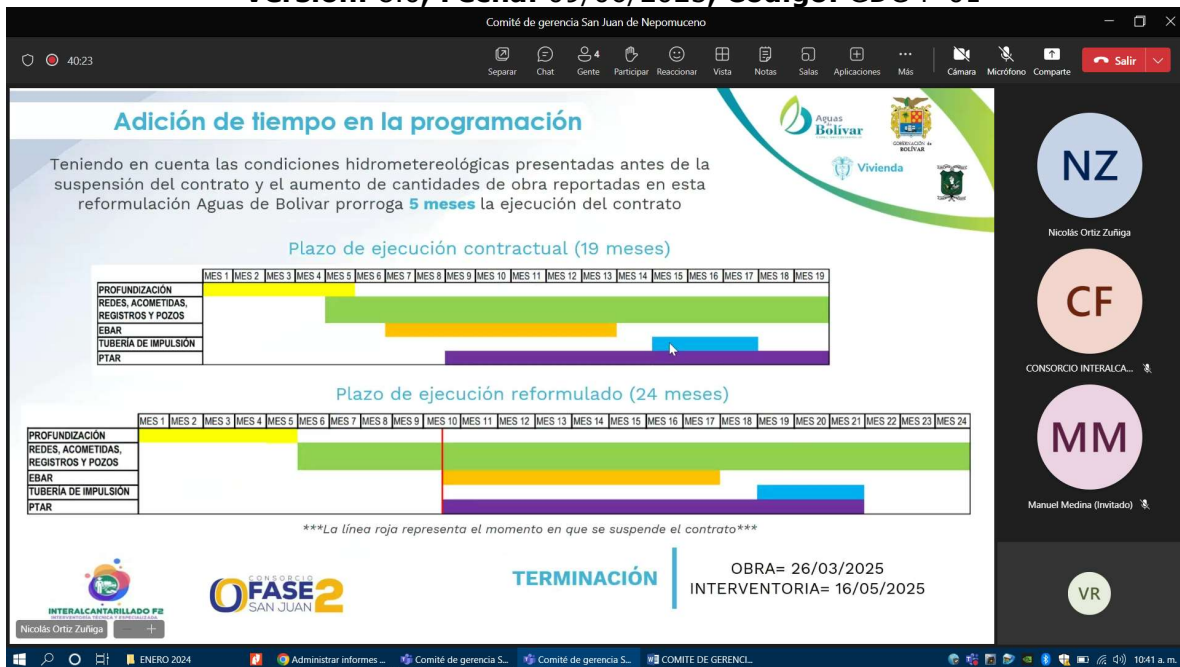

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Revisó:
Fecha: 16-01-2024
