

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 27 de febrero de 2024
HORA:	De 2:00 pm a 3:30 pm
LUGAR:	Virtual – Microsoft teams
ASISTENTES:	<p>Luis Felipe Gutiérrez Gerente de Infraestructura del Distrito de Santa Marta</p> <p>Edgar Pedraza Ingeniero Civil Secretaria Infraestructura del Distrito de Santa Marta</p> <p>Juan Manuel Rodríguez Arquitecto Secretaria Infraestructura del Distrito de Santa Marta</p> <p>Javier Fernández Ingeniero Ambiental y Sanitario Secretaria Infraestructura del Distrito de Santa Marta</p> <p>Eleazar Acosta Ingeniero Civil Secretaria Infraestructura del Distrito de Santa Marta</p> <p>Sofia Polo Asesora Jurídica Infraestructura del Distrito de Santa Marta</p> <p>Eduardo Enrique Cañas Ramos – Evaluador líder del grupo evaluación de proyectos MVCT.</p> <p>José Manuel Vásquez Leal Coordinador Grupo Evaluación de Proyectos MVCT</p>
INVITADOS:	

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

OBJETO:

Mesa de trabajo virtual de seguimiento a los compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 12 de febrero de 2024 en el marco del Plan de Choque del Acueducto Santa Marta.

DESARROLLO:

1. Presentación de la mesa de trabajo.

El ministerio indicó que le motivo de la reunión es conocer el avance a los compromisos adquiridos en la última mesa de trabajo del 12 de febrero de 2024.

A continuación se desarrolla el seguimiento a cada proyecto del plan de choque.

1. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado: se había acordado en la mesa de trabajo del 12 de febrero remitir al ministerio los TDR el día 21/02/2024, lo cual el Distrito no lo logró, argumentando que solicitaron apoyo a la sociedad de ingenieros de Santa Marta lo cual retrasó la entrega. El Distrito se comprometió a remitir dichos TDR el día 28/02/2024. Se mantiene la meta de tener ajustado y concertado los TDR el día 15/02/2024.

2. Retiro del proyecto de acueducto El Curval: Para el día 16/02/2024 el Distrito se había comprometido a solicitar la devolución y retiro del proyecto, la cual fue radicada el día 22/02/2024. Actualmente se encuentra en proceso de firma el oficio de devolución del proyecto.

3. Radicación de dos (2) nuevos proyectos: Para el día 29/02/2024 el Distrito se había comprometido a radicar dos nuevos proyectos de inversión en el marco del plan de choque que son a) construcción de la primera etapa de la PTAP El Curval (para una capacidad de 800 l/s) con la conducción hasta Mamatoco y b) construcción de las redes de distribución de los 7 barrios y el corregimiento de Bonga. En la mesa de trabajo del día de hoy manifestaron que los dos proyectos serán radicados el día 04/03/2024, dado que se encuentra en la fase de formulación.

4. Planta desalinizadora de Taganga: El Distrito indicó que actualmente tienen identificado dos predios, el primero ubicado en la instalaciones del colegio IED de Tanganga el cual se encuentra actualmente en construcción, dicho predio y proyecto es propiedad del Distrito de Santa Marta; el segundo predio es un lote ubicado en la parte norte de la playa donde funcionó en el pasado un PTAR,

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

este predio se encuentra en revisión de títulos. El Distrito Manifestó que la Essmar E.S.P. sería la entidad que prestaría el apoyo para la formulación del proyecto.

5. Sectorización Hidráulica: El Distrito manifestó que a través del Banco Corporación Andina de Fomento – CAF se realizará la financiación de la preinversión de este proyecto, para lo cual se presentará en la próxima mesa del agua un cronograma de la financiación y ejecución del proyecto.

6. Acueducto Rio Toribio y Córdoba: En este punto el ingeniero Gutiérrez realizará una cotización de la actualización de los diseños y será presentado en la próxima mesa del agua.

7. Optimización de las redes de Alcantarillado: se acordó en la mesa de trabajo avanzar con los proyectos de acueducto para luego retomar los temas de alcantarillado.

8. Se acordó realizar una mesa de trabajo virtual con la ESSMAR E.S.P. para el día 29/02/2024 a las 10 am, con el fin de conocer el avance de la formulación del proyecto de desalinización de Taganga y unos proyecto que han radicado ante la Superservicios.


COMPROMISOS

Se realizará mesa de seguimiento a los compromisos adquiridos el día 15/03/2024.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de los términos de referencias – TDR al Ministerio con el fin de adelantar una revisión previa y concertación de los mismos	Distrito de Santa Marta	28/02/2024
3	Radicación de dos (2) nuevos proyectos.	Distrito de Santa Marta	04/03/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:

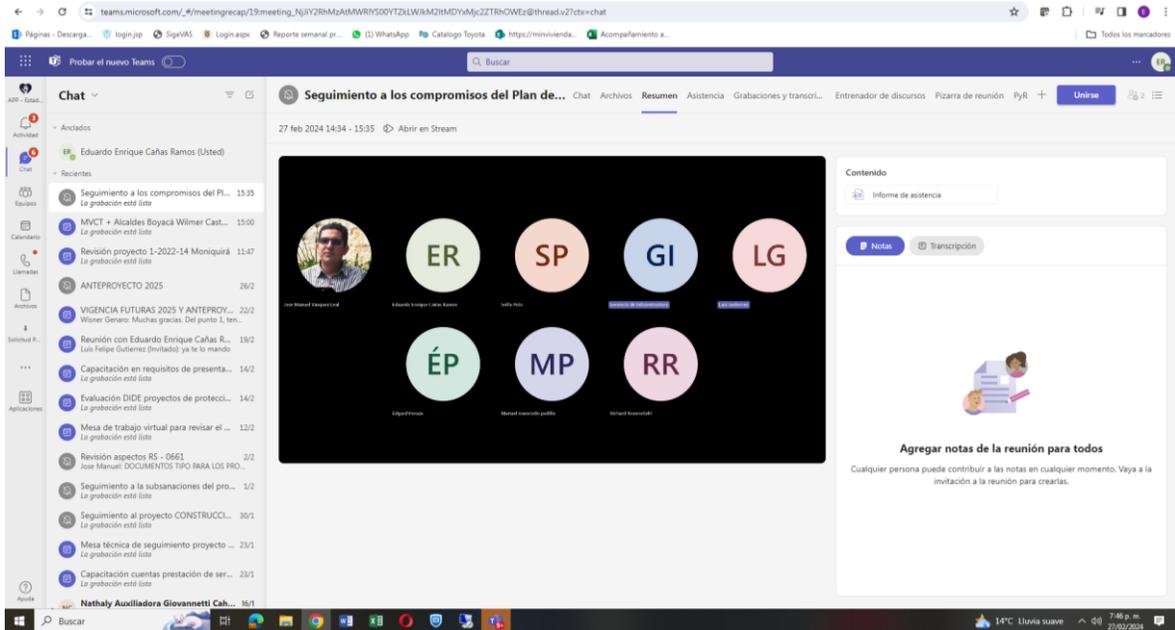

Elaboró: Eduardo Cañas Ramos
Revisó:
Fecha: 27/02/2024
