

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. --**

**DATOS GENERALES**

|             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | 09 de febrero de 2024                                                                                     |
| HORA:       | De 10:00 a 11:00 horas                                                                                    |
| LUGAR:      | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT»                                                        |
| ASISTENTES: | SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO –<br>GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER<br>MUNICIPIO EL ZULIA |
| INVITADOS:  |                                                                                                           |

**ORDEN DEL DIA:**

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB» - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial «DIDE» - Subdirección de Proyectos «SP». Convenio de Uso de Recursos «CUR» 862-2021. SIGEVAS 2-2019-15. Proyecto Optimización sistema acueducto veredas La Colorada, La Rampachala y El Salto Municipio El Zulia (Norte de Santander).

Seguimiento avance de obra paso elevado N° 5. Paso 7.

**DESARROLLO:**


El MVCT solicita información respecto del estado de avance del paso elevado N° 5, ya que este frente de obra presentó una dilación de 21 meses, desde marzo 2022 hasta noviembre 2023, con motivo de la necesidad de expedición de permiso INVIAS para la construcción del cruce elevado N° 5.

El Ejecutor reporta que dicho trámite concluyó con la expedición de la Resolución INVIAS 003485 el 03 de octubre de 2023, la generación de Acta de Inicio del precitado acto administrativo el 10 de octubre de 2023 y el reinicio de los contratos de construcción e interventoría de construcción el 28 de noviembre de 2023.

El estado actualizado de este frente de obra se puede observar en las siguientes imágenes:

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Figura. Construcción paso elevado 5 y paso subvial 7

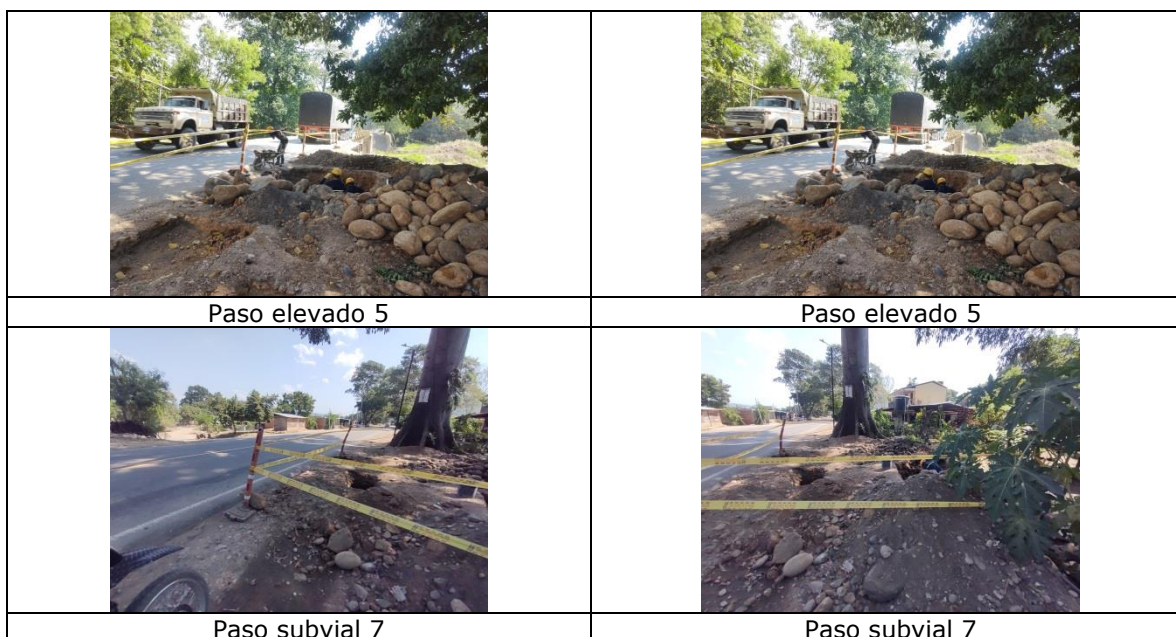

Fuente: MVCT

El paso elevado 5 se ubica entre el PR inicial 48+335 y el PR final 50+143, de la vía que comunica al Municipio de El Zulia con Sardinata, con código 7009 de la ruta nacional 70. Para este paso elevado fue requerido la expedición del precitado permiso INVIAS de uso de zona de vía para la instalación de la tubería en D=3".

Sobre el paso 7, el Ejecutor reporta que éste cambió su método constructivo de elevado, a perforación horizontal dirigida, conservándose el plan financiero del proyecto, motivo por el cual dicho cambio no requiere de reformulación ante MVCT. También fueron reiniciadas las actividades de instalación de acometidas domiciliarias pendientes (20) en la vereda La Colorada.

Sobre el plazo de ejecución contractual, el Ejecutor reporta que este culminará hacia finales de Feb-2024, y que la puesta en marcha se efectuará en Mar-2024.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Al respecto, el MVCT recuerda que este proyecto fue agendado para inauguración en el I semestre 2024, con asistencia de la señora Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo cual se solicita estar atentos a la realización de este evento.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

| No. | Compromiso                      | Responsable                                             | Fecha Límite de Cumplimiento |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Terminar obras civiles proyecto | Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico «SAPSB» | 28Feb2024                    |
| 2   |                                 |                                                         |                              |
| 3   |                                 |                                                         |                              |

**FIRMAS:**

Listado de Asistencia

Elaboró: Ing. Alex Duque - Seguimiento

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### **LISTADO DE ASISTENCIA**

