

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 45

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 20-03-2024
HORA:	9:30 am-11:45 am
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Lina Marcela Trujillo Ardila, MVCT Olga Ibarra, Camila Barcos Figueroa, Nicolás Ortiz Zúñiga, Apoyo técnico de Aguas de Bolívar Aura Margarita Correo Ayola, Apoyo técnico de Aguas de Bolívar. Francisco Taborda Pestaña, Maria T, Daniela Granados
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación Asistentes
2. Recorrido de Obra por frentes
3. Presentación de Avances de actividades Contratistas
4. Compromisos

DESARROLLO:

1. El día 20 de marzo de 2024, se llevó a cabo el Comité virtual de Gerencia para informar sobre los avances en la ejecución del contrato No. AB-OC-003-2021, correspondiente al proyecto de construcción de la segunda fase del alcantarillado sanitario en la cabecera del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. En esta reunión estuvieron presentes representantes de Aguas de Bolívar, el Ministerio de Vivienda, la Interventoría y el contratista de la obra.
2. **Avances del Proyecto:** El porcentaje de ejecución hasta el 29 de febrero de 2024 es del 8.48%, con un acumulado del 15.84%.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

En términos financieros, la ejecución durante este período fue de \$2.451.058.260,73, acumulando un total de \$4.578.199.683,34. Se superó el monto programado, alcanzando \$2.109.715.457,33.

3. **Actividades Realizadas:** Se presentó la curva de avance de la obra, destacando actividades como demolición de pavimento, excavaciones, instalación de tuberías, construcción de pozos y registros, entre otros.

Se avanzaron actividades ambientales como la planta de tratamiento de aguas residuales, transporte de material y adquisición de tuberías de PVC.

Se mostraron registros fotográficos como evidencia de las actividades realizadas.

4. **Componente Social:** Se abordó el Plan de Acompañamiento Social, con acciones como reuniones con empresas de servicios públicos, reuniones con presidentes de Juntas de Acción Comunal, sensibilización en redes sociales y entrega de folletos.

Se levantaron 824 actas de vecindad y 35 actas de entorno en varios barrios.

Se detallaron los trámites de PQRSD recibidos y cerrados en los meses de enero, febrero y marzo.

Se mostraron registros fotográficos de las actividades sociales realizadas.

En resumen, se destacan los avances en la ejecución del proyecto, el cumplimiento de actividades programadas y el compromiso con el componente social del proyecto.

CONCLUSIONES:

Avance del Proyecto:

Se supero el monto programado Hasta el 29 de febrero de 2024, el proyecto de construcción de la segunda fase del alcantarillado sanitario en San Juan Nepomuceno, Bolívar.

Actividades Realizadas:

Se avanza en la ejecución de actividades como la planta de tratamiento de aguas residuales, fundamental para el componente ambiental y demás actividades complementarias.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Componente Social:

Se ha implementado un Plan de Acompañamiento Social y predial entre los cuales comprende levantar actas de vecindad y actas de entorno y difusión en medios de comunicación.

En resumen, el proyecto ha progresado significativamente tanto en términos de avance físico como financiero, y se han implementado medidas sólidas para abordar el componente social del mismo, asegurando la participación y el bienestar de la comunidad afectada.

A continuación, se detallan los compromisos pactados en la presente reunión:

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualizar la valla del proyecto	Contratista	En las próximas semanas
2	Revisar la fecha para en que se generó el permiso para el uso del espacio para la EBAR.	Contratista e interventoría.	22-03-2024


FIRMAS:

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez

Revisó:

Fecha: 20-03-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

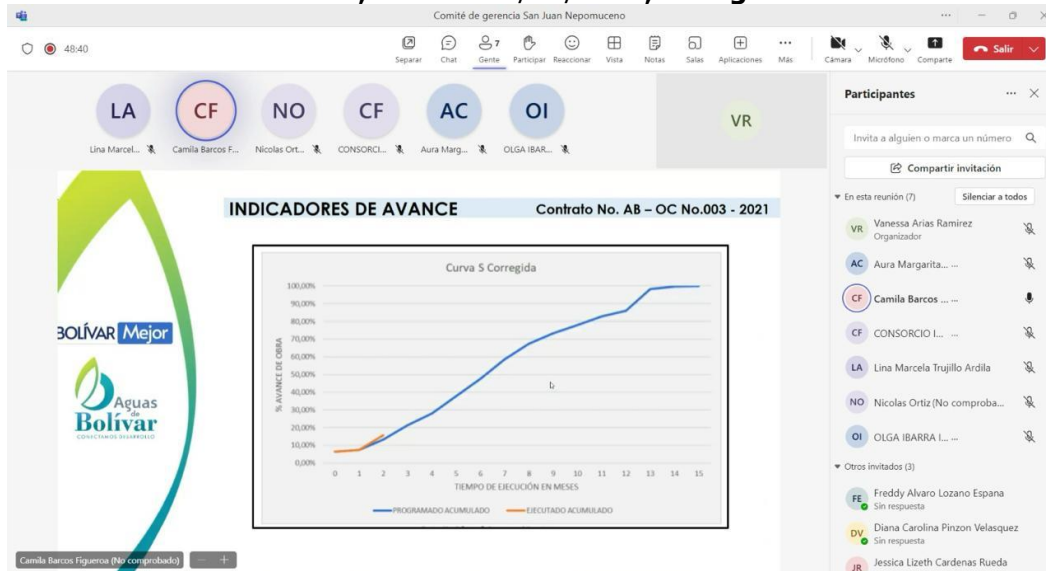

Comité de gerencia San Juan Nepomuceno

47:32

LA NO CF AC OI VR

Lina Marcel... Camila Barcos F... Nicolas Ort... CONSORCI... Aura Marg... OLGA IBAR...

ETAPA EJECUCION DE LA OBRA. Contrato No. AB – OC No.003 - 2021

ITEM	DESCRIPCION	SUBCOTIZADO FEBRERO 2024	% PROGRAMADO FEBRERO 2024	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO
1	REDES DE ACANTILLADO SANTARIO	0.00%	0.00%	11.98%	10.38%
2	ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.11%	0.00%	0.19%	0.59%
3	TUBERIA DE IMPULSION EBAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	COMPONENTE ELECTRICOS EBAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.12%	0.01%	0.12%	0.01%
6	OPCIONES EBAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	ELECTRICOS EBAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	SUBMISTROS REDES DE ACANTILLADO SANTARIO	1.42%	0.29%	2.83%	1.62%
9	SUBMISTROS TUBERIA DE IMPULSION EBAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	SUBMISTROS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11	PROFUNDIZACION HIDRAULICA GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL	0.00%	0.00%	0.76%	0.76%
	TOTAL	0.48%	0.00%	15.84%	13.36%

% EJECUTADO 1 AL 29 FEBRERO 2024 ES DE 8.48%

% EJECUTADO ACUMULADO ES DE 15.84%

% PROGRAMADO ACUMULADO ES DE 13.36%

Camila Barcos Figueira (No comprobado)

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (7)

Silenciar a todos

VR Vanessa Arias Ramirez Organizador

AC Aura Margarita...

CF Camila Barcos ...

CF CONSORCIO L...

LA Lina Marcela Trujillo Ardila

NO Nicolas Ortiz (No comproba...

OI OLGA IBARRA L...

Otros invitados (3)

FE Freddy Alvaro Lozano Espana Sin respuesta

DV Diana Carolina Pinzon Velasquez Sin respuesta

JR Jessica Lizeth Cardenas Rueda Sin respuesta
