

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 03-2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	12/06/2024
HORA:	De 04:00 PM a 4:30 PM
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Daniel Clavijo - - Amazonas Desarrollo Inteligente Camila Goenaga - Ing. Apoyo a la supervisión ADI Carolina Borrero - Líder PDA Amazonas Angela Cuadros - Apoyo Jurídico Zona Sur Oscar Cano; Subdirección de Proyectos
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DÍA:

Reunión Virtual, con el objeto de hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos ejecutados por el PDA de Amazonas:

#### Municipio de Leticia:

- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS MUNICIPIO DE LETICA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION).
- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA KM 11 MUNICIPIO DE LETICIA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION).
- CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA KM6 MUNICIPIO DE LETICIA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION).

#### Municipio de La Victoria:

- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO, CORREGIMIENTO LA VICTORIA (CAPTACION, LINEA DE ADUCCION, PTAP, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION).

### DESARROLLO:

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se hace una breve exposición del objeto de la presente reunión, la cual obedece principalmente a realizar seguimiento de las acciones adelantadas por Amazonas Desarrollo Inteligente – ADI S.A.S. en su calidad de ejecutor del Programa Departamental de Aguas de Amazonas.

### **Proyectos Centros Poblados Leticia – comunidades indígenas:**

En cuanto a los tres proyectos correspondientes a centros poblados del Municipio de Leticia, el PDA informó que el contrato de interventoría fue declarado desierto en una ocasión, lo cual demoró la reactivación del proyecto, pero actualmente se cuentan ya con los contratos de obra e interventoría, los cuales tienen acta de inicio, la cual fue suscrita el 11 de junio de 2024 y su plazo de ejecución es de cuatro (04) meses. Adicionalmente se indicó que se realizaron actividades de socialización a la comunidad y a la Gobernación del Amazonas, para exponer el alcance de los contratos, correspondiente a la terminación y funcionamiento de los sistemas de acueducto de las comunidades indígenas, resultado de lo cual, no se presentaron observaciones o manifestaciones de oposición frente a la terminación de los proyectos.

Por parte del Ministerio se solicitó al PDA informar si hay identificado la necesidad de tramitar algún permiso, servidumbre, autorización de paso, etc., que requieren tramites o tiempos adicionales a los previstos. Al respecto, el PDA informó que no se tiene conocimiento de tener necesidad de tramites adicionales, sin embargo, se verificará con el personal de campo y se dará respuesta vía correo electrónico por parte de ADI S.A.S.

Se solicita por parte del MVCT al PDA de Amazonas, remitir copia de los contratos de obra e interventoría, así como de las actas de inicio cada uno de estos e igualmente efectuar la actualización y el cargue documental en el sistema de información Sigevas, lo cual se ha solicitado en oportunidades anteriores sin tener respuesta efectiva del PDA.

Por otra parte, el MVCT solicitó al PDA informar sobre el avance en la revisión de las observaciones realizadas al informe ejecutivo elaborado por el área técnica de ADI S.A.S., donde se solicitó ampliar la información registrada con respecto a el balance financiero de los contratos iniciales, posibles incumplimientos, actas de recibo y en general documentar todas las gestiones contractuales adelantadas por el PDA, dado que este informe y la documentación soporte será la información que se remita a los entes de control en cumplimiento del plan de mejora pactado.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### **Proyectos Corregimiento La Victoria:**

Construcción del sistema de acueducto centro poblado, Corregimiento La Victoria (captación, línea de aducción, PTAP, almacenamiento y red de distribución).

Estado en Sigevas: Suspendido. Avance físico reportado: 78%  
El PDA informó que el proyecto continúa suspendido y se reactivará para lo cual se tienen pólizas actualizadas del contrato de interventoría. Por su parte, se han realizado dos requerimientos al contratista de obra para actualizar las pólizas de dicho contrato, dado que presentaban errores en los amparos que deben ser corregidos previo a su aprobación.

Se solicita por parte del MVCT al PDA de Amazonas, remitir copia de los contratos de obra e interventoría y demás documentos contractuales suscritos a la fecha.

El contrato de obra tiene un plazo de ejecución restante de dos (02) días, por lo que se está a la espera de las aprobaciones de pólizas correspondientes para tomar las acciones administrativas frente a una eventual prórroga de los contratos para su terminación o en su defecto iniciar su liquidación.

Construcción del sistema de alcantarillado Centro Poblado Corregimiento La Victoria (sistemas individuales).

Estado en Sigevas: Terminado.  
El PDA se comprometió a entregar copia de los documentos contractuales suscritos para la ejecución de este proyecto el 13 de junio de 2024.

Sin más inquietudes respecto de lo reportado se da por terminada la reunión.

### **COMPROMISOS** (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir copia de los contratos de obra e interventoría, actas de inicio y demás documentos contractuales de los tres proyectos de centros poblados del Mpio de Leticia.	ADI	13-jun-2024
2	Remitir copia de los contratos de obra e interventoría, actas de inicio	ADI	13-jun-2024

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

	y demás documentos contractuales de los dos proyectos del corregimiento de la Victoria.		
3	Informar vía email al MVCT sobre la necesidad o no de tramitar permisos, servidumbres o autorizaciones de paso.	ADI	03-jul-2024
4	Informe ejecutivo y soportes.	ADI	03-jul-2023

**FIRMAS:**

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NmNIYzQzMzktNTBIO500NWFkLWFiOWYtYWViNmM3ZjNiMDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNIYzQzMzktNTBIO500NWFkLWFiOWYtYWViNmM3ZjNiMDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d)

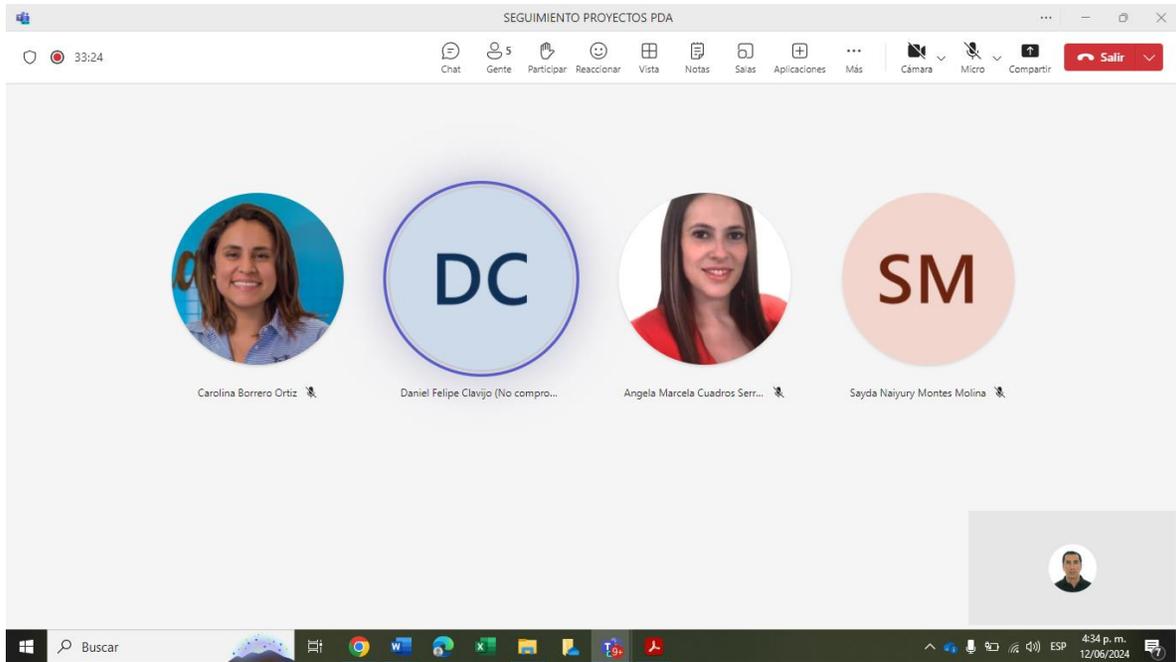

Elaboró: Oscar Cano   
Revisó: Sayda Montes  
Fecha: 12-jun-2024
