

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 4 - Junio 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 7 de junio de 2024.
HORA:	7:00 a.m. a 9:00 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
2. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
3. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

DESARROLLO:

1. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

La ESANT – Ing. luz Yaneth Niño informa que la Interventoría se encuentra en revisión de documentos de documentos enviados por el contratista y entrega a la ESANT a finales de junio de 2024.

2. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

La ESANT – Ing. luz Yaneth Niño informa que realizaron reunión de socialización con la comunidad para iniciar trabajos en la Cra 6, ruta crítica del proyecto equivalente al (17%).

La comunidad indica que se debe trabajar máximo hasta el 17 de junio de 2024 porque las ferias comienzan del 2 al 12 de agosto de 2024.

La comunidad solicita se terminen primero las obras de la cll 10 entre Cra 5-6, cll 11 entre Cra 4-5 y la cll 11 entre Cra 7 -8 que va en piedra Barichara.

La Cra sexta tiene una programación de 2 meses para excavación, instalación tubería sanitaria y pluvial y 2 meses para instalación de domiciliarias de acueducto

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

A la fecha se recibe informe de Interventoría del 1 de junio de 2024 donde se reporta un avance físico del 79,81 contra un programado acumulado a mayo de 93,85 distribuidos avance del componente acueducto 72,06%, incluye red de acueducto del 72,32%. y domiciliarias 70,24%. Para el avance del componente sanitario el avance del 89,99% que corresponde a red sanitaria 90,08%, pozos 88.18% domiciliarias 89,19%. y el avance del componente pluvial es del 77,36%. que corresponde a red pluvial 77,25%, pozos 82,28% y sumideros 78,43%. Se tiene un avance financiero del 71,51% que equivale a 22.287.819.393,74 y Interventoría de 1,546.229.794

3. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

La ESANT – Ing. luz Yaneth Niño informa que la visita programada no se realizo

El Ministerio informa a la ESANT que envía correo a la ESANT el día 7 de junio de 2024, solicitando las acciones tomadas por la ESANT para que el Municipio de Vélez, tramite las 10 servidumbres faltantes del proyecto.

Se solicita se informe sobre la veeduría del proyecto.

Teniendo en cuenta que se tiene acta de reinicio del proyecto el 9 de junio de 2024, y teniendo que faltan las servidumbres y el trámite de la reformulación nro. 3, se solicita el trámite por la ESANT respectivo.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega documentos para recibo de obras a ESANT - proyecto Socorro	Interventoría	30-06-2024
2	Entrega obras de la cll10 entre Cra.5-6 y cll 11 entre Cra.4 -5 proyecto PMAA	Contratista	30-06-2024
3	Tramite de prorroga a suspensión	ESANT	9-06-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	proyecto Vélez Guayabos		
--	----------------------------	--	--

FIRMAS:

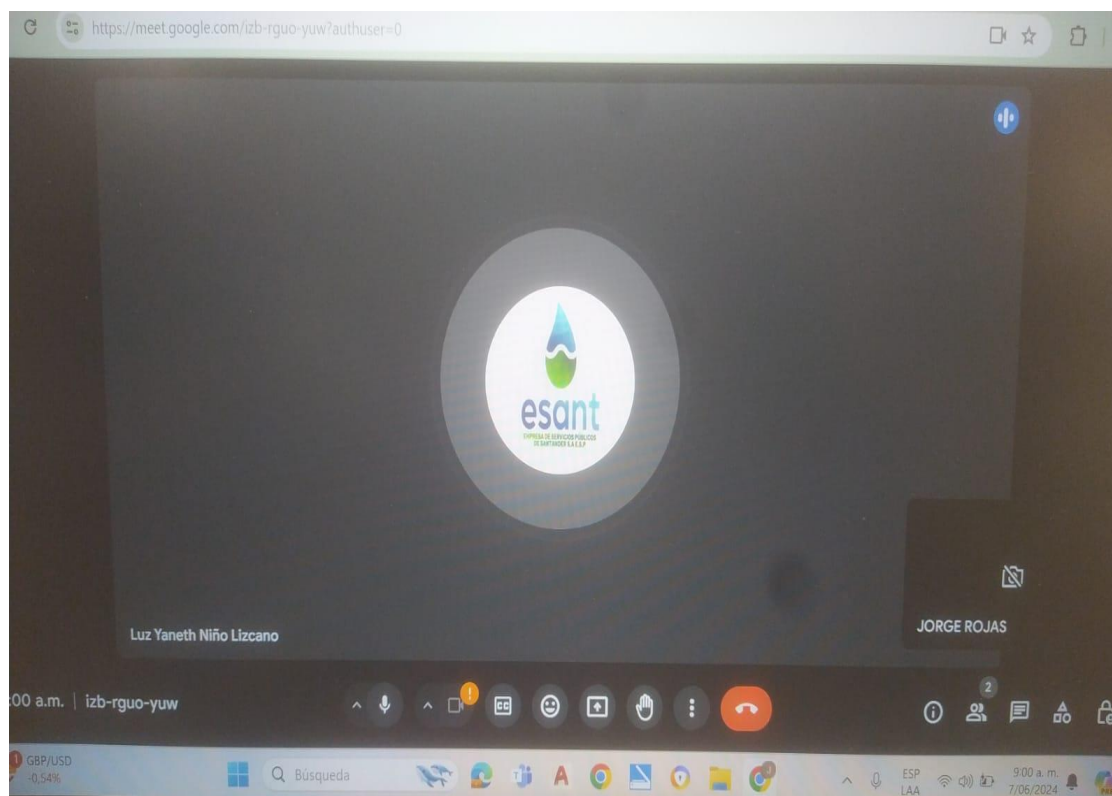

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: junio 7 de 2024
