

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 5 de julio de 2024
HORA:	De 09:52 a 10:48 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	De parte del Municipio de Saravena - Erica Castro, profesional de la Secretaría de Planeación - Adriana Angarita (<i>no mencionó dependencia que representa</i>) De parte de ECAAS S.A. E.S.P. - Alejandro Jiménez, profesional técnico y planeación De parte de CUMARE S.A. E.S.P. (PDA) - Shirley García, Profesional de apoyo De parte del MVCT - Genaro Suárez, Contratista Despacho Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial - José Manuel Vásquez, Coordinador del Grupo de Evaluación de Proyectos - Diego Alejandro Sorza, Contratista Evaluador Componente Geotecnia - Jairo Arley Urbina, Contratista Evaluador Componente Estructuras - Jesús Antonio Castro, Contratista Evaluador Componente Topografía - Néstor Fabián Romero, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	- Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de la empresa ECAAS S.A. E.S.P., de la empresa CUMARE S.A. E.S.P. (PDA), del municipio de Saravena, y profesionales del MVCT.

2. Objetivo de la reunión.

Mesa de trabajo para realizar seguimiento a los pendientes correspondientes al proyecto **"RECONSTRUCCION DE LOS MUROS LATERALES, TRANVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** (antes denominado "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA") radicado bajo la modalidad de inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o mitigación de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

3. Desarrollo de la reunión.

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

- Antecedentes: el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, actualmente se encuentra en revisión documental, razón por la cual no ha ingresado al mecanismo de viabilización hasta que se complementen los pendientes solicitados por el profesional a cargo (Marlon David Olarte). No obstante, por solicitud del formulador, se pidió apoyo al MVCT que de manera paralela se realizará la revisión detallada del mismo, lo cual fue realizado y socializado a través de mesa de trabajo del 12 de marzo de 2024. Las observaciones fueron compartidas a través de correo electrónico del 13 de marzo de 2024. En consecuencia, representantes del formulador solicitaron al MVCT el acompañamiento para atender inquietudes sobre las observaciones formuladas las cuales se realizarán por componentes y/o requisitos.

El 18 de marzo de 2024 se realizó la primera sesión, con el acompañamiento de la especialista del MVCT de topografía y el par de la consultoría, por medio de la cual se atendieron inquietudes.

El 19 de marzo de 2024, se realizó la segunda sesión, con el acompañamiento de especialista del MVCT en gestión del riesgo y geotecnia y los profesional en representación del formulador (ECAAS, Municipio de Saravena, CUMARE, y consultoría), por medio de la cual se atendieron inquietudes sobre los requisitos y observaciones realizadas al Acta CMGRD y al estudio de geotécnica.

El 22 de abril de 2024, se realizó mesa de trabajo, por medio de la cual se realizó seguimiento a las observaciones y ajustes, y los profesionales del MVCT atendieron inquietudes sobre las mismas. El formulador se comprometido a entregar ajustes el 4 de mayo de 2024.

El 6 de mayo de 2024, se realizó el seguimiento a los compromisos sobre subsanaciones del proyecto, se tenía previsto la entrega de estos para el 4 de mayo de 2024, sin embargo el representantes del formulador plantean nueva fecha para el 17 de junio de 2024.

A través de correo electrónico del 10 de mayo de 2024, representantes del formulador compartieron con los evaluadores del MVCT ajustes parciales: estudio de topografía, estudios de hidrología e hidráulica, componente predial y actas del CMGRD.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El 17 de mayo de 2024, a través de la mesa de trabajo, se realizó la socialización de avances en los ajustes sobre el componente de geotécnica y gestión de riesgo por parte del formulador del proyecto. Se realizó el seguimiento a los compromisos sobre subsanaciones del proyecto, en la sesión se presentó avances parciales sobre el estudio de suelos. Se comentó por parte del MVCT que las actas CMGRD aportadas con el proyecto se encuentran en cumplimiento.

El 23 de mayo de 2024, a través de correo electrónico, se informó a representantes del formulador, que fueron revisados los estudio de topografía, y los mismos se encontraron de conformidad respecto de lo solicitado por la Resolución 0661 de 2019, y que con la radicación de los ajustes, los documentos y planos deben presentarse firmados por parte de la consultoría e interventoría.

El 28 de mayo de 2024, a través de mesa de trabajo, se socializó por parte del formulador ajustes sobre el componente predial y por parte de los profesionales del MVCT se realizaron observaciones sobre el plano predial. Posteriormente, el 30 de mayo de 2024 a través de correo electrónico se remitieron ajustes sobre el componente predial, y por ese mismo medio, el 5 de junio de 2024 se enviaron observaciones y pendientes para los respectivos ajustes.

Por medio de correo electrónico del 5 de junio de 2024, se remiten observaciones pendientes del proyecto a esa fecha sobre los requisitos de presentación y solicitadas por la Resolución 0661 de 2019.

A través del correo del 6 de junio de 2024, se remiten al formulador las observaciones y pendientes a esa fecha sobre el componente predial

El día 7 de junio de 2024, se realizó mesa de trabajo por medio de la cual el formulador realizó socialización de avances del componente técnico de gestión del riesgo, y los evaluadores del MVCT realizaron observaciones sobre lo presentado, principalmente, lo referente a la precisión de las informaciones sobre las recomendaciones y definiciones respecto de las amenazas y soluciones a estas incluidas con el alcance del proyecto.

El 11 de junio de 2024, se realizó mesa de trabajo, por medio de la cual

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se realizó el seguimiento a los compromisos sobre subsanaciones del proyecto, en la sesión se presentó avances parciales el documento técnico de Gestión del Riesgo y diseño estructural, los cuales cuenta con observaciones por subsanar.

EL 12 de junio de 2024, a través de mensaje de texto, profesional de ECAAS remite compromiso actualizado por el cual se proyecta presentar los ajustes definitivos para el 24 de junio de 2024.

El 14 de junio de 2024, a través de correo electrónico, el formulador remite ajustes parciales correspondientes a los componentes predial, informe técnico de gestión del riesgo, estudio de suelos y permiso ambiental

El 19 de junio de 2024, se realiza mesa de trabajo de seguimiento a los pendientes a esa fecha. Se realizó el seguimiento a los compromisos sobre subsanaciones del proyecto, en la sesión se presentó avances parciales el documento técnico de Gestión del Riesgo, estudio de suelos y plano predial, con observaciones por subsanar.

- En la presente sesión se realizará seguimiento a los pendientes del proyecto, que se resumen a continuación:
 - Carta de presentación y formato resumen del proyecto – pendiente ajustar de acuerdo a subsanaciones finales en los demás componente y documentos del proyecto.
Sobre la carta de presentación, en caso que esta no sea firmado por el Alcalde sino por la ESP o PDA, deberá entregarse una certificación donde el municipio manifieste estar de acuerdo con el proyecto presentado ante el mecanismo de viabilización, o en su defecto, que también firme la carta referida.
 - Ambiental: Se reciben ajustes a través de correo electrónico el día 3 de julio de 2024. Se subsanan los requisitos correspondientes al permiso de ocupación de cauce y concesión de aguas.
 - Acta de CMGRD – cumple
 - Diagnóstico e informes de la situación de emergencia – se presenta observaciones de forma relacionadas con las firmas y coherencia con el nombre del proyecto

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- Descripción de la alternativa propuesta firmado por profesional en ingeniería – cumple
 - Informe de gestión del riesgo – se recibió ajustes de este documento el 3 de julio de 2024, el cual se encuentra de conformidad quedado únicamente pendiente las firmas y número de matrículas de los profesionales responsables de la elaboración e interventoría. De parte de ECAAS, el Ing. Alejandro procede a explicar atención a las observaciones que subsanan. El Ing. Sorza (MVCT), considera que aunque se cumple con el requisito, es importante destacar que lo ideal con relación a la profundidad de cimentación de los muros estuviesen por debajo de lo indicado en el estudio de socavación, sin embargo, reconoce que esto se atiende con la plataforma de socavación, geomalla y material de relleno al borde de estas estructuras y que es la interventoría es quien procede a avalar la solución y su idoneidad.
 - Sobre los planos hidráulicos, está pendiente que se presenten los planos exportados en PDF que permita ver el detalle del dibujo, con las respectivas firmas.
 - Se encuentran pendientes la presentación de los informes de estudio de suelos y diseño estructural.
 - Se encuentra pendiente el informe de aval de la interventoría
 - Los ajustes al presupuesto se encuentran pendientes, y se aclara que esto se realizará una vez se cuenten con los ajustes técnicos del proyecto con el fin de evitar reprocesos.
 - Las certificaciones aportadas el 3 de julio con relación a que el proyecto está de acuerdo al PBOT y sobre el riesgo, faltó manifestar que no existe impedimento para la construcción de las obras proyectadas, y que el riesgo identificado es uno mitigable.
 - Sobre el componente predial, con lo ajustes presentados el 3 de julio de 2024, se encuentra de conformidad.
- Sobre el ingreso al mecanismo de viabilización del VASB, el Ing. Rodríguez (MVCT), menciona que en conversación con el evaluador preliminar a cargo del referido proyecto, se espera que se dé la formalidad en la semana del 8 al 12 de julio de 2024.
 - Con relación al compromiso pactado, por el cual se esperaban ajustes de los estudios de suelos y estructuras para finales del mes de junio, sin embargo, estos no han sido reportados. El Ing. Alejandro Martínez

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

(ECAAS), menciona que se vienen adelantando los respectivos ajustes y se han presentado retrasos e imprevistos que han postergado las fechas, por lo que la fecha de entrega se espera para el 15 de julio de 2024. Subsana los componentes técnicos procederán a ajustar el presupuesto.

El Ing. Rodríguez (MVCT) solicita a los representantes de ECAAS que estén informando al municipio de Saravena con estas novedades, retrasos y compromisos.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

El proyecto cuenta con observaciones y pendientes de tipo documental, legal, técnico, y financiero; los componente predial y ambiental se encuentran en cumplimiento. Se esperaban entrega de ajustes definitivos para finales de junio de 2024, sin embargo, el formulador expresa retrasos por imprevistos en las subsanaciones de los componentes de suelos y estructuras: se espera entrega de los pendientes técnicos para el 15 de julio e 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega y radicación de los ajustes estudio de suelos y diseños estructurales <i>Nota: En el intermedio, se podrán realizar mesas de trabajo de seguimiento y/o aclaración de inquietudes frente a las observaciones.</i>	ECAAS Municipio de Saravena Cumare	15/07/2024 <i>Nota: se esperaba antes, sin embargo, debido a retrasos, se han corrido las fechas de entrega.</i>
2	Ingreso al mecanismo de viabilización	MVCT	12/07/2024
3	Email Actualización lista de chequeo con observaciones pendientes	MVCT	05/07/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS (reunión virtual):

SEGUIMIENTOS OBS Y PENDIE...

Chat Archivos Resumen **Asistencia** Salas para sesión de ... +2

Unirse

10

...

5 July 2024 09:52 - 10:48

Descargar

13
Asistieron

09:52 - 10:48
Hora de inicio y finalización



55m 50s
Duración de la reunión

37m 53s
Tiempo medio de asistencia



Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Sergio Andres Rodriguez Olaya SRodriguez@minvivienda.gov.co	09:58	10:48	50m 21s	Organizador
 Jairo Arley Urbina Gomez JUrbina@minvivienda.gov.co	09:58	10:47	48m 53s	Moderador
 SHIRLEY -CUM... (No comprobado)	09:58	10:47	48m 34s	Moderador
 Diego Alejandro Sorza Rios DSorza@minvivienda.gov.co	10:01	10:47	45m 58s	Moderador
 Jose Manuel Vasquez Leal JVasquez@minvivienda.gov.co	10:02	10:47	45m 23s	Moderador
 Wisner Genaro Suarez Guzman WGSuarez@minvivienda.gov.co	10:03	10:47	43m 56s	Moderador
 Alejandro Jim... (No comprobado)	10:04	10:47	42m 36s	Moderador
 Alejandro Jime... (No comprobado)	10:05	10:48	42m 22s	Moderador
 ERICA CASTRO... (No comprobado)	10:12	10:48	36m 2s	Moderador
 Adriana Angarita... (No comprobado)	10:13	10:48	35m 9s	Moderador
 Nestor Fabian Romero Braga NRomero@minvivienda.gov.co	10:16	10:47	31m 5s	Moderador
 Jesus Antonio Castro Guerra JACastro@minvivienda.gov.co	10:25	10:38	9m 19s	Moderador


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

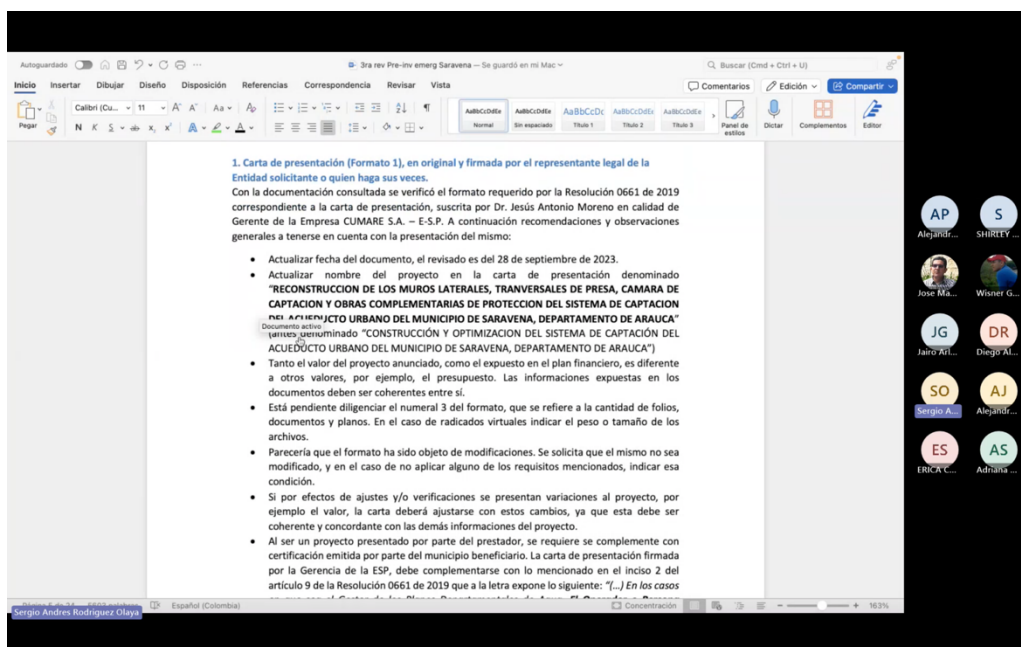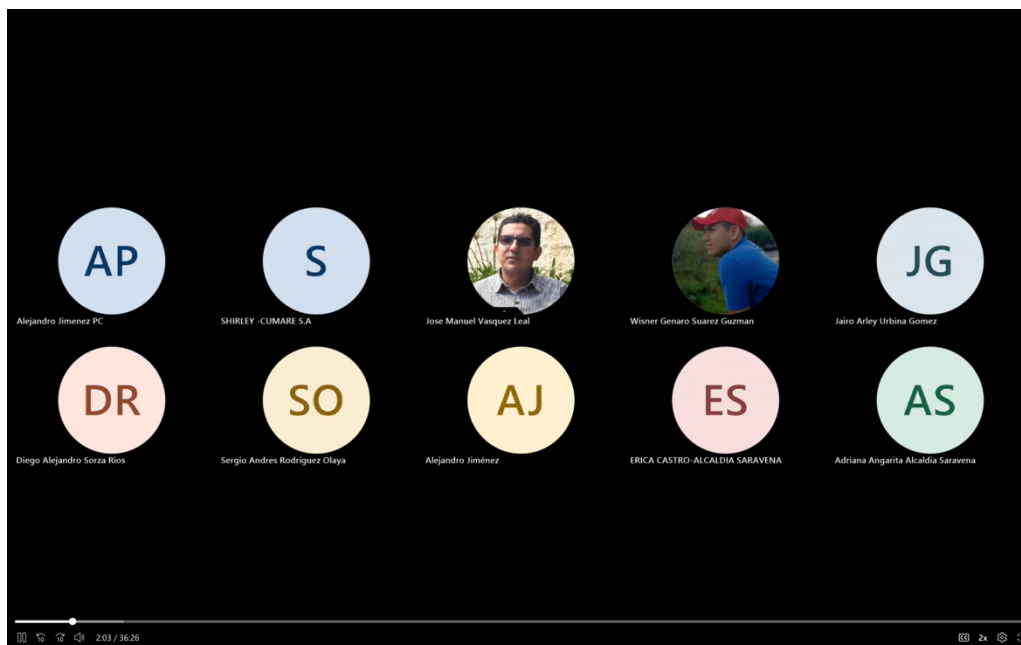

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

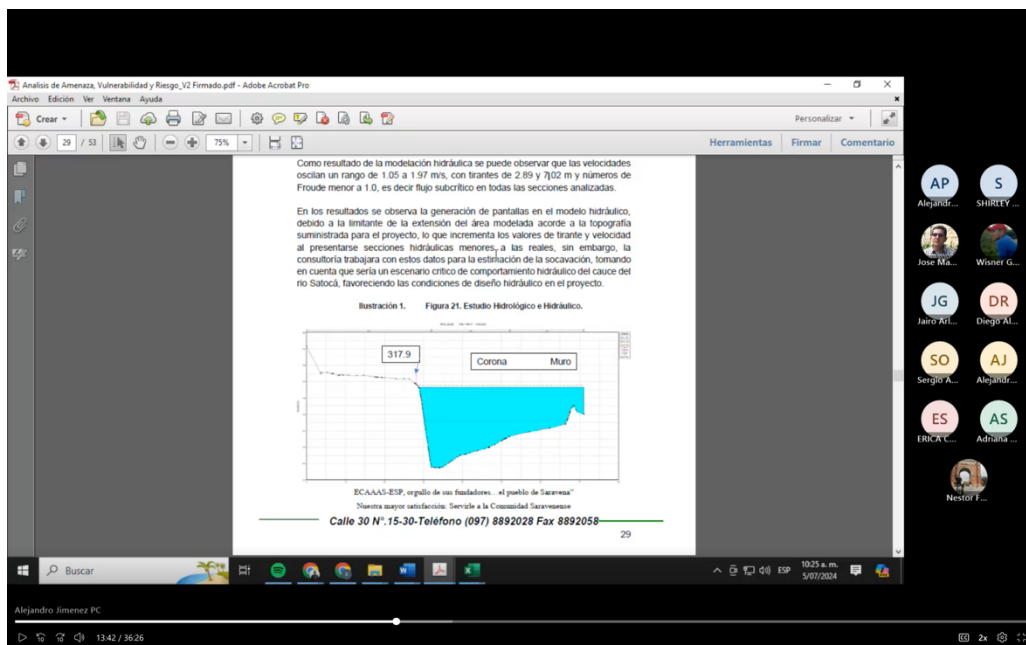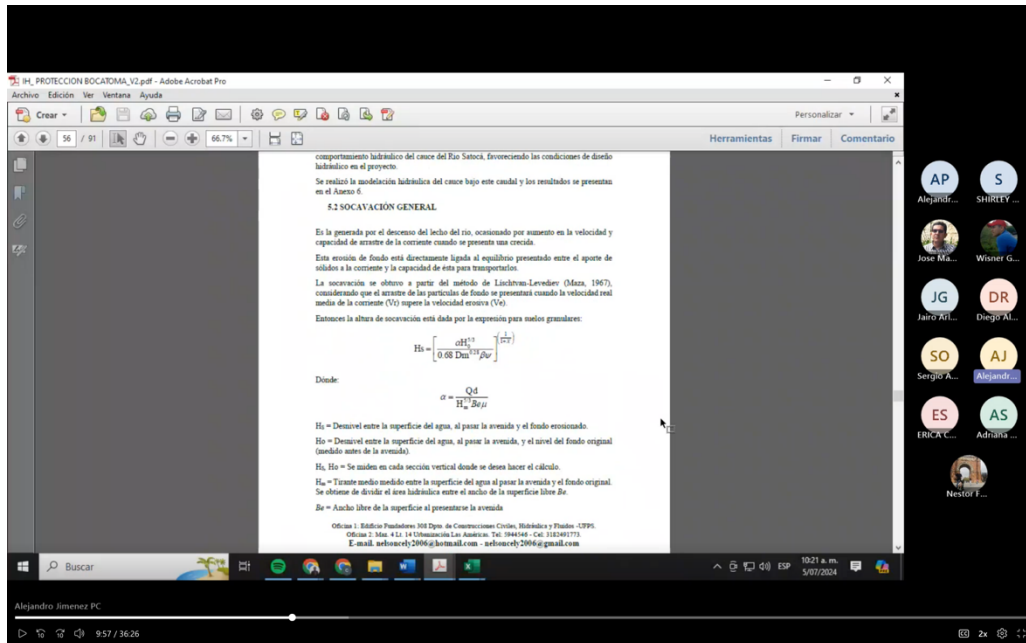

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

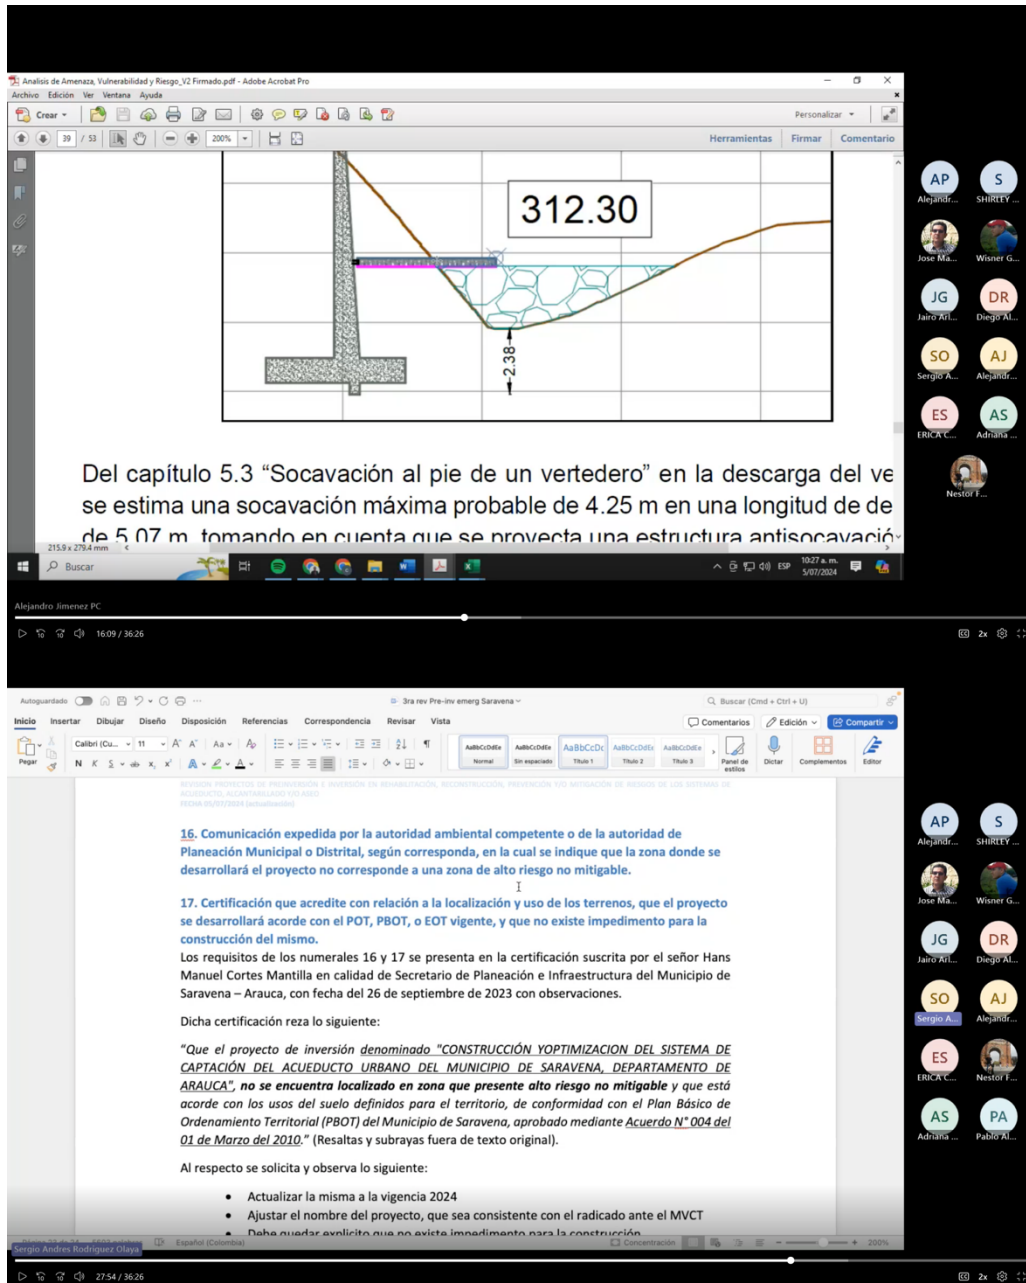

Del capítulo 5.3 "Socavación al pie de un vertedero" en la descarga del ve se estima una socavación máxima probable de 4.25 m en una longitud de de 5.07 m tomando en cuenta que se proyecta una estructura antisocavación.

16. Comunicación expedida por la autoridad ambiental competente o de la autoridad de Planeación Municipal o Distrital, según corresponda, en la cual se indique que la zona donde se desarrollará el proyecto no corresponde a una zona de alto riesgo no mitigable.

17. Certificación que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollará acorde con el POT, PBOT, o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construcción del mismo.

Los requisitos de los numerales 16 y 17 se presenta en la certificación suscrita por el señor Hans Manuel Cortes Mantilla en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Saravena – Arauca, con fecha del 26 de septiembre de 2023 con observaciones.

Dicha certificación reza lo siguiente:

*"Que el proyecto de inversión denominado **"CONSTRUCCIÓN YOPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, no se encuentra localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con los usos del suelo definidos para el territorio, de conformidad con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio de Saravena, aprobado mediante **Acuerdo N° 004 del 01 de Marzo del 2010**." (Resaltos y subrayas fuera de texto original).*

Al respecto se solicita y observa lo siguiente:

- Actualizar la misma a la vigencia 2024
- Ajustar el nombre del proyecto, que sea consistente con el radicado ante el MVCT
- Debe quedar explícito que no existe impedimento para la construcción.

Anexos: (No aplica)
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 05/07/2024
