

ACTA No. 18

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de julio de 2024
HORA:	De 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Astrid Lorena Montoya, Secretaria de Planeación Mpio. Venecia
	Faber Restrepo, Supervisor GSP-Gobernación de Antioquia
	Danilo Patiño, Apoyo a la Supervisor de GSP-Gobernación de Antioquia
Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, SP-VASB-MVCT.	

ORDEN DEL DIA:

Convenio CUR 1142-2020, Proyecto Construcción Del Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Urbano Del Municipio De Venecia

Objeto: Reunión de seguimiento y control al Convenio CUR 1142 de 2020.

1. Avance en la contratación de obra e interventoría.
2. Determinación de la zona de riesgo por deslizamiento y efecto en el acueducto de Galapa.
3. Avance en la prórroga del convenio.

DESARROLLO

La reunión virtual de seguimiento y control se llevó a cabo con la participación de la administración municipal de Venecia, la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia-PDA de Antioquia y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT.

1. Avance en la contratación de obra e interventoría.

El MVCT solicitó al PDA de Antioquia se informara los avances en los procesos de contratación de las obras faltantes para cumplir con el alcance del proyecto viabilizado en la reformulación no. 2.

El PDA de Antioquia informó lo siguiente:

- Se presentó al gerente del PDA de Antioquia la necesidad urgente de contratación de las obras pendientes para cumplir con el alcance de las obras viabilizadas por el ministerio y concluir el proyecto garantizando su funcionalidad, quien le dio prioridad.

- Se está gestionando el CDR ante al Comité Directivo del PDA de Antioquia, con el fin de liberar los recursos en reserva presupuestal que se encuentran en el FIA, para iniciar el nuevo proceso de contratación de las obras.

2. Determinación de la zona de riesgo por deslizamiento y efecto en el acueducto de Galapa.

El MVCT solicitó a la administración municipal de Venecia informar sobre la evaluación del riesgo que se tiene con respecto al deslizamiento que se presentó en la zona de intervención del sistema de suministro de agua potable de la quebrada Galápagos específicamente en la captación, aducción, desarenador, aducción al desarenador de la quebrada la Tigra, conducción a la zona urbana.

Al respecto la administración municipal señaló que con la participación de otras entidades y el PDA de Antioquia, hasta el momento se pudo concluir que del sistema de suministro de agua "Galápagos" proyectado no sufrió afectación en los componentes bocatoma, aducción y desarenador. En cuanto a la conducción entre el desarenador Galápagos y el desarenador del sistema de la quebrada La Tigra es necesario desplazar el alineamiento de la tubería hacia la margen derecha y hasta la nueva ubicación del desarenador de la quebrada La Tigra, dado que esta estructura fue afectada por los deslizamiento y creciente que tuvo la quebrada la Tigra. Asimismo, se debe modificar el alineamiento de la conducción entre la nueva ubicación del desarenador de la Tigra hasta la intersección con la vía Medellín-Bogota.

La administración municipal iniciará la contratación de las modificaciones del alineamiento de la línea de conducción y la reubicación del desarenador del sistema de la quebrada la Tigra, de conformidad con la afectación que se presentó debido al movimiento en masa y la creciente de esta quebrada. El avance de la actividad anterior se estará informando oportunamente.

3. Avance en la prórroga del convenio

El MVCT solicitó al municipio de Venecia y al PDA de Antioquia se informara sobre los avances en la elaboración de la solicitud de prórroga del convenio programada para radicarla en el MVCT el próximo 15 de julio de 2024.

El PDA de Antioquia informó que mediante correo electrónico del 9 de julio de 2024, requirió a la administración municipal, él envió de la solicitud de prorroga y la documentación soporte de esta, para que el ente territorial aporte lo pertinente.

El municipio de Venecia confirmó el recibo de la solicitud mencionada y programó una reunión con el PDA de Antioquia, para consolidar la información y remitir al Ministerio de común acuerdo la solicitud de prórroga del convenio.

4. Revisión del plan de acción del 26 de junio de 2024.

HITO / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA
Diagnóstico de afectación por deslizamiento del 25/06/2024	Alcaldía Venecia GSP-Gobernación Antioquia	4 de julio de 2024 Cumplido
Aprobación del Comité Directivo del PDA de Antioquia del proceso licitatorio	GSP-Gobernación Antioquia	2 de julio de 2024 Pendiente
Publicación de prepliegos	GSP-Gobernación Antioquia	15 de julio de 2024
Observaciones a los prepliegos	GSP-Gobernación Antioquia	20 de julio de 2024
Audiencia de riesgos	GSP-Gobernación Antioquia	25 de julio de 2024
Publicación de pliegos definitivos	GSP-Gobernación Antioquia	15 de agosto 2024
Entrega de ofertas	GSP-Gobernación Antioquia	30 de agosto 2024
Evaluación de ofertas	GSP-Gobernación Antioquia	6 de agosto 2024
Tiempo de traslado	GSP-Gobernación Antioquia	16 de agosto 2024
Observaciones a la evaluación	GSP-Gobernación Antioquia	21 de agosto 2024
Audiencia de adjudicación	GSP-Gobernación Antioquia	23 de agosto 2024
Legalización de Contratos obra e interventoría	GSP-Gobernación Antioquia	15 septiembre 24
Inicio ejecución de las obras	GSP-Gobernación Antioquia	1 de Octubre 2024
Terminación de las obras	GSP-Gobernación Antioquia	31 de marzo 2025
Pruebas y puesta en marcha obras	GSP-Gobernación Antioquia	30 de abril 2025
Entrega obra al Municipio	GSP-Gobernación Antioquia Municipio de Venecia	30 de mayo 2025
Liquidación Contratación derivada	GSP-Gobernación Antioquia	15 de julio de 2025


COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Gestion aprobación CDR liberación de recursos	GSP Gobernación PDA de Antioquia	15-07-2024
2	Modificación de alineamiento conducción	Municipio de Antioquia	15-09-2024
3	Radicación solicitud de	GSP Gobernación PDA de	15-07-2024


FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
	prórroga No. 3 Convenio	Antioquia Municipio Venecia	
4	Reunió seguimiento 4 pm	MVCT	18-07-2024


Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
 Revisó:
 Fecha: 12-07-2024

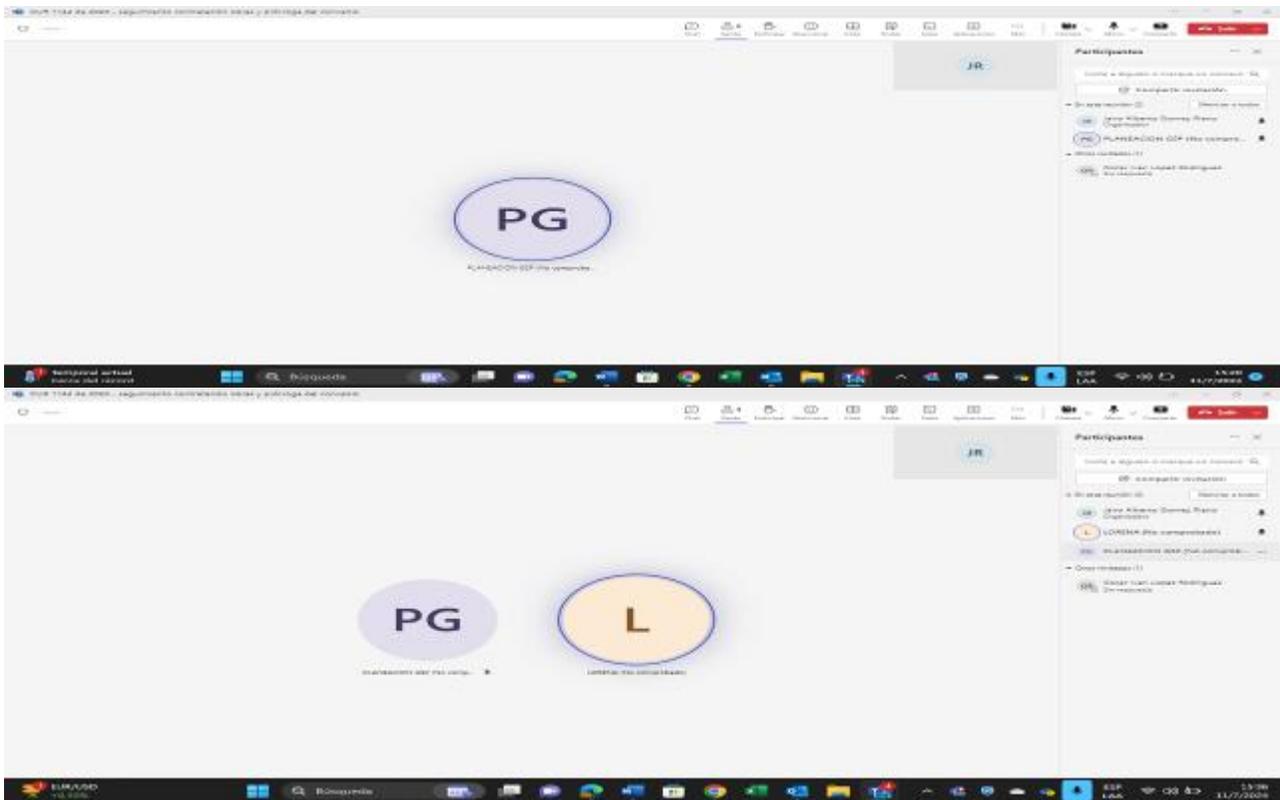


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

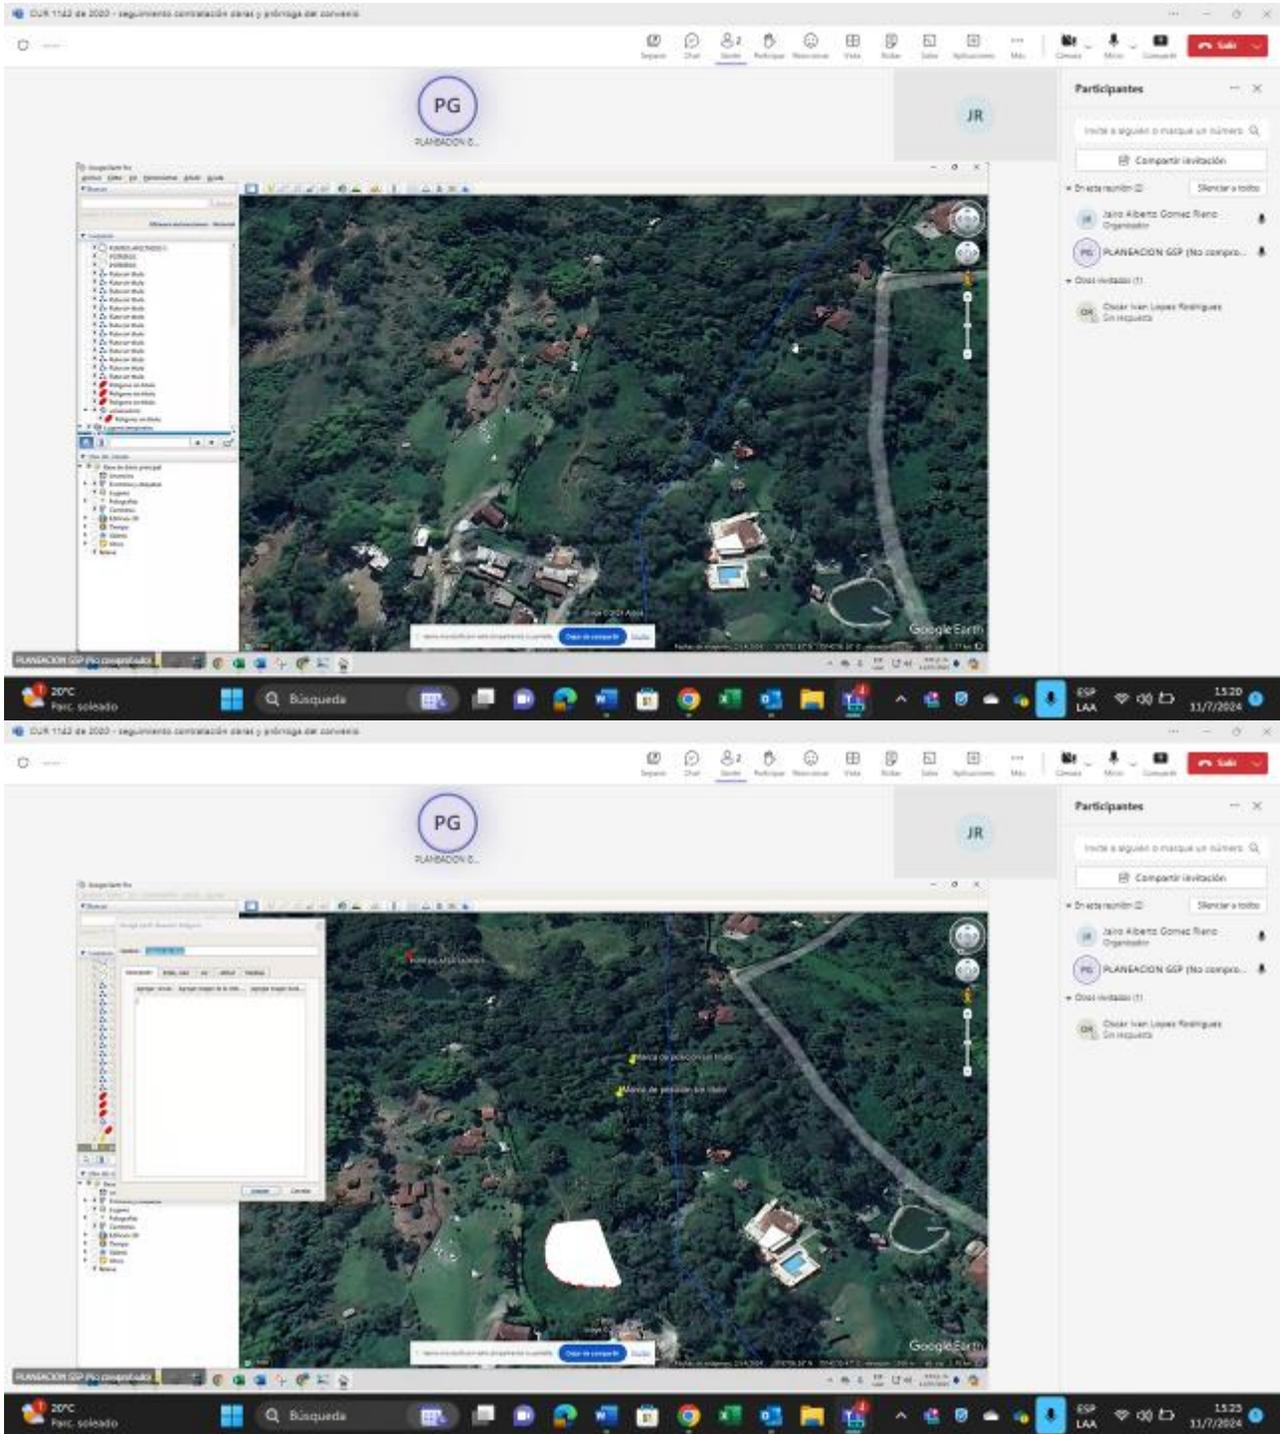


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

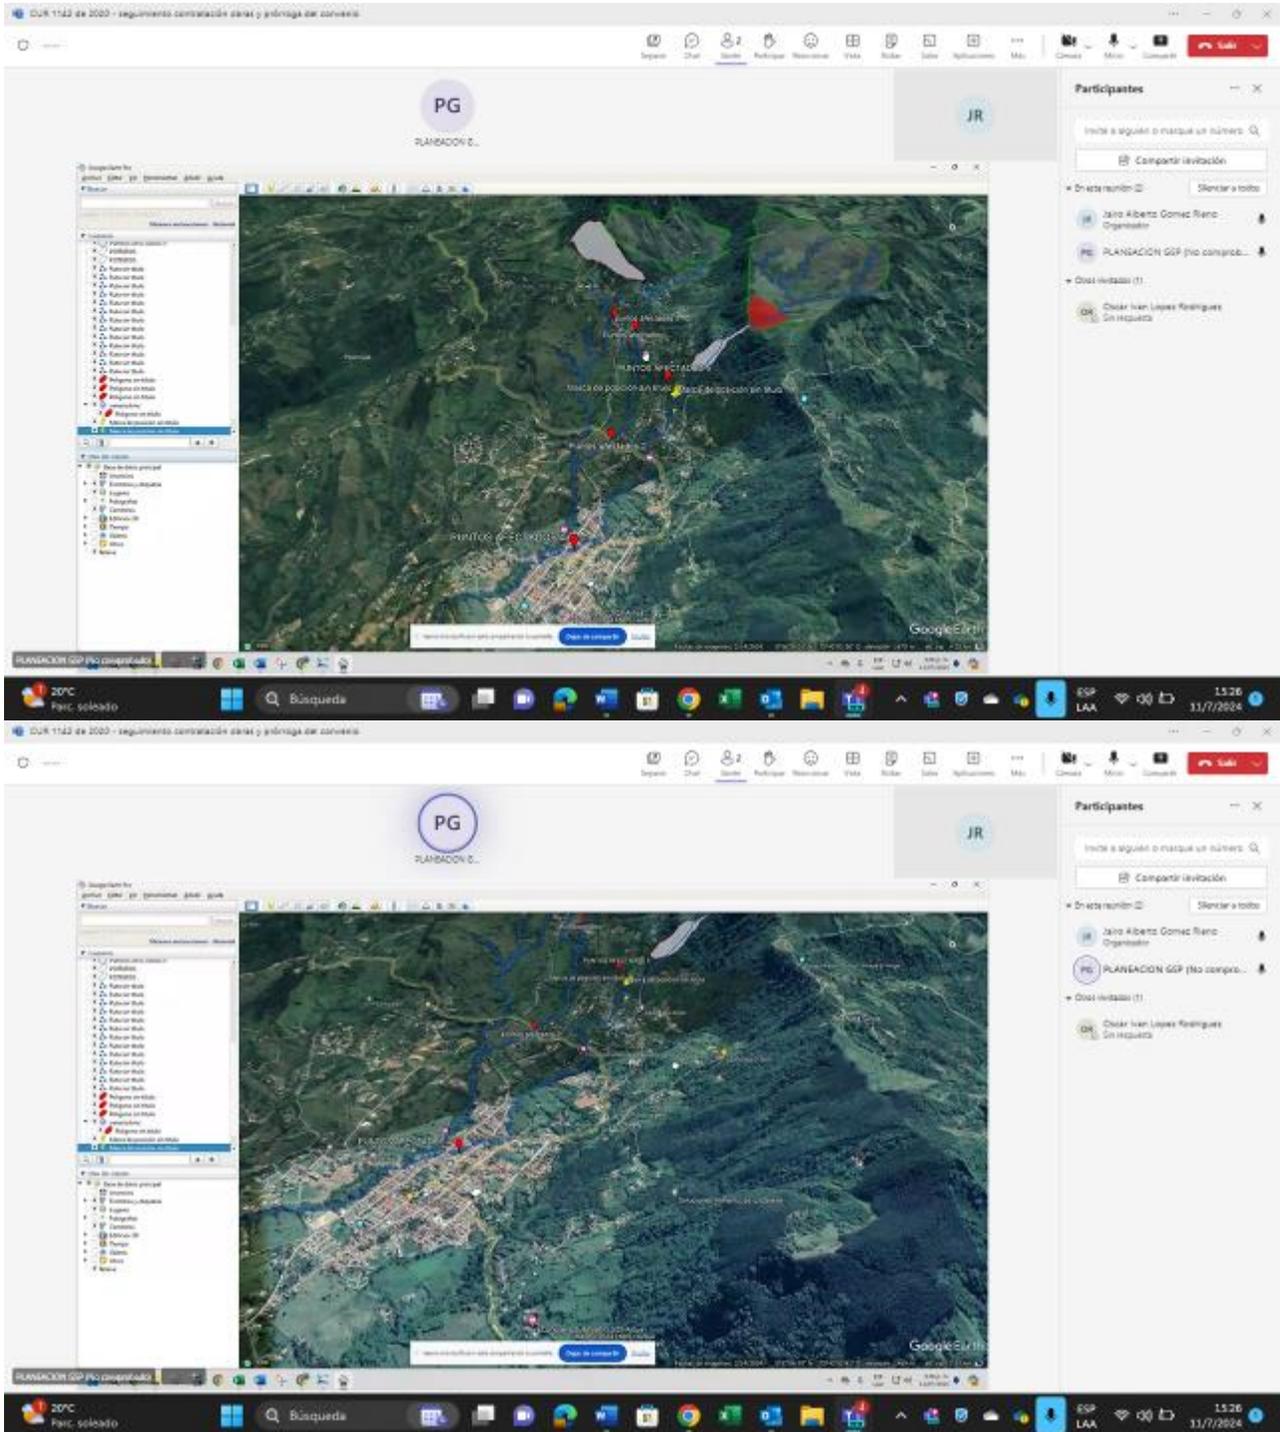

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

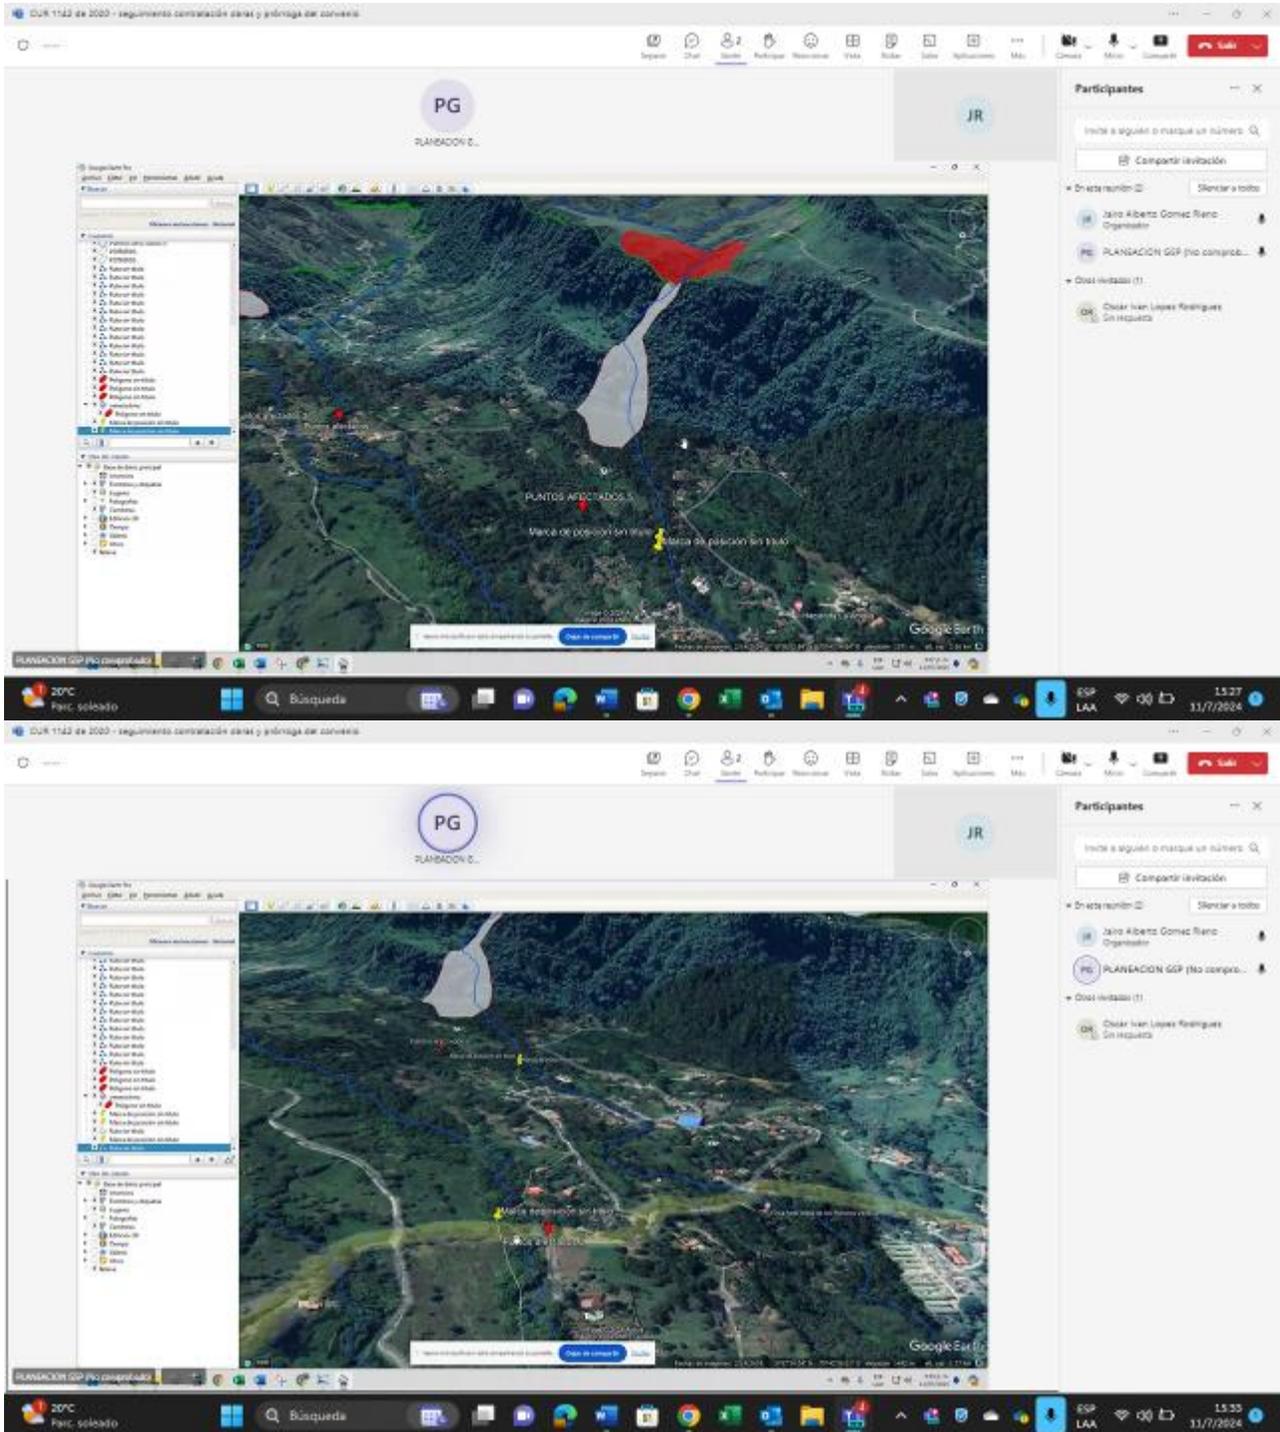

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

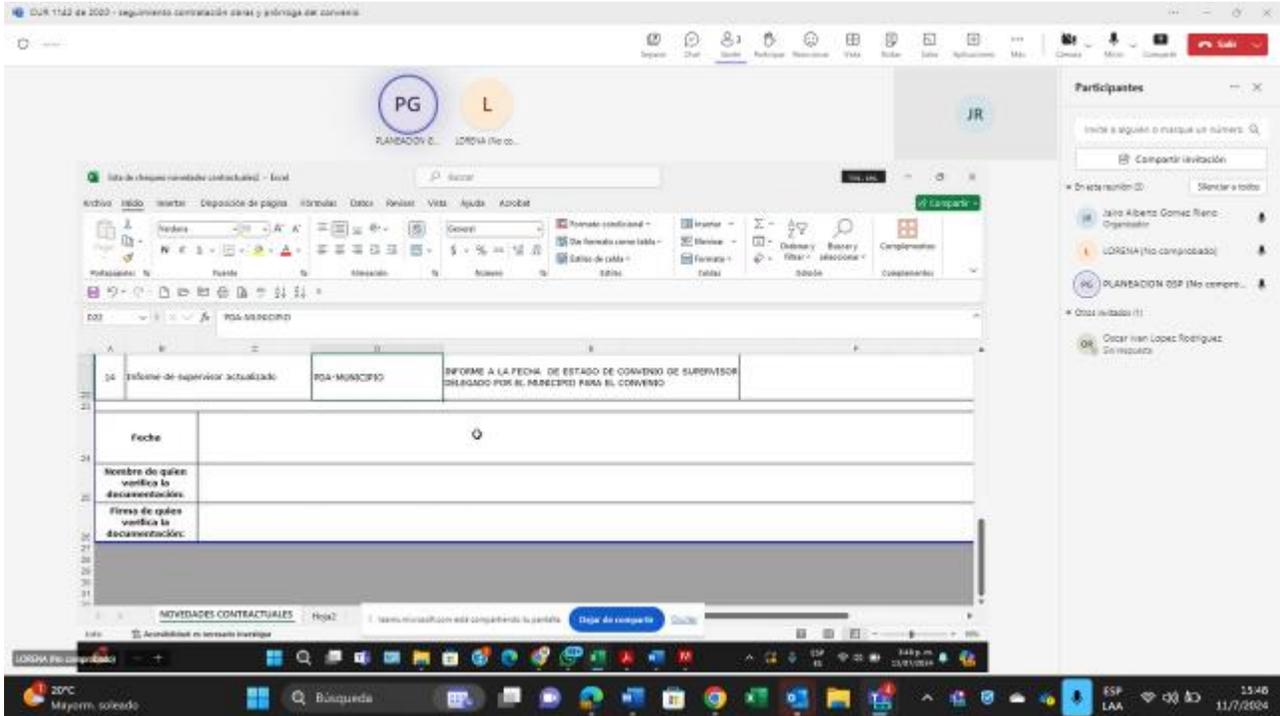

Microsoft Teams Meeting: DUR 1122 de 2023 - seguimiento contratación obras y entrega de convenio

Participants: PG (FUNDACION C...), L (LORDIA (No co...)), JR

Shared File: lista de chequeo novedades contratación - Excel

Fecha	Nombre de quien verifica la documentación	Firma de quien verifica la documentación
14	Informe de supervisor actualizado	RD4-MUNICIPIO
		INFORME A LA FECHA DE ESTADO DE CONVENIO DE SUPERVISOR DELEGADO POR EL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO

Activities: MOVIDADES CONTRACTUALES - Hoja2

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

