

ACTA Reunión Virtual

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de julio de 2024
HORA:	De 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Jose Barrera, Subsecretario Hábitat, municipio de Rionegro. Vanesa Yepes Arias, Apoyo a la Supervisión del municipio de Rionegro. Hugo Grajales, Supervisor proyecto, EDESO Luisa Fernanda Duque, Apoyo a la Supervisión EDESO. Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT Veracruz Mosquera, Secretara del Hábitat Mario Montilla, Contratista Poblado Juan Guillermo Monroy: Asesor Jurídico Sebastián Castañeda: Interventoria EDESO Alexander Serna G. Apoyo a la Supervisión, municipio de Rionegro

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los convenios

- CUR 1082 de 2022 - Vigencia 26 de noviembre de 2024, (Obras 10 agosto 2024)
- CUR 802 de 2022 - Vigencia 29 de octubre de 2024, (Obras 13 septiembre 24)
- CUR 800 de 2022 - Vigencia 22 de septiembre de 2024(O.10 septiembre 2024)
- CUR 1080 de 2022 – Vigencia 10 de mayo de 2025

DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento a los convenios suscritos con el Municipio de Rionegro Antioquia, con asignación de recursos Nación, cuyo ejecutor es la Empresa de Desarrollo Empresarial Sostenible de Oriente- EDESO, y el municipio de Rionegro, se llevó a cabo la reunión virtual, en la que se realizó la verificación del avance de los proyectos que se ejecutan en el marco de los respectivos convenios que se mencionan en el orden del día

El Ministerio solicitó a la EDESO y al municipio de Rionegro informar el estado de avance de los indicadores físico y financiero del proyecto, los pendientes y dificultades que se están presentando, así como las acciones tomadas para solucionarlos.

1. CUR 1082 de 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES

DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

La EDESO informó sobre el avance del proyecto que se ejecuta en el marco del convenio siguiente:

El estado de Avance del proyecto a 6 de julio de 2024.

Avance físico programado	98.5 %
Avance físico ejecutado	92.5 %
Avance financiero ejecutado	73.5 %
Avance financiero programado	91,28%

La EDESO manifestó que los contratistas de obra solicitaron prórroga del contrato por un mes es decir hasta el 10 de agosto de 2024, justificado en que hubo atraso en la investigación con equipo de CCTV, cuyo resultado arrojó la necesidad de reparar 7 sitios puntuales de la red construida, lo que atraso la pavimentación de la vía.

Agregó la EDESO que la definición del tipo de planta de emergencia que suministrará energía eléctrica cuando se suspenda el servicio de energía, se solucionó mediante la aclaración que realizó el Diseñador del proyecto, consistente en el suministro de electricidad se a través de una planta alimentada con gas propano (Con cilindros).

Según lo manifestado por la EDESO otro aspecto que influyó en el atraso fue la demora en el cumplimiento de la entrega de la certificación sobre el predio donde se construye la EBAR, exigido por el operador del suministro de energía el cual se remitió al operador, quien hizo nuevas observaciones las cuales se están subsanando para lograr la conexión definitiva y el suministro del medidor del consumo eléctrico.

Un tercer aspecto que incidió en la ejecución de la pavimentación, fueron las lluvias que se han presentado en el sector lo cual demoro el inicio de esta actividad y la continuidad.

Por otra parte las obras pendientes corresponden a:

- Escaleras de gato de los pozos de inspección.
- Pavimento están pendientes 900 ml de 1050 ml.
- Cerramiento del predio.
- Suministro e instalación de Cubierta de la EBAR.
- Suministro Bombas de impulsión.
- Provisional eléctrica de obra.
- Pruebas hidráulicas de algunos tramos de tubería y de la línea de impulsión

- Corrección de los daños encontrados en la tubería instalada. reparaciones pendientes.
- Ajustar el manual de operación acorde a lo construido y al funcionamiento de los equipos instalados.
- Elaboración de los planos récord de los sistemas para la entrega al municipio de Rionegro y al operador de servicios públicos.
- Techo caseta de operación del sistema de bombeo.
- Cerramiento

El Ministerio reitera a la EDESOS la solicitud relacionada con la remisión de la documentación contractual de las modificaciones: Actas de prórroga, pólizas vigentes, cronograma de ejecución actualizado. Así mismo reiteró la instalación de las vallas informativas aprobadas por el Ministerio, teniendo en cuenta que son un ítem contractual de cumplimiento.

Acorde a lo anterior la EDESOS señaló que las siguientes fechas relevantes:

- Fecha de terminación de las Obras: 10 de agosto de 2024.
- Suscripción del Acta Entrega y Recibo Final de obras: 26 de agosto 2024.
- Entrega de obras al municipio 26 de septiembre 2024.

2. CUR 802 de 2022: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

El Ministerio informó que el oficio de aprobación de la reformulación nro. 1 continua en firma en el despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico se espera que en transcurso de la semana se remita al Municipio y a la EDESOS.

Por su parte la EDESOS informó que se reiniciaron los contratos de obra e interventoría a partir del 10 de julio de 2024, por lo que la fecha de terminación de los contratos mencionados sería el 13 de septiembre de 2024.

El avance de las obras continua de la siguiente forma.

- El avance físico ejecutado 64%
- El avance financiero ejecutado 53%

Las obras pendientes por construir:

- Pit de lodos
- Conexione colectores 4 y 5.
- Tramos de alcantarillado faltante. 5 y 6

- Terminación de la PTARD.

Señaló la EDESO que las actividades realizadas a la fecha corresponden a actualización del acta de vecindad la instalación de conexiones domiciliarias en los ramales 5 y 6.

En lo relacionado con las obras por ejecutar la EDESO informó lo siguiente:

- Ruta crítica del PIT de lodos frente que se constituye en el que se ejecutar con prioridad.
- Suministro e instalación de la cubierta del tanque de tratamiento secundario.
- Instalación de tubería 150 m. de diámetro de 8" dos ramales.
- Construcción de 10 Pozos prefabricados 10
- Optimización de las instalaciones eléctricas (Tablero de control y red nueva)

El MVCT recomendó que para el plazo previsto se deben incrementar los frentes de obra, e incrementar el personal constatado teniendo en cuenta las actividades y los frentes de obra por ejecutar.

Asimismo esta Cartera Ministerial solicita se remitan la documentación contractual que legaliza el reinicio de ellos contratos de obra e Interventoría y cargarla en el SIGEVAS. (Actas de reinicio, actas de modificación de la contratación derivada, cronograma de ejecución de obras, pólizas actualizadas de la contratación de las obras y plan de acción actualizado del proyecto).

3. CUR 800 DE 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

La EDESO informó que las obras se reiniciaron el 9 de julio de 2024 y la fecha de terminación de los contratos de obra e interventoría sería el 10 de septiembre de 2024

En cuanto a los indicadores de avance del proyecto continúan en los siguientes porcentajes.

- Avance físico programado	97 %
- Avance físico ejecutado	88 %
- Avance financiero programado	92 %
- Avance financiero ejecutado	84.4%

Se termino la instalación de cubierta en lo lechos de secado, se han adelantado las actividades como la gestión de aprobación de conexión eléctrica y cumplimiento con la norma Retie.

En cuanto a la red de alcantarillado está concluido en su componente de pozos de inspección, instalación de tubería y conexiones domiciliarias.

En lo relacionado con las obras pendientes por terminar la EDES0 señaló lo siguiente:

- Caseta de operación de la EBAR
- Instalación de equipos de bombeo
- Caja de válvulas control del bombeo.
- Tubería de impulsión terminar los últimos metros a la llegada a la PTARD.
- Cerramiento de infraestructura.

En lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas está pendiente por terminar:

- Suministro de la planta de emergencia.
- Instalaciones eléctricas
- Canal de entrada
- Redes hidráulicas
- Carpintería metálica edificios administrativos
- Senderos internos de la PTARD.
- Recibo de árboles sembrados.

El MVCT recomendó que para el plazo previsto se deben incrementar los frentes de obra, e incrementar el personal constatado teniendo en cuenta las actividades y los frentes de obra por ejecutar.

Asimismo, esta Cartera Ministerial solicitó se remitan la documentación contractual que legaliza el reinicio de los contratos de obra e Interventoria y cargarla en el SIGEVAS. (Actas de reinicio, actas de modificación de la contratación derivada, cronograma de ejecución de obras, pólizas actualizadas de la contratación de las obras y plan de acción actualizado del proyecto).

4. CUR 1080 de 2022: OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR POBLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

El Ministerio informó que el oficio de aprobación de la reformulación nro. 1 continua en firma en el despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico se espera que en transcurso de la semana se remita al Municipio y a la EDESO.

Por su parte la EDESO informó que se reiniciaron los contratos de obra e interventoría a partir del 10 de julio de 2024, por lo que la fecha de terminación de los contratos mencionados sería el 10 de enero de 2024.

Se revisan los compromisos a la fecha:

- | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| • Reanudación de obra e interventoría | 09 de julio de 2024. |
| • Terminación de las obras: | 10 de enero de 2025. |
| • Proceso energización de obras: | 15 de marzo de 2025 |
| • Puesta en marcha de obras entrega al municipio: | 15 de abril de 2025 |
| • Liquidación de contratos derivados: | 10 de mayo de 2025. |
| • Liquidación del Convenio CUR 1080: | 15 de julio de 2025 |

Por su parte el municipio de Rionegro informó que las actividades adelantadas desde el reinicio de las obras corresponden a las siguientes:

- Construcción del campamento
- Socialización del reinicio del proyecto
- Compra de materiales.
- Contratación de personal
- Actualización de las actas de vecindad.
- Se iniciaron las excavaciones el 12 de julio de 2024 para el alcantarillado.

En cuanto a al primer desembolso se recibió el 15 de julio la certificación solicitada por el área financiera por lo que se continuara con la solicitud del primer desembolso ante el área financiera del MVCT.

Finalmente el Ministerio solicitó se remitan la documentación contractual que legaliza el reinicio de los contratos de obra e Interventoria y cargarla en el SIGEVAS. (Actas de reinicio, actas de modificación de la contratación derivada, cronograma de ejecución de obras, pólizas actualizadas de la contratación de las obras y plan de acción actualizado del proyecto).

Se programó reunión de seguimiento para el próximo 23 de julio de 2024.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
Convenio CUR 1082 de 2022			
1	Terminación de las obras	EDESO	10/08/2024
2	Suministro e instalación de la valla informativa del proyecto	EDESO	10/08/2024
3	Remisión de documentación contractual legalización de reinicio de obras modificaciones, pólizas y cronograma de obras cargue Sigevias	EDESO	23/07/2024
4	Informe semanal de avance de las obras.	EDESO	23/07/2024
Convenio CUR 802 de 2022			
5	Terminación de las obras	EDESO	13/09/2024
6	Remisión oficio informando el concepto favorable del Comité Técnico a la Reformulación No. 1	MVCT	19/07/2024
7	Remisión de documentación contractual legalización de reinicio de obras modificaciones, pólizas y cronograma de obras cargue Sigevias	EDESO	19/07/2024
Convenio CUR 800 de 2022			
8	Terminación de las obras	EDESO	10/09/2024
9	Remisión oficio informando el concepto favorable del Comité Técnico a la Reformulación No. 1	MVCT	19/07/2024
10	Remisión de documentación contractual legalización de reinicio de obras modificaciones, pólizas y cronograma de obras cargue Sigevias	EDESO	19/07/2024
Convenio CUR 1080 de 2022			
11	Respuesta oficios Nos. 2024EE0001374 del 22/01/2024.y 2024EE0019990 del 27/03/2024	M. Rionegro	Incumplido
12	Remisión de apertura convocatoria para operación de sistemas de alcantarillado y saneamiento básico	M. Rionegro	30/04/2024 Incumplido
13	Terminación de obras	M. Rionegro	10/01/2025
14	Desembolso No. 1 del MVCT	MVCT	15/08/2024
15	Remisión de documentación contractual legalización de reinicio de obras modificaciones, pólizas y cronograma de obras cargue Sigevias	M. Rionegro	

Anexos: Lista de asistencia a la reunión
 Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Fecha: 15-07-2024

Seguimiento CUR 800, 802, 1082 y 1080 de 2022, Avance proyectos

09:34

Participantes

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- VM Veracruz Mosquera (No comprobado)
- M Mariano (No comprobado)
- LP Luisa Fernanda Duque ... (Externo)
- LD Luisa Duque (No comprobado)

ÚLTIMA HORA La Justicia de EE...

01:16:23

Grabación y transcripción


Informe a todos de que se les está grabando y transcribiendo. [Dirigirse a la privacidad](#)

Participantes

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- GA Grupo Ambiental (No comproba...)
- IG Ing Christian ... (No comprobado)
- JB José Barrera... (No comprobado) En espera
- JH JUAN GUILLERMO MONROY HE...
- LD Luisa Duque (No comprobado)
- LP Luisa Fernanda Duque ... (Externo)
- RE Red Vial Edeso (No comprobado)
- SC sebastian castañeda (Externo)
- VA VANESA ANDREA YEPES ARIAS (...)
- VM Veracruz Mos... (No comprobado)

18°C Mayorm. nublado

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

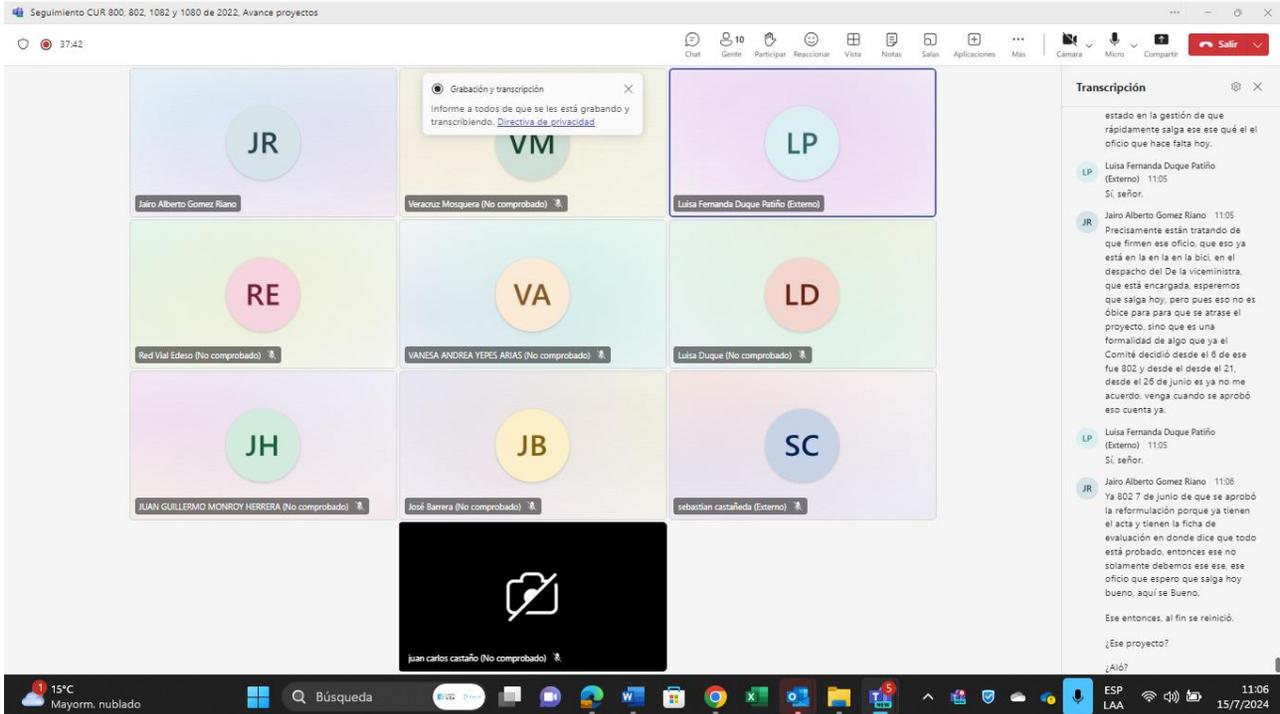

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a grid of nine participants, each with a circular avatar and a name tag. The participants are: JR (Jairo Alberto Gomez Riano), VM (Veracruz Mozquera), LP (Luisa Fernanda Duque Patillo), RE (Red Vial Edezo), VA (VANESA ANDREA YEPES ARIAS), LD (Luisa Duque), JH (JUAN GUILLERMO MONROY HERRERA), JB (José Barrera), and SC (Sebastian castañeda). A central video tile for Juan Carlos Castaño is currently muted. A chat window on the right side of the screen shows a transcript of the meeting. The transcript includes the following text:

estado en la gestión de que rápidamente salga ese ese que el el oficio que hace falta hoy.

LP Luisa Fernanda Duque Patillo (Externo) 11:05
Sí, señor.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 11:05
Precisamente están tratando de que firmen ese oficio, que eso ya está en la en la en la bici, en el despacho del De la viceministra, que está encargada, esperemos que salga hoy, pero pues eso no es óbice para para que se atrase el proyecto, sino que es una formalidad de algo que ya el Comité decidió desde el 6 de ese fue 802 y desde el desde el 21, desde el 26 de junio es ya no me acuerdo, venga cuando se aprobó eso cuenta ya.

LP Luisa Fernanda Duque Patillo (Externo) 11:05
Sí, señor.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 11:06
Ya 802 7 de junio de que se aprobó la reformulación porque ya tienen el acta y tienen la ficha de evaluación en donde dice que todo está probado, entonces ese ese solamente debemos ese ese oficio que espero que salga hoy bueno, aquí se Bueno.

Ese entonces, al fin se reinició.
¿Ese proyecto?
¿Aíá?

23 de julio 10:
