

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA ASISTENCIA TECNICA SEGUIMIENTO
MUNICIPIO DE CANDELARIA**

DATOS GENERALES

FECHA:	06 de junio de 2024
HORA:	10:00 a.m.
LUGAR:	El desarrollo de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual, con municipio de Candelaria y MVCT a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fernando Prieto - Secretario de Infraestructura - Municipio Candelaria ➤ Carlos Andres Rodriguez - Contratista de interventoría ➤ Dickson Peña - Residente contratista de obra ➤ Martha Romero - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Socialización estado Convenio 1319-2023.
3. Cierre

DESARROLLO:

Se procede con la reunión de asistencia técnica así:

Convenio 1319/2023	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLÁNTICO.
Observaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inicia comité técnico reportan avance físico 0% y avance programado 10% 2. Interventoría informa que se encuentran en levantamiento de las actas de vecindad, con avance del 30 %. 3. Interventoría cuenta con cartera topográfica de 5 calles a intervenir. 4. Documentación preliminar, hojas de vida, topografía, replanteo aprobado por interventoría. 5. Pendiente informe de interventoría entrega el 7 junio p.m. 6. Pendiente informe de supervisión por municipio.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


	<ol style="list-style-type: none"> 7. Cuando inicia excavación. (24 de mayo no cumplido). Inicia excavación el 6 junio. 8. Reunión interventoría el 6 junio con Aguas Sur, programada con el director contratista Miguel Varela, consulta diseño cotas del punto de amarre. 9. Cronograma de obra remite municipio a MVCT el 06 junio.
Compromisos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Municipio: remitirá cronograma de obra el 6 de junio de 2024. 2. Municipio: Interventoría programó reunión con contratista de obra, para la revisión diseños con la empresa Aguas Sur. Fecha el 6 de junio de 2024. 3. Municipio: pendiente informe de interventoría entrega el 7 junio p.m. 4. Municipio: Pendiente próxima semana remitir a MVCT informe de supervisión. 5. Municipio informa que realizará comités de obra con contratista de obra e interventoría, todos los jueves a las 8:30 a.m.

Cierre

LINK REUNION:

<https://teams.live.com/joinmeeting/9341729403048?p=4euLTPyeS8odGWSJ2m>

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams.

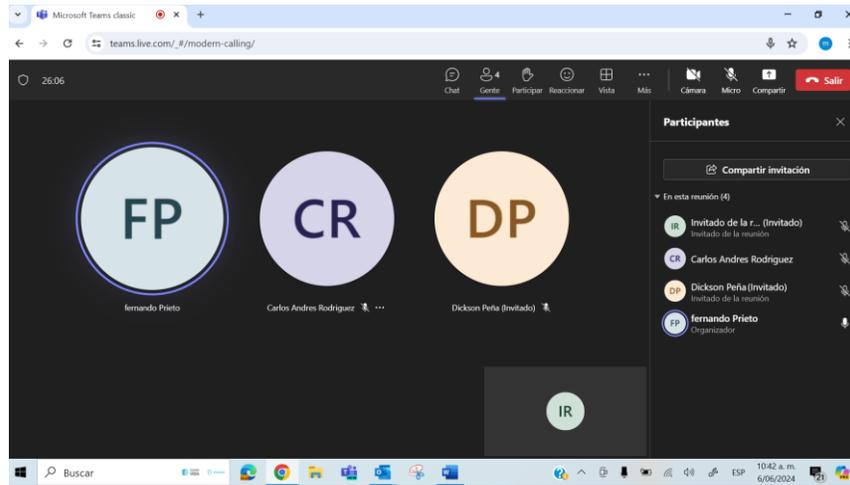

Elaboró: Martha Romero. Apoyo a la Supervisión.
