

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### ACTA No. 20240625

#### PROYECTOS:

- OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ
- CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
- AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS –SUCRE
- AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAYO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE

#### DATOS GENERALES

FECHA:	25-06-2024
HORA:	9:00 a.m.
LUGAR:	<b>Plataforma TEAMS</b>
ASISTENTES	<p>Por parte de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P.:</p> <p>Ing. Álvaro Marino M. – Apoyo a la supervisión          Ing. Hernando Montes Sevilla – Apoyo a la supervisión          Ing. Jhony Garay – Apoyo a la supervisión          Ing. Ángel Martínez Gómez – Apoyo a la supervisión</p> <p>Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT:</p> <p>Arq. Martha Romero – Apoyo a la supervisión.</p> <p>Por parte de los proyectos:</p> <p>Sincé          Miguel Mercado Buendía- Representante Legal          CONSORCIO ALCANTARILLADO SINCE-Contratista de Obra          Marco Galeano-Representante Legal suplente          CONSORCIO INTER ALCANTARILLADO SINCE-Interventoría</p>

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	<p>Santiago Apóstol Humberto Pérez- Representante Legal suplente CONSORCIO REDES SANTIAGO-Contratista de Obra Verónica Sierra-Director de Interventoría</p> <p>Mateo Pérez-Mata de Caña Yordy Díaz-Representante Legal CONSORCIO REDES COMA-Contratista de Obra Jorge Dumar-Representante Legal CONSORCIO INTER MATEO PEREZ-Interventoría</p> <p>Cayo De La Cruz Leonardo Pérez Jiménez-Representante Legal CONSORCIO ACUEDUCTO AZBUN 2022-Contratista de Obra Camilo Padrón-Residente de Interventoría CONSORCIO INTER LA UNION-Interventoría</p>
--	--

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. AVANCES DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS – SUCRE
2. AVANCES CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
3. AVANCES PROYECTO ACUEDUCTO CAYO DE LA CRUZ - SAN MARCOS.
4. AVANCES PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ

#### **DESARROLLO:**

1. Reporte de avance del proyecto Acueducto Mateo Pérez y Mata de Caña. El ingeniero Álvaro Marino se encontraba en otro compromiso, por ende el ingeniero Ángel Martínez fue quien desde un principio empezó a exponer la presentación. Según la información reportada por parte del

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

contratista de interventoría, a fecha de corte del día 21 de junio de 2024 el proyecto posee un avance físico ejecutado de 14.64%, un avance físico reprogramado del 23.12% y un atraso de 8.48%.

- La arquitecta Martha Romero solicita a la interventoría justificar el atraso del proyecto Sampués, teniendo en cuenta la fecha de inicio de la prórroga, la cual fue el día 17 de junio de 2024. La interventoría expresa que dicho atraso es atribuible al contratista de obra debido al cese de actividades respecto a la instalación de la tubería de conducción y averías mecánicas de la máquina perforadora del pozo profundo.
- El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expresa que no posee recursos adicionales, ante lo dicho por el contratista de obra, quien expresa que se requieren recursos adicionales por cantidades adicionales. El Ministerio informa que los recursos deben ser gestionados por el Municipio.
- El abogado Cristian Ochoa, abogado contratista externo de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P, interviene y expresa lo siguiente: con respecto al proceso administrativo sancionatorio en contra del CONSORCIO REDES COMA, en calidad de contratista de obra, ya se hizo el traslado de pruebas. El apoderado del consorcio solicito acceso al cuaderno de pruebas, y se dieron 3 días hábiles de traslado. Se va a citar al contratista de obra a audiencia para alegatos de conclusión y decisión con respecto a la imposición de la multa. Está transcurriendo la fase final, para dictar resolución que decide de fondo el incumplimiento. Con respecto al tema de mayores y menores cantidades de obra, el abogado expresa que habría que mirar la distribución del riesgo con respecto a mayores y menores cantidades cuando corresponden a los atrasos dentro del cronograma y planificación proyectada. Si, el atraso corresponde a un riesgo atribuible al contratista, no se debería reconocer mayores cantidades de obra, ya que el contratista debía prever lo correspondiente a esas obras que se tenían que realizar dentro del cronograma. Además, las obras colindantes al proyecto no son motivo para tener atrasos en la ejecución de las actividades. La prórroga fue aprobada por dos (02) meses con el compromiso que el contratista avanzara en la ejecución y aumentara el rendimiento y reducir de esta manera el desfase en los avances ejecutados y programados.
- El contratista de obra expresa que ha tenido diferencias técnicas, ya que ha sugerido el cambio de diámetro de la tubería en la línea de conducción,

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

además expresa que lo que va a alimentar al pozo es un sistema solar y se restringe el caudal disponible y se puede tener problemas para la operación de 24 horas.

- El ingeniero Álvaro Marino expresa que no se utilizó un sistema mixto en la energización del pozo debido a que cuando se formuló el proyecto, este se ajustó a los recursos disponibles, y por ende no se consideró un sistema eléctrico convencional.
  
- 2. Reporte de avance del proyecto del sistema de alcantarillado del corregimiento Santiago Apóstol. Según la información suministrada por parte del contratista de interventoría, el porcentaje ejecutado es del 30.89% y un programado de 60.04%, teniéndose un atraso de 29.15%. Se han tenido problemas en la ejecución de las actividades debido a las constantes lluvias que se presentan en la zona donde se lleva a cabo el proyecto. Se ha avanzado aproximadamente un 5%, con respecto a la última visita a obra que se realizó.
  
- Con respecto al plan de contingencia, la interventoría expresa que: en el proyecto hay presencia de 2 retroexcavadoras y 3 pajaritas, llegara otra pajarita para aumentar rendimiento. Cada cuadrilla para lo relacionado con las excavaciones posee 2 oficiales y 2 ayudantes por cada uno de los frentes. Se está trabajando en registro de acometidas, se iniciarán los trabajos de excavaciones para manholes. Se sigue trabajando en las excavaciones manuales para las acometidas e instalación de la misma tubería.
  
- De acuerdo a los informes de interventoría, el ingeniero Hernando Montes da a conocer que los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4 y 5 fueron devueltos a la interventoría para ser subsanados, y con respecto al informe No.6, la única observación es que no está anexada la seguridad social de la interventoría.
  
- La arquitecta Martha Romero recordó los compromisos pactados en el último comité: entrega de plan de contingencia (cumplido según interventoría), visita técnico-jurídica (programada para el día 26 de junio de 2024 según el ingeniero Hernando Montes).
  
- El abogado Cristian Ochoa, abogado contratista externo de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P, interviene y expresa lo siguiente: con

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

respecto a la obra de Santiago Apóstol no se han adelantado acciones hasta el momento, ya que según los reportes de las veedurías ciudadanas y de los ingenieros de apoyo a la supervisión, dicha obra en fecha actual se está ejecutando y marchando de buena forma, y que jurídicamente se está haciendo el seguimiento de la misma, teniendo en cuenta bitácoras, actas de visita a obra e informes de supervisión, y que posiblemente esta obra puede tener en un corto plazo un hecho superado. Con respecto a la interventoría, no pasa lo mismo, ya que la interventoría presenta atrasos en la ejecución contractual. Se citó para el día 21 de junio una audiencia para practicar la prueba testimonial solicitada por el apoderado del contratista de obra, para que la directora de interventoría rinda prueba testimonial para dilucidar si existe o no incumplimiento del contratista interventor, pero no se hizo la diligencia, ya que la directora no acudió. La no asistencia de la directora debe ser justificada, ya que si no presenta esta justificación se prescinde de la prueba y se cita a audiencia de alegatos de conclusión del apoderado del contratista de interventoría. Para el contratista de obra se ordenaron las pruebas y se van a trasladar dichas pruebas.

3. Reporte de avance del proyecto acueducto Cayo De La Cruz – San Marcos. De acuerdo a lo reportado por parte de la interventoría, el porcentaje físico ejecutado es del 17.17%, porcentaje físico programado 91% y un atraso de 73.83%.
  - Con respecto al plan de contingencia la interventoría manifiesta que se está trabajando acorde a la reprogramación y a la prórroga en tiempo, se hicieron unas observaciones por parte de la interventoría y está a la espera de las subsanaciones de dichas observaciones.
  - La arquitecta Martha Romero expresa que el plan de contingencia debe hacerse respecto a la fecha de terminación, es decir, hasta el 12 de agosto.
  - La interventoría expresa que en los cinco meses de prórroga posiblemente se cumpla la ejecución de actividades al 100%.
  - El abogado Cristian Ochoa, abogado contratista externo de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P expresa que: con respecto al alcalde de San Marcos, la administración actual del municipio no puede ser indiferente con relación al convenio entre el MVCT, el municipio y AGUAS DE SUCRE S.A. ES.P. Es necesario iniciar el informe de presunto incumplimiento por

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

parte del contratista de obra, teniendo en cuenta el desfase en los avances del proyecto. Además, se debe evaluar lo correspondiente al interventor y verificar si está cumpliendo con sus obligaciones.

- La arquitecta da a conocer los compromisos pactados en el último comité: entrega relación del pago de mano de obra no calificada (se encuentra en estado de validación), oficio de aprobación de pólizas (el oficio ya se encuentra proyectado según ingeniero Jhony Garay), plan de contingencia (está en revisión por parte de ADS), aprobación de prórroga (en espera de subsanación por parte del contratista de obra).
- 4. Reporte de avance del proyecto alcantarillado sanitario de Sincé. De acuerdo a lo suministrado por la interventoría se tiene un avance físico ejecutado de 18.30%, físico reprogramado de 24.70% y un atraso de 6.40%.
  - La arquitecta Martha solicita tener en cuenta el porcentaje de atraso 6,40% y presentar la alerta ante el área jurídica de ADS, para considerar un informe de posible incumplimiento. El abogado responde que eso es relativo, depende del estado de ejecución donde se encuentre el proyecto. Se debe dar alerta de los atrasos técnicos. Todo depende del porcentaje de desfase.
  - El ingeniero Hernando Montes expresa que el contratista de obra empezó a incluir nuevos frentes de trabajo, vinculando nuevo personal en los frentes de trabajo para no tener un desfase significativo en los porcentajes de avance, y de esta manera no incurrir en un presunto incumplimiento.
  - Con respecto al plan de contingencia, la interventoría el contratista de obra se comprometió la otra semana a activar el frente de trabajo correspondientes a maquinaria, vinculación laboral de personal auxiliar de esa maquinaria.
  - La arquitecta Martha pregunta sobre el contrato de pavimentación del municipio. El ingeniero Hernando Montes expresa que han llegado varios mixers que están trabajando en unos puntos que no son del área de influencia del alcantarillado.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**COMPROMISOS** (Si aplica).

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Prueba testimonial de San Benito Santiago Apóstol (Proceso administrativa sancionatorio por presunto incumplimiento)	Directora de interventoría Santiago Apóstol / ADS.	Pendiente
2	Solicitar Plan de contingencia con tiempos	Directora de interventoría Santiago Apóstol	27-06-2024
3	Alegatos de conclusión y fallo proyecto San Benito – Contratos de Obra e Interventoría (Proceso administrativa sancionatorio por presunto incumplimiento)	Contratista de obra Contratista de interventoría Entidad Contratante ADS.	Pendiente
4	Alegatos de conclusión y fallo proyecto Mateo Pérez – Contrato de Obra (Proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento)	Contratista de obra Contratista de interventoría Entidad Contratante ADS	04-07-2024
5	Entrega de plan de contingencia, proyecto Cayo La Cruz	Contratista de obra	Pendiente
6	Estado evaluación posibles incumplimientos contratista Cayo de la Cruz.	ADS	Pendiente
7	Plan de contingencia Mateo Pérez_ Sampués	Contratista de obra y aval de interventoría	27-06-2024
8	Entrega del Balance de obra	Contratista y aval de Interventoría	02-07-2024

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

9	Aprobación póliza todo riesgo contratista Sampués	ADS	Pendiente
10	Visita de obras	Apoyos a la Supervisión	Mínimo dos veces al mes

Nota: Como soporte para cada comité de seguimiento, se ha solicitado a Aguas de Sucre una presentación con el estado de cada uno de los proyectos bajo su supervisión, la cual complementa y hace parte de la presente acta de comité.

**FIRMAS EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P:**




Ing. Álvaro Marino Marengo  
Apoyo a la Supervisión



Ing. Hernando Montes  
Apoyo a la Supervisión




Ing. Jhony Garay  
Apoyo a la Supervisión



Ing. Ángel Martínez Gómez  
Apoyo a la Supervisión

**FIRMAS MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT:**



Arq. Martha H. Romero  
Apoyo a la Supervisión



MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO



¡Más que Agua, Llevamos Vida!

Cra 20 # 24 - 52 Avenida Castañeda, Tel: 2786279

[aguasdesucre@aguasdesucre.com](mailto:aguasdesucre@aguasdesucre.com)

Sincelejo-Sucre-Colombia



**“CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL  
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL  
CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL,  
MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD,  
DEPARTAMENTO DE SUCRE”**

# GENERALIDADES Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

<b>GENERALIDADES</b>	
<b>CONTRATO</b>	No. LP-ADS-010-2023
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO REDES SANTIAGO R/L CRISTIAN ALEXANDER OLIVO ARELLANO
<b>VALOR INICIAL</b>	\$9.709.306.024,00
<b>PLAZO</b>	<b>9 MESES</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>15 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>
<b>FECHA TERMINACION</b>	<b>15 DE AGOSTO DE 2024</b>
<b>AVANCE TEMPORAL (20-03-2024)</b>	<b>217 DÍAS ( 80,37%)</b>

## RESUMEN AVANCES

<b>PORCENTAJE FISICO CON CORTE 21-06-2024</b>	
<b>ITEM</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>PRELIMINARES</b>	<b>19,61%</b>
<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>	<b>5,65%</b>
<b>REDES COLECTORES SUMINISTRO</b>	<b>0,73%</b>
<b>REDES COLECTORES INSTALACIÓN</b>	<b>1,07%</b>
<b>CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>	<b>0,0%</b>
<b>CÁMARA DE CAÍDA</b>	<b>0,0%</b>
<b>CÁMARAS DE INSPECCIÓN</b>	<b>0,0%</b>

<b>PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 21-06-2024</b>
<b>30,89%</b>

<b>PORCENTAJE FISICO REPROGRAMADO PARA EL 21-06-2024</b>
<b>60,04%</b>

<b>PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 21-06-2024</b>
<b>29,15%</b>

<b>PORCENTAJE AVANCE TEMPORAL</b>
<b>80,37%</b>

- **El PAC será enviado el día 26 de junio de 2024.**

CUR	SALDO EN FIDUCIA (CON RENDIMIENTOS) A JUNIO DE 2024	SALDO NETO DISPONIBLE (SIN RENDIMIENTOS NI GMF NI RETEFUENTE) A JUNIO DE 2024	AVANCE FISICO DEL VEINTE (20%), VALOR Y PERIODO	FECHA ESTIMADA DE PAGO	NUEVO SALDO EN FIDUCIA	RECURSOS POR SOLICITAR (3ER TRIMESTRE/2024)
1364	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$2.160.734.576,60 junio de 2024)	Julio 18-2024	\$ 0,00	\$3.241.101.864,90

- COMPONENTE TÉCNICO, este componente encontramos los diseños, los equipos de topografía, maquinaria, herramientas y materiales que se requieran para la construcción del alcantarillado. Se trabajarán en 4 frentes de trabajo cada uno estará compuesto por 4 cuadrillas, distribuidos de la siguiente manera:

FRENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDAD	PERSONAL	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HERRAMIENTAS
Excavación a maquina	1 operario de retroexcavadora	Descapote de instalaciones domiciliarias. Excavación tubería principal Excavación manjoles. Rellenos de con material común.	1 Retroexcavadora
Instalación domiciliarias	2 ayudantes	Excavaran las instalaciones domiciliarias. Relleno y compactación de material seleccionado (0.3m)	Palas, picos, bugís Compactador tipo canguro.
Instalación de tuberías y accesorios	Oficiales (1) Ayudantes (1)	Instalaran las tuberías y accesorios en las tuberías principales y domiciliarias. cámaras de caída, encabezaran en los manjoles Instalación arena de nivelación. Instalación de relleno de relleno inicial	Herramienta menor. Compactador tipo canguro
Manjoles	Oficiales (1) Ayudantes (2)	Construcción de manjoles incluye solado, piso, cañuelas, paredes, tapas, escalera de acceso y resane de entrada de tuberías. Rellenos y compactación alrededor de los manjoles	Mezcladora. Vibrador de concreto Herramienta menor. Compactador tipo canguro
Entibados.	2 ayudantes	Instalación de entibados metálicos en profundidades mayores a 1.5m como lo requiere la normatividad SST en Colombia	Entibados. Madera, Herramienta menor
Registros domiciliarios	Oficiales (1) Ayudantes (1)	Construcción de registro con accesorio de salida	Mezcladora. Vibrador de concreto Herramienta menor


# INCONVENIENTES PRESENTADOS

- **Estado presunto incumplimiento:** De acuerdo con el contrato de consultoría, se realizó audiencia de practicas de pruebas el día 21 de junio de 2024, se programó visita técnico jurídica el día 26 de junio de 2024 y se procederá si es el caso a la tasación de multa para notificar al contratista.
- **Referente al contrato de obra:** Se realizó visita al sitio de las obras para el día 24 de mayo de 2024 y verificamos la implementación de varios frentes de obras (4 maquinas realizando excavaciones, construcción de acometidas domiciliarias), se programó visita técnico jurídica el día 26 de junio de 2024.

**El proyecto presenta un avance acumulado a fecha del 21 de junio del 2024 del 20,30%, según último reporte de la interventoría en el informe N°6 correspondiente al periodo del 15 de abril al 14 de mayo de 2024, y de acuerdo con información reportada mediante llamada telefónica el avance actual es del 30,89%, frente al 60,04% (atraso del 29,15%) según programación aprobada por la Interventoría. El Contrato tiene fecha de acta de inicio de 15 de noviembre de 2023 y terminación de 15 de agosto de 2024 (avance temporal 80,37%).**

- Los avances en el Contrato de obra son: Socialización del proyecto, elección de veeduría puntual, avance en Actas de Vecindad, instalación de la valla informativa del proyecto.**
- De acuerdo con la información aportada mediante llamada telefónica se iniciaron las actividades el día 29 de abril de 2024 las cuales son: Excavaciones y rellenos, instalación de tubería alcantarillado sanitario, construcción de cámaras de inspección, suministro de tubería alcantarillado sanitario.**

CURVA S DE EJECUCIÓN DE OBRA		
SEMANA	% Programado	% Ejecutado
2	0,12%	0,15%
4	0,27%	0,29%
6	0,43%	0,43%
8	0,46%	0,48%
10	0,49%	0,59%
12	0,52%	0,64%
14	0,55%	0,70%
16	0,58%	0,70%
18	5,49%	0,70%
20	10,18%	0,70%
22	11,17%	0,70%
24	17,83%	0,70%
26	29,36%	6,84%
28	41,61%	14,81%
30	54,11%	28,50%
31	60,04%	30,89%
32	66,00%	
34	77,35%	
36	86,26%	
38	95,09%	
40	100,00%	

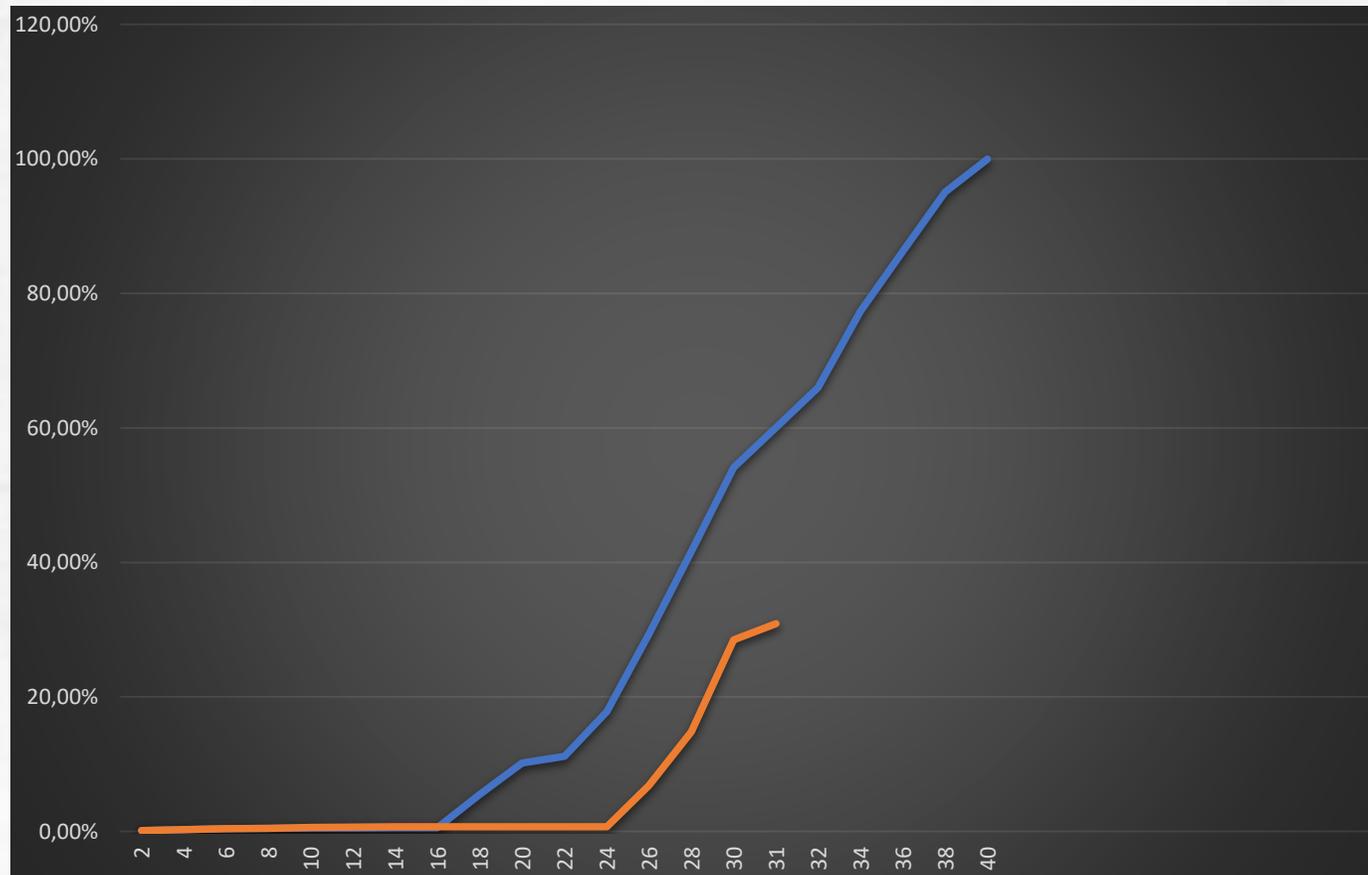



# FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DE OBRAS.



- **Fecha estimada el día 15 de agosto de 2024.**

## Resolución 085 de 2024 apertura a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Consultoría para la Interventoría CMA-ADS-017-2023

Sesión 1 _ 18-03-2024, 9:00 A.M	Sesión 2_ 22-03-2024, 4:00 P.M	Sesión 3_ 08-04-2024, 3:00 P.M	Sesión 4_ 21-06-2024, 2:30 P.M	Sesión 28-06-2024
Aplazada por ausencia del apoderado del Interventor	Aplazada por Solicitud del interventor	Realizada y suspendida (entrega de pruebas hasta 19-04-2024, y a la fecha en evaluación jurídica de pruebas).	Pruebas orales a directora de interventoría.	Citación alegatos de conclusión

## Resolución 096 de 2024 apertura a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Obras LP-ADS-010-2023

Sesión 1 _ 01-04-2024, 3:00 P.M	Sesión 2_ 11-04-2024, 3:00 P.M	Sesión 3_ 24-04-2024, 9:00 A.M	Sesión 05-07-2024
Aplazada por solicitud del contratista	Aplazada por solicitud del contratista	Llamado a descargos y suspendida (entrega de pruebas, y a la fecha en evaluación jurídica de pruebas).	Audiencia de valoración probatoria

# ALERTAS PROYECTOS (INTERVENTORÍA)

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	<b>RESOLUCIÓN No.085 DE 2024</b>	Versión:
		Página:
		Fecha:

"Por medio de la cual se da inició a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión a la ejecución del Contrato de Consultoría - Interventoría N.º CMA-ADS-017-2023"

**EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.**, en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial las que dicta los artículos 33, 34 y 35 del Manual de Contratación de la empresa de servicios públicos mixta del Departamento de Sucre "AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.", los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, modificada por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 1º de la Resolución 293 del 2004 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico, y las demás normas vigentes que la reglamentan, modifican o adicionan, y

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 365 de la Constitución Política dispone, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita;

Que, el artículo 366 de la Constitución Política dispone, que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación;

Que, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política la función administrativa se rige por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad;

Que, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas;

*[Handwritten signature]*

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	<b>RESOLUCIÓN No.085 DE 2024</b>	Versión:
		Página:
		Fecha:

Universitario Especializado, apoyo a la supervisión, HERNANDO MONTES SEVILLA, con el fin de que rindan declaración en audiencia bajo la gravedad de juramento de las condiciones responsables de la supervisión por parte de la Entidad para con el contrato de contrato de interventoría N.º CMA-ADS-017-2023.

**ARTÍCULO CUARTO:** CÍTESE a la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., a través de su apoderado(a) como parte del proceso administrativo sancionatorio, con el propósito que se haga parte de las garantías expedidas PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO. No. PÓLIZA 53-44-101029108-EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO (09-11-2023) y PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO. NO. PÓLIZA 53-44-101029108- EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO (26-01-2024), a favor EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., expedida por la empresa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, donde se asegura y beneficia a la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P, la cual fue aprobada por la empresa, de conformidad con lo establecido en la regulación legal vigente, mediante Resoluciones N° 682 del 14 de noviembre de 2023 y N° 033 del 26 de enero de 2024, respectivamente, para el **Contrato CMA-ADS-017-2023**.

**ARTÍCULO QUINTO:** FÍJESE, la fecha de la audiencia oral concentrada para el día jueves (14) de marzo de 2024, a las 9.00 a.m. a través de la plataforma teams en el link, <https://teams.live.com/join/9313171413749?p=Kp15NL68W7TTCp7e>

**ARTÍCULO SEXTO:** Contra el presente acto no procede recurso alguno.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Sincelejo a los siete (7) días del mes de marzo del año 2024.

**TULIO ALFREDO PINILLA CHÁVEZ**  
Gerente  
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Proyecto	Nombres y Apellidos	Cargo o Vinculación	Firma
	Cristian Ochoa Hernández	Abogado Externo -Secretaría General	<i>[Signature]</i>
Revisó	Jainy Emiliani Ruz	Secretaría General	<i>[Signature]</i>
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

 <p>AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.</p>	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	<b>RESOLUCIÓN No.096 DE 2024</b>	Versión:
		Página:
		Fecha:

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO, SE CITA Y SE APERTURA UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LP-ADS-010-2023"**

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial las que dicta los artículos 33, 34 y 35 del Manual de Contratación de la empresa de servicios públicos mixta del Departamento de Sucre "AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P."; los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, modificada por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 1° de la Resolución 293 del 2004 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico, y las demás normas vigentes que la reglamentan, modifican o adicionan, y

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 365 de la Constitución Política dispone, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita;

Que, el artículo 366 de la Constitución Política dispone, que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación;

Que, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política la función administrativa se rige por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad;

Que, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas;

 <p>AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.</p>	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	<b>RESOLUCIÓN No.096 DE 2024</b>	Versión:
		Página:
		Fecha:


**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Contra el presente acto no procede recurso alguno.

**ARTÍCULO OCTAVO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Sincelejo al décimo dieciocho (18) día del mes de marzo del año 2024

  
**TULIO ALFREDO BINLLA CHÁVEZ**  
 Gerente  
 EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

	Nombres y Apellidos	Cargo o Vinculación	Firma
Proyectó	Cristian Ochoa H.	Abogado Externo –Secretaría General	
Revisó	Jelyny Emiliani Ruiz	Secretaria General	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



**Excavaciones – Suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario (13-06-2024).**



**Excavaciones – Suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario (13-06-2024).**

# ESTADO DE APROBACION POLIZAS

ACTO ADMINISTRATIVO	POLIZA	APROBACION
FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	CUMPLIMIENTO N° 4008871 – ANEXO 0	RESOLUCIÓN N° 681 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 4001864 - ANEXO 0	
	TODOS RIESGOS CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° CRC-100000018	RESOLUCIÓN N° 759 DE 2023
ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO N° 4008871 – ANEXO 1	RESOLUCIÓN N° 032 DE 2024
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 4001864 ANEXO 1	
	TODOS RIESGOS CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° CRC-100000018	RESOLUCIÓN N° 759 DE 2023



**Documentos Contractuales:**

[Resumen](#)

- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales**
- Informes de Interventoría
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comite
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-010-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
APROBACION_POLIZATR_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUM_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUM_LP-ADS-010-2024_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
RCE_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
RCE_LP-ADS-010-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
OTRO SI LP-ADS-010-2023	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACTA SOCIALIZACION SANTIAGO APOSTOL	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACTAS INICIO INTERVENTORIA DEBIDAMENTE FIRMADAS-1	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACTAS INICIO OBRA DEBIDAMENTE FIRMADAS-	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INTER CON CONTRATO	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
APROBACIÓN DE POLÓLIZAS INTER CON ACTA DE INICIO	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
contrato de inter.	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
contrato de obra.	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
POLIZA INTERVENTORÍA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENT	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
RESOLUCIÓN APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO.p	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE POLIZA OBRA	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN PÓLIZA TODO RIESGO	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACTA DE INICIO CMA-ADS-017-2023 CONSULTORIA	23/11/2023			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACTA DE INICIO OBRA LP-ADS-010-2023 SANTIAGO APOST	23/11/2023			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		

-   
- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría**
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comite
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

**+ Informes de Interventoría:**

[Resumen](#)

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
INFORME DE INTERVENTORÍA N°1 COMPLETO	25/04/2024	INFORME DE INTERVENTORÍA N°1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE INTERVENTORÍA N°2	25/04/2024	INFORME DE INTERVENTORÍA N°2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 14 DE ENERO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE INTERVENTORÍA N°3	25/04/2024	INFORME DE INTERVENTORÍA N°3, DEL PEIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 14 DE FEBRERO DE 2024.		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME INTERVENTORIA # 2	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
informe #1 interventoria radicado 1	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		

**NOTA: Los informes de interventoría N°4 y N°5 no se han cargado en el SigeVas porque no son sido allegados por parte de la interventoría, muy a pesar de los requerimientos realizados por la Supervisión.**

Soporte Documental de Proyectos

1-2020-315 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE



- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comite
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

**+ Informes de Supervision Seguimiento:**

[Resumen](#)

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
INFORME DE SUPERVISION N°7_VERSION 1	10/06/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2024_VERSION N°1		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME N°6	03/05/2024	Correspondiente al periodo del 15 de marzo al 14 de abril de 2024 (Versión N°1)		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISION N°5	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INF PRESUNTO INCUMPLIMIENTO SANTIAGO APOSTOL FII.p	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISION 1.	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISIÓN 2 SANTIAGO APOSTOL FII.pdf	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISIÓN 3 SANTIAGO APOSTOL FII	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISIÓN 4 SANTIAGO APOSTOL FII	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		



# **"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ"**

# GENERALIDADES Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

<b>GENERALIDADES</b>	
<b>CONTRATO</b>	No. LP-ADS-011-2023
<b>OBJETO</b>	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCE
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO ALCANTARILLADO SINCE R/L MIGUEL EDUARDO MERCADO BUENDIA
<b>VALOR INICIAL</b>	\$17.609.067.885.00
<b>PLAZO</b>	<b>16 MESES</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>16 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>
<b>FECHA TERMINACION</b>	<b>16 DE MARZO DE 2025</b>
<b>AVANCE TEMPORAL (20-04-2024)</b>	<b>216 DÍAS ( 45,00%)</b>

## RESUMEN AVANCES

**PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 21-06-2024**

**18,30%**

**PORCENTAJE FISICO REPROGRAMADO PARA EL 21-06-2024**

**24,70%**

**PORCENTAJE AVANCE TEMPORAL**


**45,00%**

**PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 21-06-2024**

**6,40%**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	%
1	LOCALIZACION, NIVELACION Y REPLANTEO	100,00%
2	EXCAVACIONES	19,60%
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN BASES DE PAVIMENTO	20,71%
4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO	17,31%
5	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO DE 28 MPA VACIADAS EN EL SITIO, INCLUYE MESA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.20 M DE ESPESOR, CAÑUELAS DE TRANSICIÓN ESMALTADAS, CONO Y CILINDRO DE 1,20 M, FORMALETERÍA, CONTROL DE AGUA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFUERZO, Y SE INCLUYEN LOS DEMÁS COSTOS DIRECTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. INCLUYE SUMINISTRO DE ANILLO Y TAPA	18,36%
6	ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS	9,61%
7	SUMINISTRO DE TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO	18,28%
<b>TOTAL</b>		

CURVA S DE EJECUCIÓN DE OBRA		
Mes	% Programado	% Ejecutado
16/11/2023	0,00%	0,00%
16/12/2023	0,05%	0%
20/02/2024	0,07%	1,37%
19/03/2024	4,11%	5,56%
16/04/2024	9,85%	9,08%
16/05/2024	16,04%	10,6%
7/06/2024	18,50%	14,5%
16/06/2024	24,70%	18,30%
16/07/2024	30,90%	
16/08/2024	37,10%	
16/09/2024	44,52%	
16/10/2024	50,72%	
16/11/2024	64,52%	
16/12/2024	76,23%	
16/01/2025	82,99%	
16/02/2025	91,61%	
16/03/2025	100,00%	

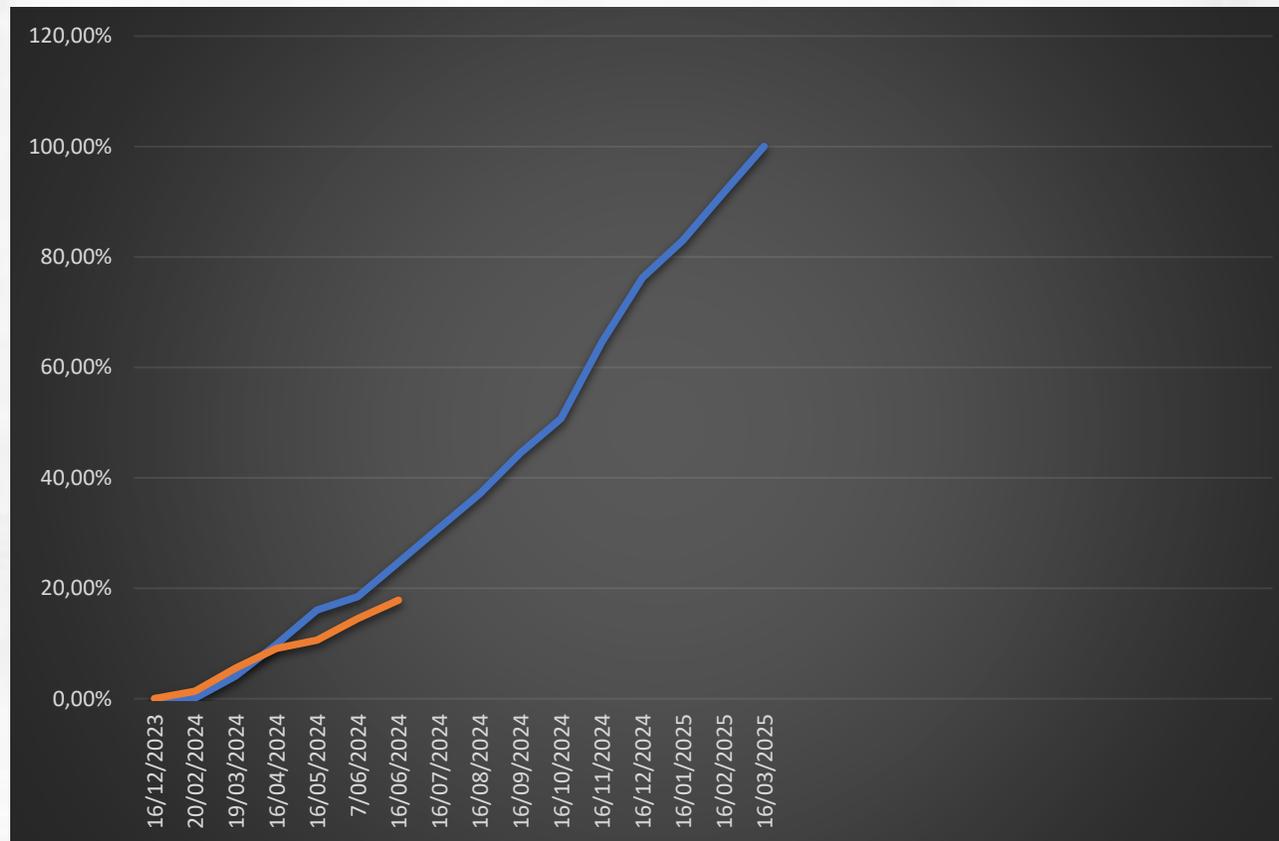

- **Compromisos:** de acuerdo con visita realizada el día 13 de junio de 2024, el contratista se comprometido a incluir nuevos frentes de trabajo para la primera semana de Julio de 2024, actualmente según lo reportado por la interventoría, el contratista se encuentra en vinculación del nuevo personal.
- El proyecto presenta un avance acumulado a fecha del 16 de junio del 14,50 según ultimo reporte de la interventoría en el informe N°6 correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de mayo de 2024, y de acuerdo con información reportada mediante llamada telefónica el avance actual es del 18,30%, frente al 24,70% (atraso del 6,40) según reprogramación aprobada por la Interventoría del día 16 de abril de 2024. El Contrato tiene fecha de acta de inicio de 16 de noviembre de 2023 y terminación de 16 de marzo de 2025 (avance temporal 45,00%).
- Los avances en el Contrato de obra son: Socialización del proyecto, elección de veeduría puntual, avance en Actas de Vecindad, instalación de la valla informativa del proyecto, localización, nivelación y replanteo, excavaciones, relleno y compactación bases de pavimento, instalación de tubería alcantarillado sanitario, construcción de cámaras de inspección, estructuras complementarias, suministro de tuberías



# ALERTAS PROYECTO



- **Plan de contingencia y permisos ambientales:** La interventoría mediante radicado R 875 del día 06 de abril de 2024, allego a la empresa AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. plan de choque del contrato de obra (aumento de cuadrillas), referente a los permisos ambientales no se requiere.
- **Solicitud de informes de interventoría:** El contratista de consultoría ha presentado hasta la fecha todos los informes de interventoría dentro del plazo contractual, fecha máxima de entrega el día 26 de cada mes.



Excavaciones - suministro e instalación de redes alcantarillado - Construcción de pozos de inspección



Excavaciones Barrio charco Colorado- cuenca Sur.

# ESTADO DE APROBACION POLIZAS

ACTO ADMINISTRATIVO	POLIZA	APROBACION
FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	CUMPLIMIENTO N° 21-44-101428959 – ANEXO 0	RESOLUCIÓN N° 680 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 21-40-101221355 - ANEXO 0	
	TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° C-00000083	RESOLUCIÓN N° 717 DE 2023
ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO N° 21-44-101428959 – ANEXO 1	RESOLUCIÓN N° 743 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 21-40-101221355 ANEXO 1	
	TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° C-00000083	RESOLUCIÓN N° 202 DE 2024

1-2021-206 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

		
<b>Actas de Reunión</b>		
Documentos Contractuales		
Informes de Interventoría		
Informes de Comision		
Reformulaciones		
Otros Documentos Legales		
Oficios Recibidos		
Lista de Chequeo		
Presentación Proyectos Comite		
Oficios Enviados		
Ficha de Evaluación		
Acta de Comité		
Proyecto con Concepto - Viabilidad		
Informes de Supervision Seguimiento		
Informe Supervisión Consultoría		
Registro Fotográfico		

**+ Actas de Reunión:**

[Resumen](#)

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
20231219 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240110 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240118 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240125 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240202 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240209 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240216 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240220 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240226 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240305 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240319 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240402 ACTA DE COMITE	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		

- 
- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales**
- Informes de Interventoría
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comite
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

+ Documentos Contractuales: <span style="float: right;"><a href="#">Resumen</a></span>						
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTROSI N°1_LP-ADS-011-2023	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APROBACION_POLIZATR_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APROBACION_POLIZATR_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUM_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUM_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RCE_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RCE_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TR_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE INICIO OBRA FIRMADA.	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE INICIO SINCE INTER.	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATO Inter	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATO obra	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y RCE OBRA CON RESOLUCIÓN DE A	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Póliza inter con acta de inicio y resolucio de ap	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
poliza inter con contrato y resolucio de aprobaci	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pólizas de Cumplimiento y RCE de obra con resoluci	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1-2021-206 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

-   
- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comite
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

**+ Informes de Interventoría:**

[Resumen](#)

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	<input type="checkbox"/>		
INFORME N°6	31/05/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL DE 2024 AL 15 DE MAYO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE INTERVENTORIA N°5_V1	26/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		

1-2021-206 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE



- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría
- Informes de Comisión
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comité
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

**+ Informes de Supervision Seguimiento:**

[Resumen](#)

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORME DE SUPERVISIÓN N°7_VERSION-N1	10/06/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORME N°6.pdf	02/05/2024	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORME N°2.pdf	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORME N°3	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORME N°4	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORME N°5	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISION N°1	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# REPORTE AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO



**El contratista ejecuta las actividades contractuales**

**“AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL  
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS  
CORREGIMIENTOS DE MATEO PÉREZ Y MATA  
DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS –  
SUCRE”**

<b>GENERALIDADES</b>	
<b>CONTRATO</b>	No. LP-ADS-008-2023
<b>OBJETO</b>	Ampliación y optimización del sistema de acueducto de los corregimientos de Mateo Pérez y Mata de Caña en el municipio de Sampués -sucre
<b>CONTRATISTA</b>	Consorcio Redes Coma R/L Yordy Manuel Diaz Acevedo
<b>VALOR INICIAL</b>	\$4.255.020.003
<b>PLAZO INICIAL</b>	7 MESES + 60 días
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>16 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>
<b>FECHA TERMINACION 1</b>	<b>16 DE JUNIO DE 2024</b>
<b>FECHA TERMINACION 2</b>	<b>17 DE AGOSTO DE 2024</b>
<b>AVANCE TEMPORAL (21-06-2024)</b>	218 días ( 79,27%)

# 1. PORCENTAJES PROGRAMADO Y EJECUTADO

<b>PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 21-06-2024</b>
<b>14,64%</b>

<b>PORCENTAJE FISICO REPROGRAMADO PARA EL 21-06-2024</b>
<b>23,12%</b>

<b>PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 21-06-2024</b>
<b>8,48%</b>

<b>PORCENTAJE AVANCE TEMPORAL</b>
<b>79,27%</b>



domingo, 22 de junio de 2024

AVANCES EN EL TANQUE ELEVADO



domingo, 22 de junio de 2024

EXCAVACIONES ADELANTADAS EN TRAMO DE PLACA HUELLA



viernes, 20 junio 2024  
2213837N 75.4067807W  
calle 4  
Barra de Caña  
Empués

DISPOSICION DE MATERIALES




miércoles, 19 de junio de 2024

PERFORACION DEL POZO

CAPITULO	COSTO PARCIAL	% CAPITULO SOBRE TOTAL	AVANCE INFORME 21/06/2024	VR PARCIAL
POZO PROFUNDO	\$670,103,777.26	15.7%	15.70%	\$ 105,234,434.00
CASETA DE BOMBEO	\$19,803,883.43	0.5%	0.21%	\$ 40,942.80
CERRAMIENTO POZO	\$48,054,444.96	1.1%	0.39%	\$ 189,400.00
DESCARGA DE TUBERIA DE POZO	\$53,805,559.00	1.3%	0.00%	\$ -
SISTEMA ELECTRICO POZO	\$221,859,288.00	5.2%	0.00%	\$ -
LINEA DE CONDUCCION	\$1,792,437,765.20	42.1%	15.96%	\$ 286,113,998.00
SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$71,775,353.00	1.7%	0.00%	\$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS CASETA DE CLORACION	\$10,959,133.00	0.3%	0.00%	\$ -
TANQUE ELEVADO	\$848,348,488.53	19.9%	26.69%	\$ 226,390,938.89
REDES DE DISTRIBUCION	\$517,872,310.49	12.2%	0.95%	\$ 4,924,400.00
	<b>\$4,255,020,002.87</b>	<b>100%</b>	<b>14.64%</b>	<b>\$ 612,635,251</b>

# 3. CURVA S ACTUALIZADA

	SEMANA	PROGRAMADO	EJECUTADO
	SEMANA 1	0.00%	0%
	SEMANA 2	0.00%	0%
	SEMANA 3	0.00%	0%
	SEMANA 4	0.00%	0%
	SEMANA 5	0.00%	0%
	SEMANA 6	0.00%	0.08%
	SEMANA 7	0.00%	0.16%
	SEMANA 8	0.00%	0.24%
	SEMANA 9	0.00%	0.32%
	SEMANA 10	0.11%	0.41%
	SEMANA 11	0.24%	0.50%
	SEMANA 12	0.37%	0.59%
	SEMANA 13	0.50%	0.68%
	SEMANA 14	0.73%	0.77%
	SEMANA 15	1.78%	0.77%
	SEMANA 16	7.30%	0.77%
	SEMANA 17	14.60%	0.77%
	SEMANA 18	21.73%	0.77%
	SEMANA 19	25.73%	0.77%
	SEMANA 20	33.90%	1.96%
	SEMANA 21	44.12%	3.14%
	SEMANA 22	52.52%	4.33%
	SEMANA 23	61.28%	5.51%
	SEMANA 24	69.84%	5.76%
	SEMANA 25	74.60%	6.01%
	SEMANA 26	80.29%	6.25%
	SEMANA 27	85.38%	6.50%
	SEMANA 28	93.76%	6.67%
	SEMANA 29	97.29%	10.34%
	SEMANA 30	98.79%	14.01%
	SEMANA 31	16.52%	14.00%
	SEMANA 32	23.12%	14.64%
	SEMANA 33	43.90%	
	SEMANA 34	52.15%	
REPROGRAMACION	SEMANA 35	73.93%	
PRORROGA	SEMANA 36	80.06%	
	SEMANA 37	84.39%	
	SEMANA 38	88.84%	
	SEMANA 39	97.34%	
	SEMANA 40	100.00%	

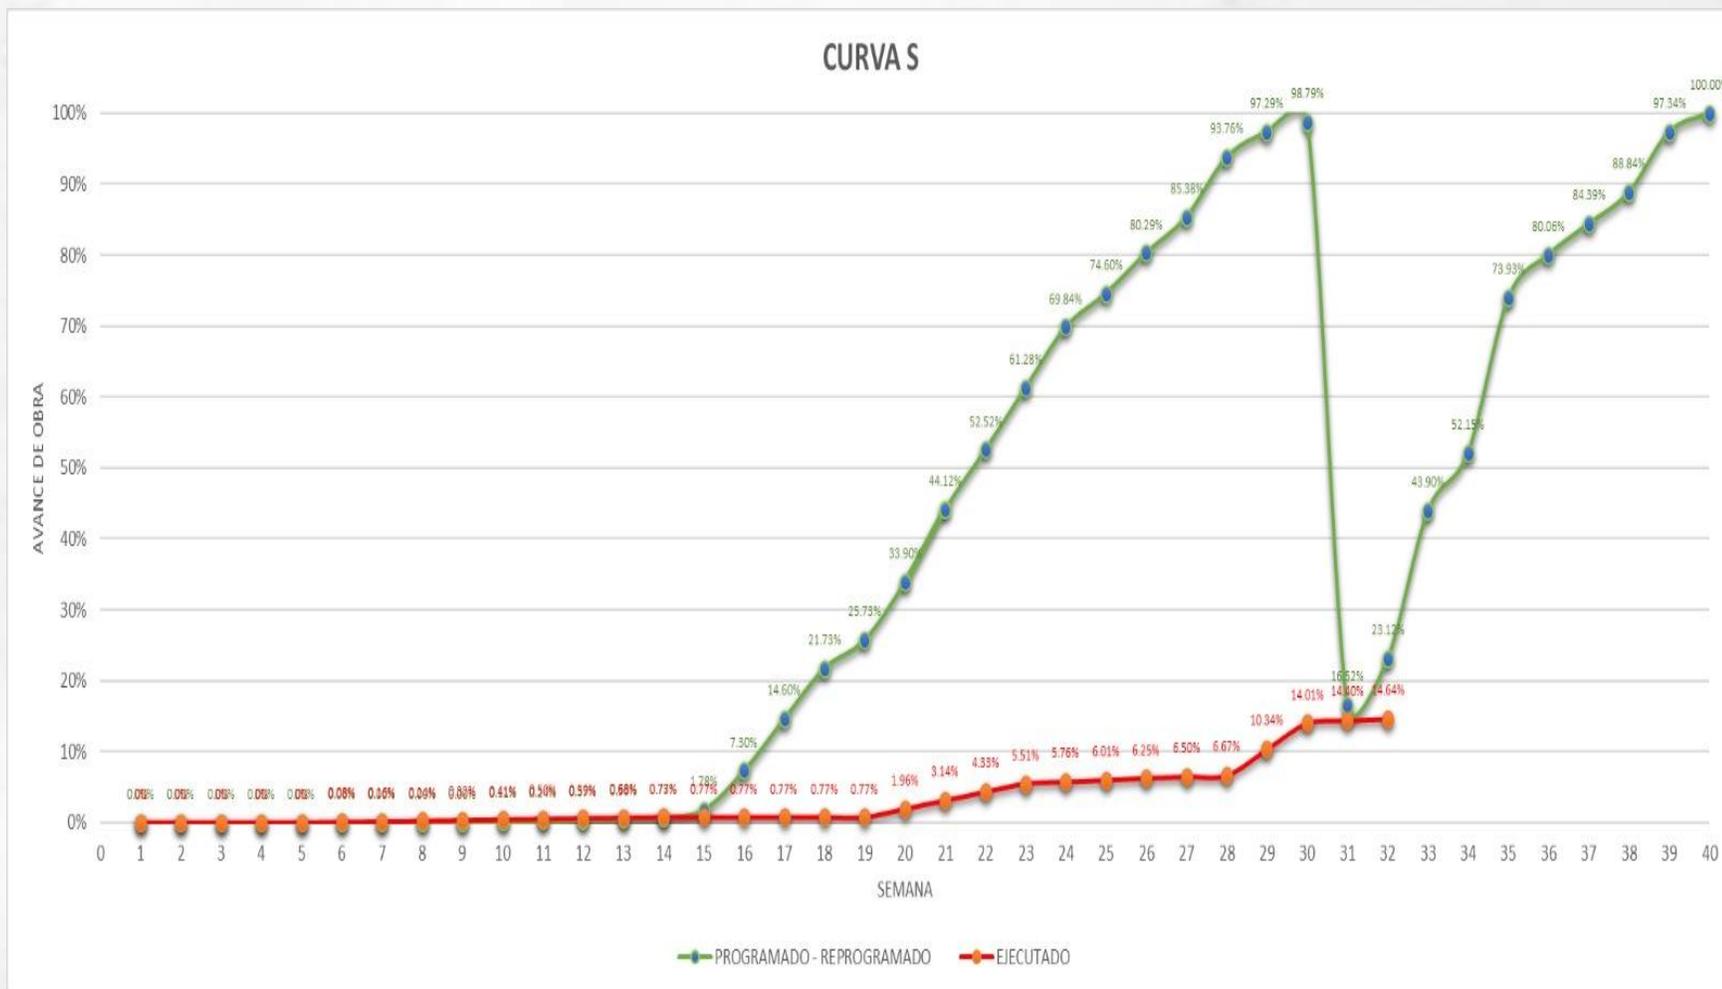

## 4. ALERTAS DEL PROYECTO

### A. Estado presunto incumplimientos con fechas de audiencias realizadas y programadas

#### Resolución 092 de 2024 apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Obras LP-ADS-008-2023, de 13 de marzo de 2024

Sesión 1 _ 20-03-2024, 9:00 A.M	Sesión 2_ 22-03-2024, 10:30 A.M	Sesión 3_ 12-04-2024, 2:00 P.M	Practica de pruebas en campo	Alegatos de conclusión
Aplazada por ausencia del representante del garante SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aplazada por ausencia del representante del garante SEGUROS DEL ESTADO S.A	Descargos del Contratista de obra	Plazo máximo hasta el 19-04-2024 (Cumplida el 15-04-2024)	El día 27 de junio se notificara al contratista de obra CONSORCIO REDES COMA para audiencia el día 4 de julio para alegatos de conclusión

### B. Alertas técnicas

- El contrato de obra LP-ADS-008-2023 tenía un plazo inicial de ejecución hasta el día 16 de junio de 2024, sin embargo se aprobó una prórroga en tiempo sin adición de recursos por dos meses, por ende la fecha de terminación según la adición de tiempo es el día 17 de agosto de 2024. Con un tiempo faltante, a 21 de junio, de 57 días para su terminación.
- El avance general reportado por la Interventoría CONSORCIO INTER MATEO PEREZ para el día 21 de junio, es del **14,64%** y un avance programado del **23,12%** lo que demuestra un atraso del **8,48%** en la primera semana reprogramada.
- Pendiente por ejecutar el 85.36% del objeto contractual en 57 días.
- En el comité técnico N°10 del 22-Mayo-2024 el contratista se comprometió a entregar un balance de obra con un informe técnico de justificación para revisión y aprobación por parte de la interventoría, el cual, quedo como compromiso de entrega el día 28 de mayo de 2024. A la fecha el contratista ha cumplido parcialmente.
- El contratista avanzó en la perforación exploratoria del pozo, en donde se han ejecutado 98 metros de profundidad.
- El contratista inicio las actividades de excavación en el tramo de la placa huella, para la posterior instalación de tubería
- En el sitio de la obra se encuentran acopiados 2400 metros de tubería PEAD 160mm de la línea de conducción, para su instalación.
- Se están adelantando trabajos de concretos y acero de refuerzo entre el segundo y tercer nivel del tanque elevado.

## 4. ALERTAS DEL PROYECTO

-Los inconvenientes que se han presentado en la última semana de la ejecución del proyecto son: averías mecánicas de la maquinaria utilizada en la perforación del pozo profundo, atraso en el suministro del concreto premezclado para el tanque elevado por parte del proveedor, atraso en la entrega del equipo de termo fusión por parte del proveedor, la cual será utilizada para la unión de la tubería de polietileno de la línea de aducción

### **C. Plan de contingencia**

-El plan de contingencia fue remitido a la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., pero la Subgerencia Técnica no aprueba dicho plan de contingencia, ya que según este plan de contingencia la fecha tentativa para finalizar el proyecto es el día 15 de octubre de 2024, lo cual no concuerda con la fecha de terminación del proyecto, la cual es el día 17 de agosto de 2024. por lo dicho anteriormente la Subgerencia Técnica por medio de comunicación interna solicitó a la Interventoría explicar el motivo por el cual aprobó dicho plan de contingencia.

## 5. ESTADO DE POLIZAS

ACTO ADMINISTRATIVO	POLIZA	APROBACION
FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	CUMPLIMIENTO N° 75-44-101133377 – ANEXO 0	RESOLUCIÓN N° 684 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 75-40-101049948- ANEXO 2	
	POLIZA TODO TODO RIESGO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE No. CG-100000155	RESOLUCION N° 004 DE 2024
ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO N° 75-44-101133377 – ANEXO 2	RESOLUCIÓN N° 052 DE 2024
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 75-40-101049948- ANEXO 2	
	POLIZA TODO TODO RIESGO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE No. CG-100000155	PENDIENTE

## **5. POLIZAS**

- La aseguradora emite concepto que la póliza Todo Riesgo puede prorrogarse desde el 30-12-2023 cuantas veces sea necesario pero no es retroactiva hacia el 16-11-2024.
- Las pólizas de la Interventoría con novedad de prórroga fueron radicadas en la Entidad Contratante y se encuentran en revisión por parte de la Secretaria General de la Empresa para su posterior aprobación.
- Con respecto al contratista de obra, las pólizas con novedad de prórroga no han sido radicadas en la entidad.

## 5. INFORMES DE INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL	PERIODO	ENTREGADO POR INTERVENTORIA	APROBADO POR SUPERVISIÓN
N°1	16/11/2023-15/12/2023	SI	SI
N°2	16/12/2023-15/01/2024	SI	SI
N°3	16/01/2024-15/02/2024	SI	SI
N°4	16/02/2024-15/03/2024	SI	SI
N°5	16/03/2024-15/04/2024	SI	SI
N°6	16/04/2024-15/05/2024	SI	SI
N°7	16/05/2024-15/06/2024	SI	En revisión

# 7. ESTADO DE CARGUE AL SIGEVAS

Soporte Documental de Proyectos

2-2019-193 - AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE

+ Informes de Interventoría: <span style="float: right;">Resumen</span>									
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por					
INFORME MENSUAL # 6	05/06/2024	INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo					
PROGRAMACION DE OBRA	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo					
ENSAYOS	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo					
ENSAYOS CONTRATISTA OBRA	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo					
BITACORA	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo					
COMITE S TECNICOS	05/06/2024	ANEXOS INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo					
OFICIOS ENVIADOS	05/06/2024	ANEXOS INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo					
OFICIOS RECIBIDOS AGUAS DE SUCRE	05/06/2024	ANEXOS INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo					
SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo					
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo					
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo					
SEGUIMIENTO PLAN DE SST	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo					
SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo					
INFORME MENSUAL #5	07/05/2024	DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024		Alvaro Marino Marengo					
INFORME DETALLADO DE INTERVENTORIA abril2024	25/04/2024	INFORME DETALLADO DE INTERVENTORIA_abril2024		Alvaro Marino Marengo					

# 7. ESTADO DE CARGUE AL SIGEVAS

Soporte Documental de Proyectos

2-2019-193 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE

+ Otros Documentos Legales:							Resumen	
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por				
OTROSÍ No.02_Contrato de Obra	23/06/2024	OTROSÍ No.02_Contrato de Obra		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
OTROSÍ No.01_Contrato de Interventoría	23/06/2024	OTROSÍ No.01_Contrato de Interventoría		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
CTA ACLACIÓN A VEEDORES LUGAR POZO MATEO PEREZ	18/04/2024	Solicitada en Comite Social 3		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
CTA SOCIALIZACION PROYECTO MATEO PEREZ EN SEGOVIA	18/04/2024	Solicitada en Comite Social 3		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Presupuesto de Obra	17/04/2024	Propuesta ganadora		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Plan de inversión de Anticipo	11/04/2024	Plan de inversion anticipo Mateo perez		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Reprogramacion de obras	08/04/2024	Aprobada por Interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Flujo de caja reprogramacion	08/04/2024	Aprobada por interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Programacion Project	08/04/2024	Aprobada por interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Relacion de equipo y maquinaria minima	08/04/2024	Aprobado por Interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input type="checkbox"/>			
Programa de Adaptacion a la Guia Ambiental - PAGA	08/04/2024	Aprobado por la Interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Presupuesto PAGA	08/04/2024	Aprobado por Interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Plan de Calidad	08/04/2024	Aprobado por la Interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input type="checkbox"/>			
Plan de Manejo de Transito	08/04/2024	Aprobado por Interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			

# 7. ESTADO DE CARGUE AL SIGEVAS

Soporte Documental de Proyectos

2-2019-193 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE

+ Acta de Comité: <span style="float: right;"><a href="#">Resumen</a></span>									
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por					
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	24/06/2024			Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
Reunión extraordinaria	23/06/2024	Reunión extraordinaria		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMITE_11_11-06-2024	11/06/2024	COMITE_11_11-06-2024		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMITE_10_22-05-2024	22/05/2024	COMITE_10_22-05-2024		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMITE_6_12-03-2024	24/04/2024	COMITE_6_12-03-2024		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMITE_7_20-03-2024	24/04/2024	COMITE_7_20-03-2024		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMITE_8_8-04-2024	24/04/2024	COMITE_8_8-04-2024		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMITE_9_15-04-2024	24/04/2024	COMITE_9_15-04-2024		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMITE_5_09-02-2024	06/03/2024	COMITE_5_09-02-2024		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMITE_2_26-01-2024	13/02/2024	COMITE_2_26-01-2024		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMITE_3_31-01-2024	13/02/2024	COMITE_3_31-01-2024		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMITE_4_02-02-2024	13/02/2024	COMITE_4_02-02-2024		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMITE N°1	15/01/2024	COMITE N°1		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>				

# 7. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

1	Iniciar excavaciones para instalación de tubería en el sector de Mata de Caña	Contratista de obra	Hasta 17 de junio	Cumplido
2	Ajustar reprogramación y plan de contingencia al tiempo de prórroga aprobado	Contratista de obra	Hasta 17 de junio	Pendiente por entregar el plan de contingencia
3	Actualización de pólizas con novedad de prórroga	Contratista de obra e Interventoría	Hasta 21 de junio	La Interventoría ya radico las pólizas, están en revisión en la Entidad. El contratista de obra no ha radicado las pólizas
4	Socialización con la comunidad de Mata de Caña y Mateo Pérez para explicar los trabajos que se van a realizar en el tramo de placa huella	Contratista de obra, Interventoría, ADS, Comunidad	17 de junio	Cumplido

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-ADS-009-2023 CUYO OBJETO ES: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAYO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE**

# PORCENTAJE EJECUTADO Y PROGRAMADO, ACTIVIDADES DE OBRA A FECHA 11 DE JUNIO DE 2024

PORCENTAJE FISICO CON CORTE 20-06-2024		
COMPONENTE	PORCENTAJE FISICO PROGRAMADO (%)	PORCENTAJE FISICO EJECUTADO (%)
1. POZO PROFUNDO (PRELIMINARES)	100	66,67
2. PERFORACION POZO	100	2,08
3. EQUIPOS DE BOMBEO Y ACCESORIOS	100	0,00
4. CONTRUCCION DE CASSETAS	100	2,78
5. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	100	68,72
6. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 165 M3	48	0,00
7. PLANTA DE TRATAMIENTO	100	0,00
8. REDES DE DISTRIBUCION	87	31,41
9. SISTEMA ELECTRICO MEDIA Y BAJA TENSION	100	0,00

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 20-06-2024
17,17%

PORCENTAJE FISICO PROGRAMADO PARA EL 20-06-2024
91%

PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 20-06-2024
73,83%

## **a. ESTADO PRESUNTO INCUMPLIMIENTOS CON FECHAS DE AUDIENCIAS REALIZADAS Y PROGRAMADAS:**

- Se envió un informe desde la Subgerencia Técnica a Gerencia sobre el estado del proyecto y los posibles incumplimiento del contratista.
- Esta en revisión de Gerencia y este tomará las decisiones si abre o no el proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento.
- Aun no tenemos conocimiento de la revisión de Gerencia.

## **b. ALERTAS TÉCNICAS PROYECTO:**

- Nuevo Trazado y Replanteo de las redes de Distribución. ( El Contratista de obra, inició con las actividades de instalación de tubería de Distribución). superado

## **c. PLAN DE CONTINGENCIA, PERMISOS AMBIENTALES, ETC.**

- ENTREGADO POR LA INTERVENTORIA, A LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE, SEGUIMIENTO

## **PERMISOS AMBIENTALES:**

- Permiso de Aprovechamiento Forestal: YA SE CUENTA CON EL PERMISO.
- Permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas. YA SE CUENTA CON EL PERMISO.

# **INCOVENIENTES PRESENTADOS**

- **1. ORDEN PUBLICO, SUPERADO**
- **2. PERMISOS AMBIENTALES, SUPERADO**
- **3. INCONFORMISMOS CON LA COMUNIDAD, SUPERADO**

## ESTADO DE LAS PÒLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RCE, CONTRATO DE OBRA

Póliza de Cumplimiento N°75-44-101132935 Anexo 2, con acta de inicio	Aprobada mediante Resolución 166 de 2024.
Póliza de RCE, No 75-40-101049815, anexo 2, con Acta de inicio	Aprobada mediante Resolución 166 de 2024.
Póliza Todo Riesgo	Aprobada mediante Resolución 726 de 2023


## ESTADO DE LAS PÒLIZAS DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO DE INTERVENTORIA

Póliza de Cumplimiento N° CRC-100014850, Anexo 2, con Acta de inicio	Aprobada mediante Resolución 025 de 2024.
--	---

# CURVA "S"

## CURVA S DE EJECUCIÓN DE OBRA

Mes	% Programado	% Ejecutado
15/11/2023	0%	0,00%
15/12/2023	2%	2,17%
15/01/2024	5%	2,17%
15/02/2024	11%	2,17%
15/03/2024	20%	5,53%
15/04/2024	38%	7,32%
15/05/2024	62%	10,67%
28/05/2024	62%	16,40%
21/06/2024	91%	17,17%

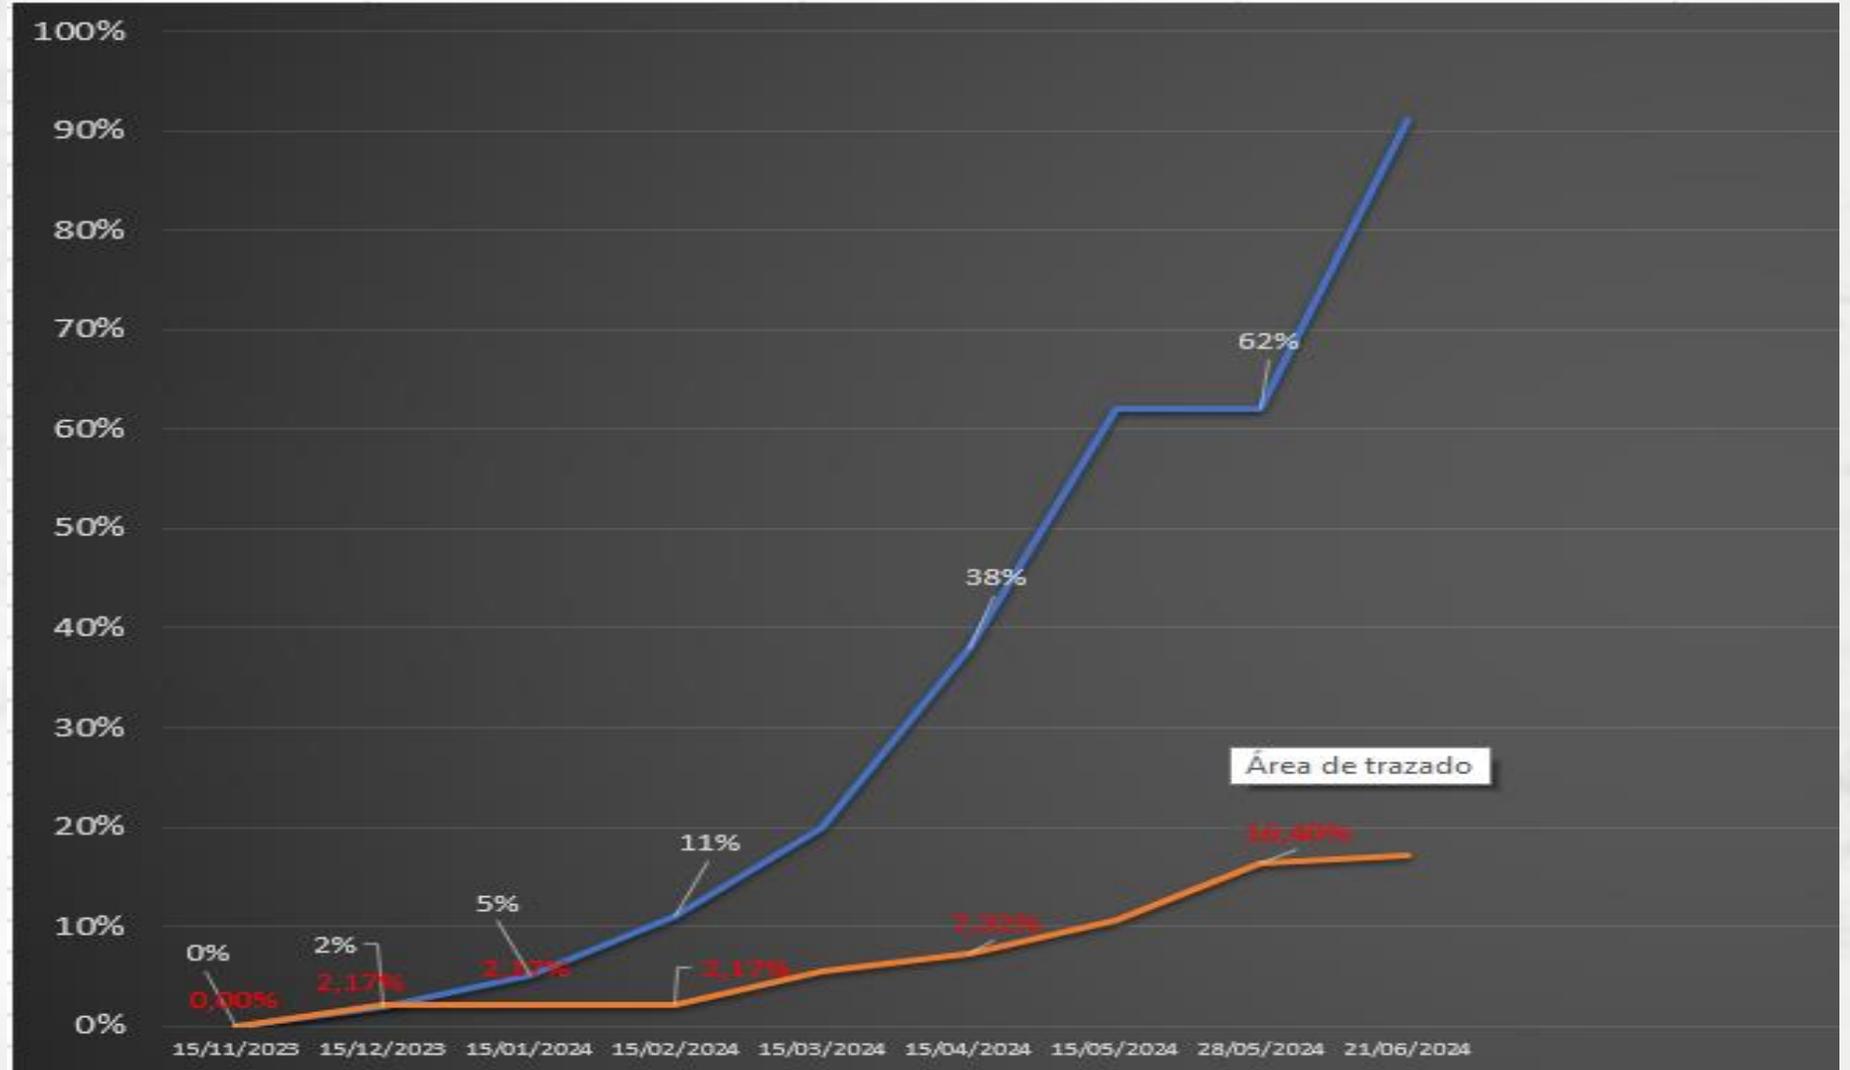

**ACTIVIDADES MES 7 DE EJECUCION**

**CAPITULO 1: PRELIMINARES PARA EVALUACION DE CANTIDAD Y CALIDAD DE POZO PROFUNDO SEV 02**

**ITEM 1,1,3** Perforación exploratoria de 6-1/2", de 0 a 120 M de profundidad



**CAPITULO 5: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA ALTURA TOTAL H=2.5M.**

**ITEM 5,4,1** CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 2 1/4 PULG, CAL 12, INCLUYE CONCERTINA DE SEGURIDAD DE 18 Y PINTURA H=2.5M.



**ITEM 8,1,2** EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN PARA INSTALACION DE TUBERIA

**CAPITULO 8: REDES DE DISTRIBUCION**

**ITEM 8,1,2 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN PARA INSTALACION DE TUBERIA**



**ITEM 8,1,3 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL COMUN PARA CIMENTACION**



**ITEM 8,1,3 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL COMUN PARA CIMENTACION**



7	<b>ITEM 8,1,5</b>	<b>RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO</b>
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34	<b>ITEM 8,5,1</b>	<b>INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA 2", RDE 26</b>
35	<b>ITEM 8,5,2</b>	<b>INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA 3", RDE 32,5</b>

7	<b>ITEM 8,5,1</b>	<b>INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA 2", RDE 26</b>
8	<b>ITEM 8,5,2</b>	<b>INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA 3", RDE 32,5</b>
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		



# MUCHAS GRACIAS

Síguenos en nuestra página web y redes sociales



@aguasdesucre



<https://aguasdesucre.com/>



Aguas de Sucre



@pdasucre
