

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO
EL CUR 1038 DE 2021**

DATOS GENERALES

FECHA:	2 de julio de 2024
HORA:	De 11:00 a.m. a 12:30 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams. PDA del Cesar y Municipio de Valledupar.
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB. Leonardo Zuleta Guerra – Gerente PDA del Cesar Anny Katherine Marroquín – Directora técnica PDA Cesar Wilson Fernández Rodríguez – Supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Layonel Arenas – Jefe de despacho secretaría de Obras públicas del municipio de Valledupar. Diana Acosta – Supervisora del proyecto por parte del municipio de Valledupar.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Municipio de Valledupar CUR 1038 de 2021 – Seguimiento a la ejecución del proyecto “Construcción del alcantarillado pluvial de Valledupar, Calle 7A y Calle 7B entre la Carrera 19 (Av. Simón Bolívar) y el río Guatapurí, adecuación y optimización de redes de acueducto y alcantarillado sanitario del corredor, en el Municipio de Valledupar”.

Temas por tratar:

1. Seguimiento a compromisos establecidos en el comité del 24 de mayo de 2024.
2. Avance de ejecución del proyecto.
3. Avances para la presentación de la reformulación del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

4. Varios.

DESARROLLO:


1. Seguimiento a compromisos establecidos en el comité del 24 de mayo de 2024:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Cumple SI / NO	Observación
1	Reprogramación proyecto, conforme al acta modificatoria Nro. 1 de fecha 26 de abril de 2024 para los contratos derivados de obra e interventoría.	PDA del Cesar.	30 de mayo de 2024	SI	Se remite el 29 de mayo de 2024.
2	Pólizas contractuales conforme acta modificatoria Nro. 1 a los contratos de obra e interventoría con resolución de aprobación del PDA del Cesar	PDA del Cesar.	27 de mayo de 2024	SI	Se remite por parte del ejecutor la aprobación de las pólizas el 2 de julio de 2024.
3	Alternativas de reformulación al proyecto.	PDA del Cesar.	4 de junio de 2024	NO	Se tienen los balances del proyecto, los cuales serán presentados al municipio el 3 de julio de 2024, según se informa en esta reunión por parte del PDA del Cesar.

2. Avance de ejecución del proyecto: Por parte del apoyo a la supervisión del Convenio 1038 de 2021 del MVCT, se solicita al ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P. el avance de ejecución Vs la reprogramación del proyecto conforme al acta modificatoria Nro. 1 de fecha 26 de abril de 2024, por medio de la cual se ampliaron los plazos a los contratos derivados de obra e interventoría en un tiempo de 8 meses.

El supervisor del proyecto por parte del ejecutor realiza la presentación de la curva "S" del proyecto, donde se evidencia la reprogramación del proyecto en color azul y lo ejecutado en color naranja, como se muestra en la siguiente imagen:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

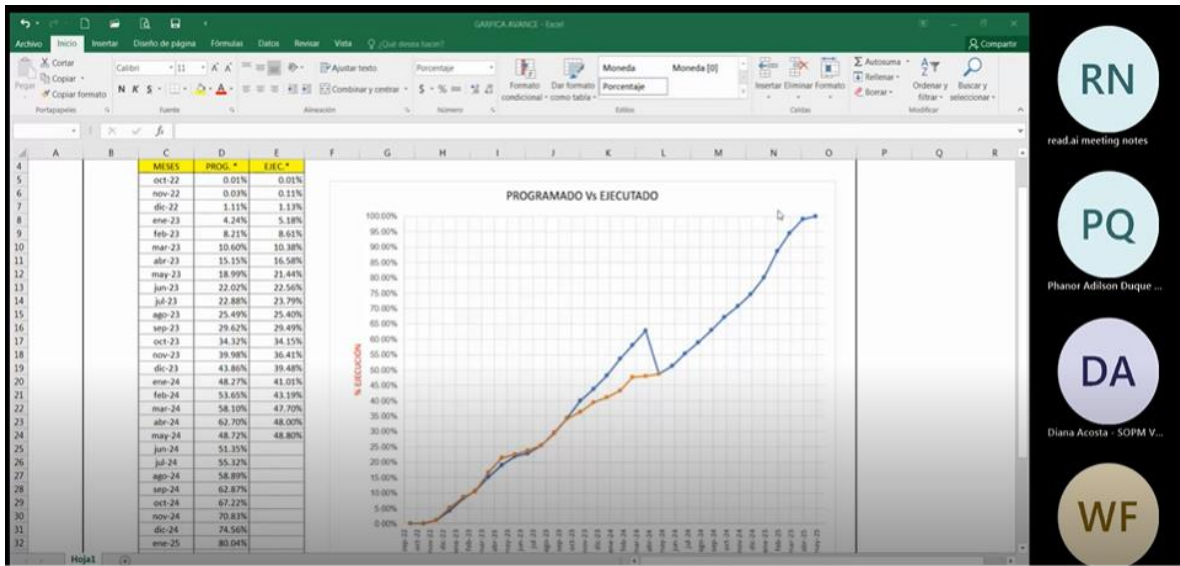

Conforme a la gráfica y a lo expuesto por el ejecutor en la plataforma SIGEVAS se tiene un programado al 21 de junio 2024 de 50,64% Vs un ejecutado a esa fecha del 48,83%, con lo cual se evidencia una variación negativa del 1,81% (atraso).

También se informa que dicha situación es debida a la complejidad que se presenta en la carrera 7 con calle 7A, donde se encontraron con unas tuberías de acueducto de diámetro 8" que no estaban en el catastro, por lo cual ha dificultado el trabajo en ese sector.

3. Avances para la presentación de la reformulación del proyecto: Se informó por parte del ejecutor Aguas del Cesar S.A. E.S.P., que conforme al trabajo conjunto desarrollado con los contratistas de obra e interventoría, ya se tiene el balance del proyecto, el cual será socializado y presentado al municipio de Valledupar el 3 de julio de 2024, para posteriormente realizar la justificación para la reformulación al proyecto, por parte del municipio y el ejecutor al MVCT.

Para ello se tiene el escenario donde se realiza el recorte al alcance del proyecto, ejecutando los recursos que se tienen asignados para este. También se solicita mostrar el escenario con la adición de recursos para cumplir con el alcance viabilizado del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Con base a lo expuesto por el supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. se procede a explicar el alcance del proyecto, según se muestra en el siguiente plano.



Línea de color verde, es lo ejecutado del proyecto a la fecha, la línea de color rojo lo que falta por ejecutar y hasta donde se lograría llegar con los recursos asignados al proyecto y la línea de color amarillo que es un tramo de la avenida Simón Bolívar (400 m que van en tubería GRP de 1,5 y 1,8 m de diámetro), sería el recorte del alcance del proyecto si no se logra la consecución de los recursos para la ejecución total del proyecto conforme a la viabilidad de este.

Por parte de la supervisión del municipio de Valledupar se pregunta por los trabajos con la tubería de acueducto que cruza por la carrera 9 y como será su intervención, el supervisor por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. informa que los trabajos a desarrollar en esa intersección con base a los perfiles topográficos es tratar de bajar el colector en unos 8 cm máximo, con el fin de no entrar a intervenir la tubería de acueducto existente, pero para ello se requiere de una cercha que sirva de soporte a la tubería mientras se desarrollan las actividades de excavación y construcción del box coulvert en ese sector. Posteriormente se instalaría un neopreno aislante entre el box y la tubería para evitar el roce entre las estructuras. Lo anterior con el fin de no suspender el servicio de acueducto y además por que la tubería existente es de 21" que no es comercial y al intervenir el acueducto se presentarían demoras en la consecución de los

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

materiales necesarios para su intervención, además que con lo que se proyecta en el sector se optimizan los recursos del proyecto.

Por parte del jefe de despacho de la secretaría de Obra Públicas, se pregunta por los tiempos que puede demorar la reformulación del proyecto, a lo cual por parte del apoyo a la supervisión del convenio del MVCT se le informa que teniendo todos los documentos y que no se requieran ajustes a los mismos, entre un mes y mes y medio. Por parte de la supervisión de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. informa que no ve tan optimista el tiempo que se toma la reformulación del proyecto, ya que por la experiencia en otros proyectos esta podría demorar más de dos meses.

Por parte del jefe de despacho de la secretaría de obras públicas del municipio de Valledupar se plantean varios escenarios para la consecución de recursos para la reformulación del proyecto, cumpliendo con el alcance de la viabilidad de este:

1. Una posibilidad es que los recursos faltantes los ponga el municipio.
2. Los suministre el Ministerio Vivienda Ciudad y Territorio.
3. En conjunto entre Municipio y MVCT.

Por parte del apoyo a la supervisión del convenio del MVCT, se informa que para apalancar recursos adicionales al proyecto de manera conjunta o a través del MVCT, se debe realizar la gestión entre las partes intervinientes a nivel gerencial.

4. Varios: El apoyo a la supervisión del convenio 1038 de 2021 del MVCT solicita al ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., conforme a lo solicitado por el municipio de Valledupar a través de la Secretaría de Obras Públicas el balance del proyecto cumpliendo con el alcance viabilizado del proyecto y realizando un parcheo en asfalto en la avenida Simón Bolívar.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Balance para la reformulación del proyecto, contemplando el alcance viabilizado y con reparcho en asfalto en la avenida Simón Bolívar.	PDA del Cesar.	12 de julio de 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Asistencia a la reunión virtual

Seguimiento al proyecto del CUR 1038 de 2021 Chat Archivos Detalles Asistente para progra... Resumen **Asistencia** Pizarra de reunión +2 [Unirse](#) [Cerrar](#)

martes, 2 de julio de 2024 11:00 a. m. - 12:22 p. m. [Descargar](#)

4 Asistieron	11:00 a. m. - 12:22 p. m. Hora de inicio y finalización	1h 21m 51s Duración de la reunión	1h 4m 56s Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	---	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
PQ Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	11:01 a. m.	12:22 p. m.	1h 21m 49s	Organizador
RN read.ai meeting ... (No comprobado)	11:02 a. m.	12:07 p. m.	1h 5m 6s	Moderador
WF wilson ferman... (No comprobado)	11:22 a. m.	12:22 p. m.	1h 12s	Moderador
DA Diana Acosta - SO... (No comprobado)	11:30 a. m.	12:22 p. m.	52m 38s	Moderador

Enlace de la reunión (grabación):

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v/g/person/paduque_minvivienda_gov_co/EYikW-wgsldKiPO2QYO8aZcBbiWAVUMIDnseMILAGwwsKA?e=CIGYhl&nav=eyJyZWZlc nJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJIYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbF ZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6 IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero
