



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ASISTENCIA TÉCNICA - 2 JULIO 2024 DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS ISLAS

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 2 de julio de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Plataforma Meets  El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Santiago Zuluaga</b>- Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT</li><li>➤ <b>Sebastián Rocha</b> – Supervisor Findeter</li><li>➤ <b>Luis Newball</b> - Apoyo Técnico Municipio</li><li>➤ <b>Ana Rico</b> – Operador P y K</li><li>➤ <b>Luis A. Rodríguez S.</b> - Director Obra – TECNOAGUAS</li><li>➤ <b>Pedro A. Castiblanco M.</b> - Director Interventoría - Consorcio Plan Maestro</li></ul>

### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Seguimiento proyecto plan maestro de acueducto en Providencia.
3. Cierre

### DESARROLLO:

1. Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes por parte del municipio y del MVCT.
2. Se procede a revisar cada uno de los proyectos así:

<b>Convenio 873/2021</b>	<b>"Obras Para La Terminación Del Plan Maestro De Acueducto De Providencia Y Santa Catalina Islas"</b>	
Ejecutor: Findeter	Fecha de terminación	28 de febrero de 2025



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Fecha de seguimiento	2/07/2024	<p>Se realiza el seguimiento al proyecto así:</p> <p>Avance físico ejecutado: 61.1%</p> <p>Avance físico programado: 70.7%</p> <p>Avance financiero: 48,9%</p> <p>La interventoría informa que el balance del presupuesto obedece a que en los sectores 2 y 3 se presenta la necesidad de incluir ítems no previstos al igual que se generan mayores y menores cantidades de obra.</p> <p>Estos ítems no previstos corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reposición de espacio público.</li><li>- Losetas en concreto de 40cm x 40cm.</li><li>- Construcción de bordillo en concreto.</li><li>- Pasos elevados en la red principal</li></ul> <p>En cuanto a mayores cantidades se presentan en andenes y excavaciones.</p> <p>Estas actividades se generan a raíz de que se ha encontrado material rocoso en las excavaciones; en el sector 2 existe un cárcamo que dificulta la normal ejecución de la excavación, deficiente conformación de los andenes existentes.</p> <p>Interventoría y contratista plantean dentro del balance eliminar ítems correspondientes a la optimización de la PTAP Agua Dulce, la cual fue intervenida anteriormente en el marco del convenio 1133-2021.</p> <p>Por parte del municipio y del operador PyK, se recomienda revisar detalladamente el presupuesto; en ese sentido, tanto municipio como operador remitirán sus observaciones al respecto.</p>
Observaciones MVCT	<p>El MVCT recomendó revisar detalladamente el presupuesto acogiendo lo manifestado por el municipio y el operador.</p> <p>Así mismo, el MVCT informó el proceso de reformulación en caso de requerirse debido a los ajustes técnicos del proyecto.</p>	


**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío del balance presupuestal.	Findeter	2-jul-2024
2	Observaciones al presupuesto	Municipio y Operador	10-jul-2024.

**CIERRE**

Siendo las 10:30 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

**FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams**

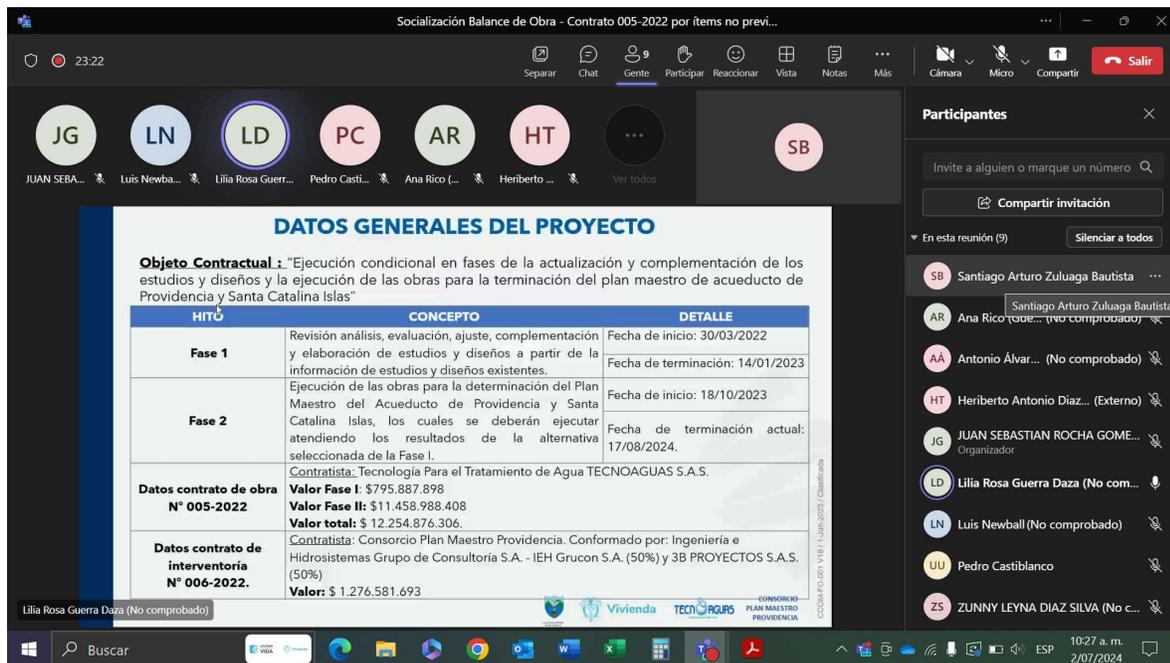

The screenshot shows a Teams meeting interface. The main content is a slide titled "DATOS GENERALES DEL PROYECTO" with the following text:

**Objeto Contractual:** "Ejecución condicional en fases de la actualización y complementación de los estudios y diseños y la ejecución de las obras para la terminación del plan maestro de acueducto de Providencia y Santa Catalina Islas"

HITO	CONCEPTO	DETALLE
Fase 1	Revisión análisis, evaluación, ajuste, complementación y elaboración de estudios y diseños a partir de la información de estudios y diseños existentes.	Fecha de inicio: 30/03/2022 Fecha de terminación: 14/01/2023
Fase 2	Ejecución de las obras para la determinación del Plan Maestro del Acueducto de Providencia y Santa Catalina Islas, los cuales se deberán ejecutar atendiendo los resultados de la alternativa seleccionada de la Fase I.	Fecha de inicio: 18/10/2023 Fecha de terminación actual: 17/08/2024.

**Datos contrato de obra N° 005-2022**  
 Contratista: Tecnología Para el Tratamiento de Agua TECNOAGUAS S.A.S.  
 Valor Fase I: \$795.887.898  
 Valor Fase II: \$11.458.988.408  
 Valor total: \$ 12.254.876.306.

**Datos contrato de interventoría N° 006-2022.**  
 Contratista: Consorcio Plan Maestro Providencia. Conformado por: Ingeniería e Hidrosistemas Grupo de Consultoría S.A. - IEH Grucon S.A. (50%) y 3B PROYECTOS S.A.S. (50%)  
 Valor: \$ 1.276.581.693

The participants list on the right includes: SB Santiago Arturo Zuluaga Bautista, AR Ana Rico, AA Antonio Álvar, HT Heriberto Antonio Diaz, JG JUAN SEBASTIAN ROCHA GOMEZ (Organizador), LD Lilia Rosa Guerra Daza (No comprobado), LN Luis Newball (No comprobado), UU Pedro Castiblanco, and ZS ZUNNY LEYNA DIAZ SILVA (No c...).

Anexos: (Opcional)

Elaboró:  
 Revisó:  
 Fecha:
