



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 25 DE JULIO DE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	25 de julio de 2024
HORA:	De 8:00 am a 9:00am
LUGAR:	<b>Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Magda Atehortua - Ing. Supervisión FINDETER Fernanda Villegas – Auxiliar de Obra Grupo More Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz - Grupo MORE Oscar Aranda - Contratista Obra Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Obra Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría INTER JCD Juan Carlos Tello - Contratista Interventoría INTER JCD Luisa González - Contratista Interventoría INTER JCD Mario Triana – SST Interventoría Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Olaya Larrahondo - Emquilichao E.S.P
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

El día Jueves 25 de julio de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Informe de avance del contrato de obra PAT-ATF-O-043-2023
4. Compromisos
5. Eventualidades

### DESARROLLO:

La Ingeniera Soto realiza la presentación del avance de obra mediante la proyección simultánea de diapositivas, en lo cual se evidencia en el periodo semanal comprendido



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

entre el 15 al 21 de julio, los porcentajes de avance de obra corresponde a los siguientes:

1. Porcentaje de obra programada para la tercera semana del mes de junio es del 54.80%.
2. Porcentaje de obra ejecutado y aprobado por la Interventoría es de 56.81%, con lo cual, se tiene un adelanto de 2.01%.

Las actividades que se están ejecutando actualmente en obra, son:

1. En la estructura del tanque de almacenamiento, se finiquitó el desencofrado de los muros de la estructura, así como, el retiro de formaleta de los cuatros (4) columnas internas que se fundieron el día 15 de julio. La Interventoría en cumplimiento a la supervisión y verificación en los procesos constructivos de las estructuras que componen el proyecto, evidencia un buen acabado superficial de las paredes de la estructura, además que no se observa exposición de aceros.
2. En la estructura del tanque de cloración, se observa la fundición de la losa de fondo de contrapiso de la estructura, además de la instalación de los aceros verticales correspondientes a los muros del tanque.
3. Con respecto a la estructura de tanque de filtros, se continuó con la instalación de los aceros horizontales, verticales y de fisuramiento en todo el perímetro del tanque, así como, en las divisiones interiores.
4. En la estructura del tanque de sedimentador, ya se encuentra culminada la instalación de los aceros longitudinales y transversales de la parrilla doble de fondo, así mismo, se observa la implementación de elementos conocidos como burritos para garantizar el adecuado soporte entre las parrillas. Por otro lado, se aprecia la instalación de la formaleta en madera para realizar el proceso de fundición de la losa de fondo.
5. En la estructura referente a las casetas, oficina y sala de juntas que componen la PTAP, en la semana se culminó la viga de cimentación y se encuentran realizado el proceso de curado del elemento.
6. Seguidamente, en el lecho de secado se encuentran realizando la instalación de la formaleta en los muros de la estructura, así como, la colocación de los tensores y puntales para sujetar el sistema de encofrado y garantizar un buen proceso de fundición.
7. En el componente de seguridad y salud en el trabajo, se realiza seguimiento y verificación afiliaciones a la seguridad social de cada uno de los trabajadores, así

como, del personal nuevo en obra. Por otra parte, se evidencia que todas las estructuras se encuentran debidamente señalizadas, así mismo, se refuerza el cerramiento provisional en lona verde. Adicionalmente a esto, se evidenció que durante el recorrido realizado con el comité de sostenibilidad el día 19 de julio por los frentes de trabajo en obra, el personal visitante hizo uso de los elementos de protección personal para asegurar su integridad física en obra.

8. Por otra parte, el contratista de obra se encuentra realizando la siembra y riego de pasto estrella para estabilización de taludes, principalmente en el lugar colindante a la estructura del lecho de secado. Además, que se retiró el material contaminado que se encontraba en el sitio en mención.

9. Durante la semana no se presentaron incidentes y/o accidentes en obra.

10. En cuanto al componente social, el día 19 de julio se realiza el cuarto comité de sostenibilidad además de recorrido con sus miembros activos por los frentes de trabajo, para verificación de avance físico. Por otra parte, el 20 de julio se recibió a los entes del proyecto invitación y presentación de socialización de avance del 50% además de coordinar la logística del evento. Sumado a esto, se hace entrega de respuesta formal escrita por parte del abogado Jurídico del contratista de obra y la consultoría al sr. Ángel García quien manifestó que sufrió un accidente en la parte externa de la obra, en dicho oficio se le expresan las inconsistencias encontradas en el estudio del caso, además que esta persona reporta el suceso 52 días después de lo sucedido. Posteriormente, se continuó con las actividades motivacionales referentes a la celebración de los cumpleaños en el mes de julio.


11. Es pertinente que, se realice la instalación de la valla informativa de obra, debido a que, no se ha realizado hasta la fecha.

12. La Ingeniera Magda Viviana Atehortúa será la encargada de dirigir el comité y realizar el respectivo seguimiento del proyecto, debido a que el Ingeniero Paredes está en período vacacional hasta el 20 de agosto del presente año.

### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realización de socialización del 50% de avance de obra en la biblioteca Municipal de Santander de Quilichao	Contratista de obra e interventoría	30/07/2024

**FIRMAS:**

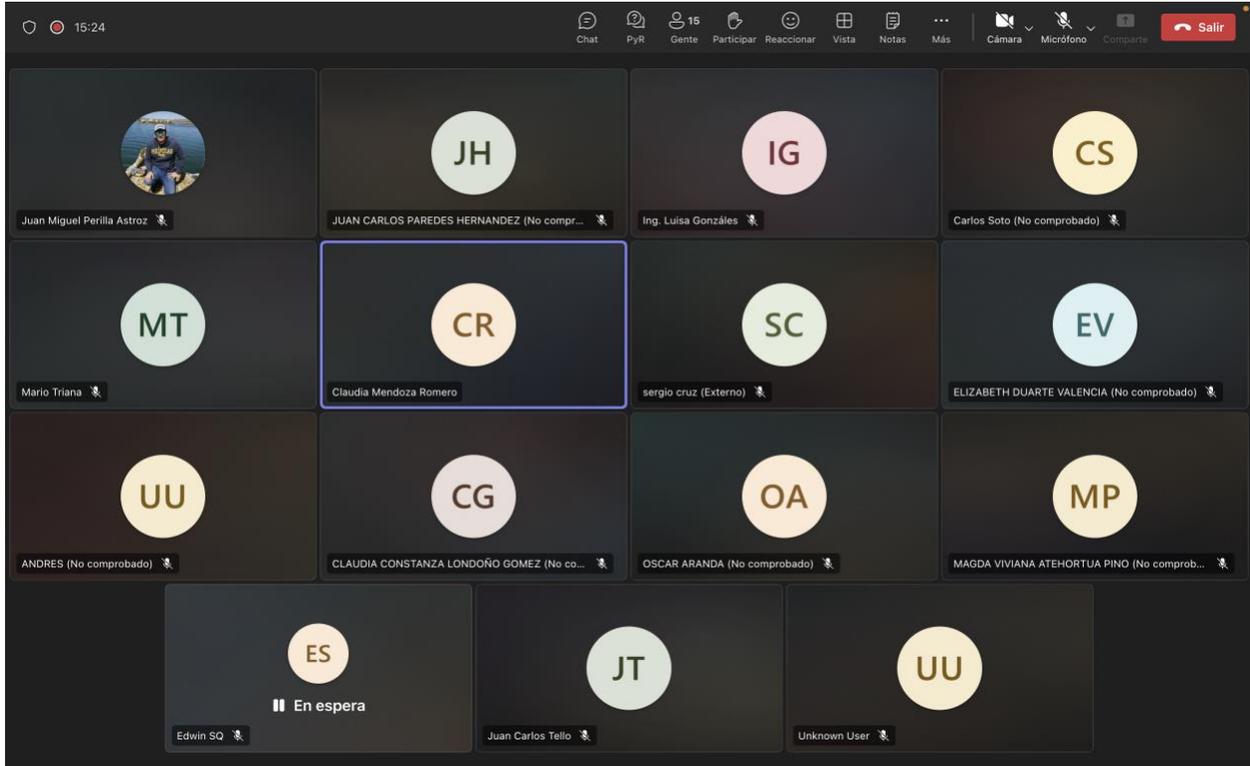


**CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA QUITAPEPERA**

<b>NOMBRE</b>	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEPERA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHACO	
<b>TIEMPO</b>	Fecha Inicio: 15/11/2023 Suspensión: 10/01/2024 Reinicio: 11/03/2024 Fecha Terminación: 30/10/2024	TIEMPO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA: 11 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO  TIEMPO EJECUCIÓN DE OBRA: 9 MESES Y 15 DÍAS
<b>ALCANCE PROYECTO</b>	<b>FASE 1</b> Revisión, Ajustes y complementos a diseños de los diseños. - Firma acta de reinicio -Preliminares -Localización y replanteo -Cerramientos	<b>FASE 2</b> • Armado e instalación de aceros en tanques de : cloración, filtros y sedimentador. • Fundición de losa de fondo de tanque de cloración y muros del tanque de almacenamiento. • Cerramiento Perimetral: viga reforzada, muro en mampostería, tubería galvanizada, malla eslabonada, altagia, alambre de púas, concertina. • Encofrado de muros del tanque de lecho de secado. • Fundición de cimiento ciclópeo y viga de cimentación en casetas y oficinas. • Instalación de pasamuros tanque de almacenamiento.
<b>ESTADO</b>	En ejecución	
<b>\$</b>	Obra: \$5.095.522.812,10 Interventoría: \$456.120.265,00	
<b>AVANCES</b>	Porcentaje Programado = <b>54,80 %</b> Porcentaje Ejecutado = <b>56,81 %</b> Avance de: <b>2,01%</b> (Adelanto). Valor pagado Obra: \$ 1.131.917,889,49 Acta parcial No. 001 (Acta pagada)	
<b>OBSERVACIONES ESTADO</b>	Proyecto actualmente en ejecución.	
