



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 14

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 05 de agosto de 2024
HORA:	De 08:00 a 09:00 horas
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Sair Giraldo – Secretaría de Planeación Municipal Ana Lucia López – Apoyo técnico Sría. Planeación Municipal Jorge Moreno – Rep. Legal contratista de obra Vivian Beltran – Consorcio contratista Andres Mora – Rep. Legal interventoría Miguel Sánchez – Ing. Residente de interventoría Sayda Montes – Supervisora CUR 639-2019 Angela Cuadros - Abogado contratista DIDE Oscar Cano – Ing. Apoyo a la supervisión Subdirección Proy.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Reunión de Seguimiento a la terminación del proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS.

DESARROLLO:

Se inició la reunión por parte del MVCT, indicando a los asistentes sobre el seguimiento a los temas tratados en comités anteriores, empezando con lo relacionado con las pólizas del contrato de obra, situación que fue informada en el comité pasado a este ministerio y que a la fecha está generando el incumplimiento por parte del contratista de obra. Al respecto indicó el municipio que a la fecha no se ha tenido respuesta del Consorcio Construyendo Progreso para subsanar esta obligación contractual.

Al respecto, el contratista de obra informó que el inconveniente que se presenta con la expedición de la actualización de las pólizas obedece a que uno de los consorciados tiene una deuda con la compañía Seguros del Estado, deuda que corresponde a otro consorcio de otro proyecto. Frente a esta situación dicho consorciado emitió comunicado con fecha 31 de julio de 2024, dirigido a la compañía de seguros, indicando que reconoce la deuda y se compromete a pagar lo adeudado en un término

de quince (15) días, por lo que desde el Consorcio Construyendo Progreso se solicita al municipio dar este plazo para subsanar la actualización de las pólizas.

Respecto a los equipos de bombeo informó el contratista que entre el 10 y 11 de agosto de 2024 se espera la llegada de las dos bombas a la ciudad de Leticia, con lo cual se podrá iniciar su instalación. En tal sentido, el contratista solicitó a las partes intervinientes del proyecto otorgar este plazo adicional teniendo en cuenta el compromiso que se tiene para finalizar las actividades del proyecto.

Por parte del municipio se indicó que frente a esta situación no existe otro camino que iniciar un proceso de presunto incumplimiento debido a que es una obligación contractual del Consorcio.

De otra parte, el MVCT solicitó al Municipio informar sobre la entrega de la documentación acordada (programación de obra ajustada y cronograma de gestiones administrativas para la terminación y recibo de las obras), así mismo, el 26 de julio de 2024 se remitió oficio con radicado No. 2024EE0055476, solicitando analizar la situación actual del proyecto, los tiempos de terminación de las actividades faltantes por ejecutar, con el fin de determinar la necesidad de prorrogar o no el convenio interadministrativo de uso de recursos No. 639 de 2019, de lo cual no se ha tenido respuesta a la fecha, lo que resulta nuevamente preocupante por la proximidad en la terminación del plazo de ejecución contractual. Frente a esta solicitud se solicita al municipio que dicha información sea entregada el 05 de agosto de 2024.

Con respecto a los recorridos de verificación a las obras ejecutadas por parte del municipio, USPL e interventoría, se indicó por parte del municipio que aún no se han realizado los recorridos debido a que aún se están terminando algunas actividades, lo cual se reportará en la documentación a presentar.


Por lo anterior, el MVCT solicita al municipio revisar la situación que se presenta y pronunciarse de manera urgente para adelantar las gestiones administrativas a que haya lugar.

Se pactan los siguientes compromisos y se da por terminada la presente reunión.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de documentos acordados y análisis sobre la situación del proyecto.	Municipio de Leticia	05-ago-2024
2	Respuesta a oficios del MVCT y análisis de situación del proyecto.	Municipio de Leticia	05-ago-2024

FIRMAS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIhMWVmNmUtMzY3YS00M2I0LWI5NzMtOTU5ZjI2N2ExMmU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d

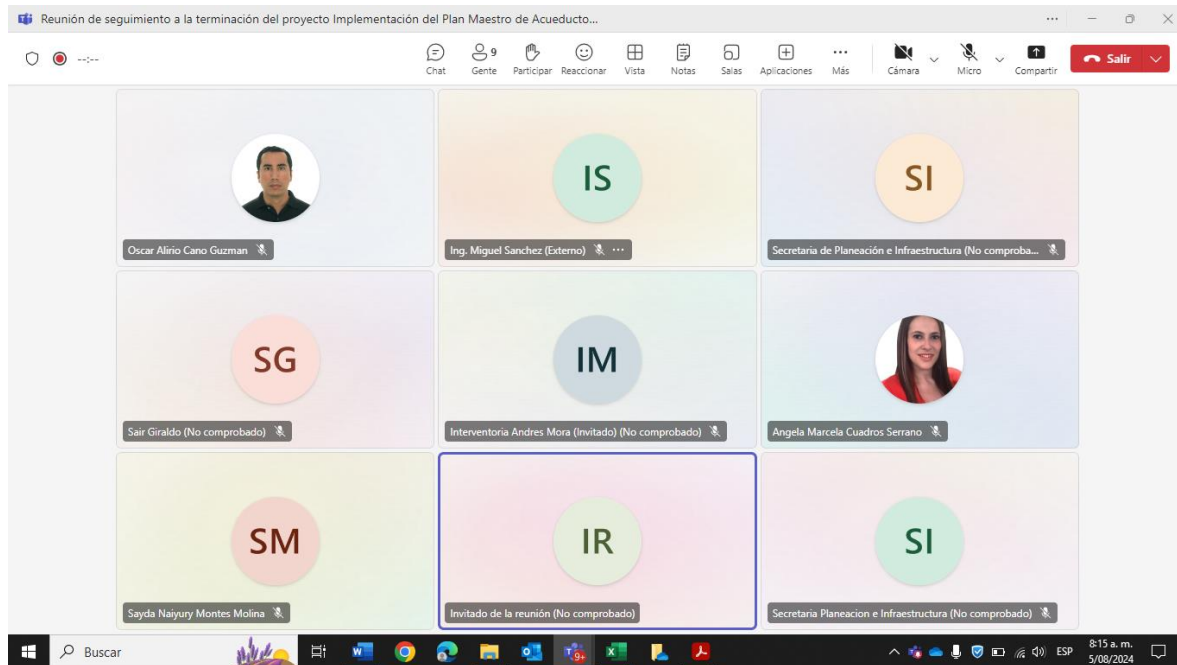



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Búsqueda (Ctrl+E)

Reunión de seguimiento a la terminación del proyecto Im... Chat Archivos Detalles Asistencia +5

Unirse Cerrar

lunes, 5 de agosto de 2024 7:58 a. m. - 9:10 a. m.

Descargar

11
Asistieron

7:58 a. m. - 9:10 a. m.
Hora de inicio y finalización

1h 12m 4s
Duración de la reunión

31m 17s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Oscar Alirio Cano Guzman OCano@minvivienda.gov.co	7:58 a. m.	8:44 a. m.	45m 17s	Organizador
 Angela Marcela Cuadros Serrano ACuadros@minvivienda.gov.co	8:01 a. m.	8:43 a. m.	40m 48s	Moderador
 IS Ing. Miguel Sanchez	8:02 a. m.	9:10 a. m.	1h 8m 46s	Moderador
 SI Secretaria de Plan... (No comprobado)	8:07 a. m.	8:44 a. m.	36m 54s	Moderador
 SG Sair Giraldo (No comprobado)	8:08 a. m.	8:44 a. m.	35m 18s	Moderador
 IM Interventoria Andr... (No comprobado)	8:10 a. m.	8:43 a. m.	33m 49s	Moderador
 SM Sayda Naiyury Montes Molina SMontes@minvivienda.gov.co	8:11 a. m.	8:43 a. m.	32m 34s	Moderador
 T teamsvisitor:255cc... (No comprobado)	8:12 a. m.	8:43 a. m.	31m 26s	Moderador
 SI Secretaria Planeac... (No comprobado)	8:14 a. m.	8:15 a. m.	32s	Moderador
 SN SIRLEY GUTIERREZ NAVARRO	8:18 a. m.	8:44 a. m.	18m 44s	Moderador
 SG Sirley Gutiérrez (No comprobado)	8:20 a. m.	8:20 a. m.	2s	Moderador

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Sayda Montes
Fecha: 05-ago-2024
