

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 20240814

PROYECTOS:

- OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ
- CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
- AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS –SUCRE
- AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAYO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE

DATOS GENERALES

FECHA:	14-08-2024
HORA:	9:00 a.m.
LUGAR:	Plataforma TEAMS
ASISTENTES	Por parte de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.: Ing. Andrés Rhenals– Apoyo a la supervisión Ing. Jhony Garay – Apoyo a la supervisión Ing. Ángel Martínez Gómez – Apoyo a la supervisión Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT: Arq. Martha Romero – Apoyo a la supervisión.

ORDEN DEL DIA:

1. AVANCES DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS – SUCRE

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. AVANCES PROYECTO ACUEDUCTO CAYO DE LA CRUZ - SAN MARCOS.
3. AVANCES CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
4. AVANCES PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ

DESARROLLO:

1. SAMPUES: El ingeniero Ángel Martínez hace la claridad que las actividades en los diferentes frentes de obra están suspendidas por temas de orden público, y que desde la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. se han llevado a cabo diferentes acciones con respecto a esta situación, tratando de salvaguardar la vida de las personas que se encuentran en el sitio de la obra. Se ha informado a la Gobernación de Sucre, Alcalde del Municipio de Sampués y policía tanto departamental como municipal de los acontecimientos presentados.
 - La arquitecta Martha Romero, en representación del Ministerio de Vivienda, Ciudad Y territorio tiene la inquietud con respecto al tema jurídico relacionado con la suspensión o finalización del contrato de obra. La supervisión da a conocer que la Entidad está analizando la situación, convocando a un comité técnico con las autoridades competentes tanto departamentales como municipales para proceder de la mejor manera ante la situación de orden público.
 - El ingeniero Ángel Martínez expone los porcentajes reportados por la interventoría a fecha de corte del día 11 de agosto de 2024, en donde se tiene un avance físico de 34%, frente a un reprogramado de 97.34%, teniéndose de esta manera un atraso de 63.34%.
 - La supervisión manifiesta que el avance financiero del proyecto es del 0%, ya que no se han realizado desembolsos de actas parciales, únicamente se ha desembolsado el anticipo.
 - Las actividades de obra actual son:
 - Pozo profundo: 20.48%
 - Caseta de bombeo: 0.21%
 - Cerramiento Pozo: 0.39%

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- Descarga de tubería de pozo: 0%
 - Sistema eléctrico pozo: 0%
 - Línea de conducción: 57.74%
 - Sistema de tratamiento: 0%
 - Instalaciones eléctricas caseta de cloración: 0%
 - Tanque elevado: 31.76%
 - Redes de distribución: 0.95%
- Con respecto al Proceso Administrativo Sancionatorio llevado en contra del Contratista de Obra, la supervisión de ADS expresa que el día 6 de agosto de 2024 se realizó audiencia oral concentrada a las 3:00 p.m., en donde se tuvieron alegatos de conclusión, donde se suspendió la audiencia para revisar lo expresado por el apoderado del Contratista de obra. Se reanudará la audiencia para el día 14 de agosto de 2024.
- Las actividades realizadas por el contratista de obra en la semana antes de la paralización de las actividades de obra, lo cual se presentó el 26 de julio de 2024, por temas de orden público son: perforación exploratoria del pozo a una profundidad de 138 metros, en la línea de conducción se llevan instalados 3370 metros lineales de tubería, con respecto a 7132 metros totales, y en el frente del tanque se están realizando trabajos en el cuarto nivel.
- MVCT solicita a ADS certificación aprobación pólizas, correspondientes a los contratistas derivados.
2. SAN MARCOS: El ingeniero Andrés Rhenals manifiesta que el proyecto está suspendido contractualmente desde el día 8 de agosto de 2024, debido a que no se tenía el otrosí del convenio aprobado respecto a la firma del alcalde para la prórroga del convenio, ya se encuentra el documento en el despacho del alcalde.
- El avance físico del proyecto es del 33.50%, frente a un programado de 98%, generándose de esta manera un atraso de 64.50%.
- La supervisión manifiesta que el avance financiero del proyecto es del 0%, ya que no se han realizado desembolsos de actas parciales, únicamente se ha desembolsado el anticipo.
- Las actividades de obra actual son:
- Pozo profundo (preliminares): 90.38%

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- Perforación pozo: 64.60%
 - Equipos de bombeo y accesorios: 0%
 - Construcción de casetas: 22.73%
 - Construcción de cerramiento: 83.98%
 - Tanque de almacenamiento de 165 m3: 15.47%
 - Planta de tratamiento: 0%
 - Redes de distribución: 44.24%
 - Sistema eléctrico media y baja tensión: 0%
 - Instalación de baja tensión: 0.95%
- De acuerdo al Proceso Administrativo Sancionatorio, la supervisión expresa que el día 23 de julio de 2024 se envió comunicado mediante el cual se cita a una audiencia concentrada en dicho proceso, para el día 29 de julio. La audiencia del día 29 de julio de 2024 no se pudo llevar a cabo por problemas de conexión del internet, por ende, el día 01 de agosto de 2024 se envió comunicado mediante el cual se informa la reprogramación de la audiencia oral para el día 06 de agosto de 2024. El día 06 de agosto de 2024 se da inicio al proceso y se ordenó la práctica de pruebas, con un tiempo aproximado de 15 días para reiniciar la audiencia.
- EL MVCT solicita aclarar a Aguas de Sucre, con relación que, hasta el 6 de agosto de 2024 ADS adelantó e inicio el proceso de presunto incumplimiento al contratista de obra, ya que esta solicitud se había realizado en varios solicitudes y comités de seguimiento del proyecto, donde se pregunta porque la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. demora tanto tiempo para iniciar el Proceso Administrativo Sancionatorio. El ingeniero Jhony Garay manifiesta que la Subgerencia Técnica de la entidad entrego a la Gerencia el informe de presunto incumplimiento, pero esta es autónoma y decide cuando le abre proceso al contratista.
3. SAN BENITO: El avance físico del proyecto a fecha de corte 14 de agosto de 2024 es 58%, frente a un reprogramado de 99%, teniéndose de esta manera un atraso de 41%.
- Las actividades de obra actual son:
- Preliminares: 89.12%
 - Excavaciones y rellenos: 35.98%
 - Redes colectores suministros: 10.75%
 - Redes colectores instalación: 3.19%

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- Conexiones domiciliarias: 3.91%
 - Cámara de caída: 0%
 - Cámaras de inspección: 2.73%
- Estado presunto incumplimiento: De acuerdo con el contrato de consultoría, se realizó visita técnico jurídica el día 26 de junio de 2024 y el día 4 de julio de 2024 se desarrolló audiencia de pruebas orales con la directora de interventoría, se procederá si es el caso a la tasación de multa para notificar al contratista, se realizó actualización de informe de presunto incumplimiento por parte de la Supervisión correspondiente al periodo del 15 de noviembre de 2023 al 23 de julio de 2024, se está a la espera de programación de fecha para audiencia para fallo definitivo.
- Referente al contrato de obra, se realizó visita de práctica de pruebas el día 2 de agosto de 2024 y se revisó si se implementa el plan de choque y sus frentes de obras (5 máquinas realizando excavaciones, suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario, construcción de acometidas domiciliarias y pozos de inspección). MVCT solicita informar las fechas exactas y las conclusiones de las audiencias de presunto incumplimiento.
- En cuanto al plan de contingencia, se han adoptado horarios de trabajo de 6:00 A.M. a 5:00 P.M., dedicada a las actividades de suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario, construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias, incluyendo registros. Estas actividades se ejecutan en paralelo con cinco equipos de excavación mecánica. Cada cuadrilla está compuesta por 11 personas, incluyendo oficiales y ayudantes, y actualmente hay cinco frentes de obra activos.
4. SINCE: El avance físico del proyecto a fecha de corte 13 de agosto de 2024 es 29.99%, frente a un reprogramado de 36.48%, teniéndose de esta manera un atraso de 6.49%.
- Las actividades de obra actual son:
- Localización, nivelación y replanteo: 100%
 - Excavaciones: 31.05%
 - Relleno y compactación bases de pavimento: 37.66%
 - Instalación de tubería alcantarillado sanitario: 27.42%
 - Construcción de cámaras de inspección: 31.82%
 - Estructuras complementarias: 13.49%
 - Suministro de tubería alcantarillado sanitario: 28.65%

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- En cuanto al plan de contingencia, se ha adoptado horario de trabajo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m, dedicadas a las actividades de suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario, construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias, incluyendo registros. Estas actividades se ejecutan en paralelo con dos equipos de excavación mecánica. Cada cuadrilla está compuesta por 7 personas, incluyendo oficiales y ayudantes, y actualmente hay cuatro frentes de obra activos.


Finalmente, el MVCT solicita como ejecutor a Aguas de Sucre reportar el cumplimiento de los cuatro proyectos a cargo, con relación a los cronogramas de obra aprobados, cumplimiento de la implementación de los planes de contingencia, reporte y análisis de las actividades de obra, actualización documentación, informes de supervisión e informes de interventoría para el cargue correspondiente en SIGEVAS, reporte del estado y conclusión de los procesos de presunto incumplimiento de los proyectos Sampués, San Benito y San Marcos.

Nota: Como soporte para cada comité de seguimiento, se ha solicitado a Aguas de Sucre una presentación con el estado de cada uno de los proyectos bajo su supervisión, la cual complementa y hace parte de la presente acta de comité.

FIRMAS EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.



Ing. Jhony Garay
Apoyo a la Supervisión




Ing. Ángel Martínez Gómez
Apoyo a la Supervisión



Andrés Rhenals
Apoyo a la Supervisión

FIRMAS MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT:



Arq. Martha H. Romero
Apoyo a la Supervisión

COMITÉ SEGUIMIENTO PDA Y MVCT 14 AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-ADS-009-2023
Cuyo objeto es: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE
CAYO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE

GENERALIDADES Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

GENERALIDADES	
CONTRATO	No. LP-ADS-009-2023
OBJETO	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAYO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO DEL CAYO R/L BETTY GRACIELA CASTRO ESCORCIA
VALOR INICIAL	\$3.739.002.271,00 M/CTE
PLAZO	8 MESES
FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION	12 DE AGOSTO DE 2024
AVANCE TEMPORAL (20-03-2024)	259 DÍAS (96,64%)

PORCENTAJE EJECUTADO Y PROGRAMADO, ACTIVIDADES DE OBRA A FECHA 10 DE JULIO DE 2024

PORCENTAJE FISICO CON CORTE 08-08-2024		
COMPONENTE	PORCENTAJE FISICO PROGRAMADO (%)	PORCENTAJE FISICO EJECUTADO (%)
1. POZO PROFUNDO (PRELIMINARES)	100	90.38
2. PERFORACION POZO	100	64.60
3. EQUIPOS DE BOMBEO Y ACCESORIOS	100	0.00
4. CONTRUCCION DE CASETAS	18	22.73
5. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	100	83.98
6. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 165 M3	5	15.47
7. PLANTA DE TRATAMIENTO	13	0.00
8. REDES DE DISTRIBUCION	72	44.24
9. SISTEMA ELECTRICO MEDIA Y BAJA TENSION	0	0.00
10. INSTALACIONES DE BAJA TENSION	0	0.00

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 08-08-2024
33.50%

PORCENTAJE FISICO PROGRAMADO PARA EL 08-08-2024
98%

PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 08-08-2024
64.50%

ALERTAS DEL PROYECTO

a. ESTADO PRESUNTO INCUMPLIMIENTOS CON FECHAS DE AUDIENCIAS REALIZADAS Y PROGRAMADAS:

- El día 23 de julio de 2024 se envió comunicado G100-897-2024 mediante el cual se cita a una audiencia oral concentrada en el Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual, Contrato de Obra No. LP-ADS-009-2024, para el día 29 de julio del 2024 a las 03:00 p.m.
- El día 01 de agosto de 2024 se envió comunicado G100-941-2024 mediante el cual se reprograma la audiencia oral concentrada del Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual, Contrato de Obra No. LP-ADS-009-2024, para el día 06 de agosto del 2024 a las 10:00 a.m.

b. ALERTAS TÉCNICAS PROYECTO:

- Nuevo Trazado y Redes tubería de planteo de las redes de Distribución. (El Contratista de obra, inició con las actividades de instalación Distribución). **Superado, NO GENERÓ ADICION PRESUPUESTAL.**

c. PLAN DE CONTINGENCIA, PERMISOS AMBIENTALES, ETC.

- ENTREGADO POR LA INTERVENTORIA, A LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE, SEGUIMIENTO, **Aprobado por interventoría de obra mediante comunicado OF-039 R 1312 19/06/2024, avance de obra 33.50% con respecto a programado de 98.00%, se enviara comunicado a la interventoría solicitando rendimiento de obra en el tiempo ejecutado hasta la fecha de suscripción de la suspensión.**

PERMISOS AMBIENTALES:

- Permiso de Aprovechamiento Forestal: **Superado, mediante RESOLUCIÓN N° 239, 07/06/2024.**
- Permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas. **Superado, mediante RESOLUCIÓN N° 225, 24/05/2024.**

- El PAC N°1 se enviara como fecha máxima 26 de agosto de 2024.

CUR	SALDO EN FIDUCIA (CON RENDIMIENTOS) A MAYO DE 2024	SALDO NETO DISPONIBLE (SIN RENDIMIENTOS NI GMF NI RETEFUENTE) A MAYO DE 2024	AVANCE FISICO DEL VEINTE (20%), VALOR Y PERIODO	FECHA ESTIMADA DE PAGO	NUEVO SALDO EN FIDUCIA	RECURSOS POR SOLICITAR (3ER TRIMESTRE/2024) ACLARAR/REVISAR PORCENTAJE A SOLICITAR (30%)
CUR 1386	\$92,675,591.10	\$103.210,503.95	\$809,584,181.60	10/09/2024	\$ 195,886,095.05	\$1,214,376,272.40

- Se envía comunicado G100-895-2024 22/07/2024 solicitando cuenta de cobro a la alcaldía de San Marcos para PAC N°1 en el mes de julio 2024.
- Se envía comunicado G100-906-2024 24/07/2024 reiterando cuenta de cobro a la alcaldía de San Marcos para PAC N°1 en el mes de julio 2024.
- Se envía comunicado G100-915-2024 29/07/2024 a MVCT sobre seguimiento solicitud cuenta de cobro PAC N°1 en el mes de julio 2024.
- Se envía comunicado G100-970-2024 12/08/2024 a MVCT solicitando cuenta de cobro a la alcaldía de San Marcos para PAC N°1 en el mes de agosto 2024.

- COMPONENTE TÉCNICO, este componente encontramos los diseños, los equipos de topografía, maquinaria, herramientas y materiales que se requieran para la construcción del alcantarillado. Se trabajarán en 3 frentes de trabajo destinados enfocadas en las siguientes actividades: 1) Suministro e instalación de redes 2) Construcción de tanque elevado 3) Perforación de pozo y cerramiento perimetral

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN RESTANTE	UND	CANT	RENDIMIENTO	MATERIAL	EQUIPO	M de O
TOTAL TIEMPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PRELIMINARES PARA EVALUACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE POZO PROFUNDO SEV. 02	160 DIAS				N/A	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA INICIAL (LABORATORIO)	CUADRILLA POZO PROFUNDO
	49 DIAS	ML	120	2.45 ML/DIA	N/A	COMPRESOR PARA DETERMINAR LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE EQUIPO BOMBEO	CUADRILLA POZO PROFUNDO
PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO SEV. 02	34 DIAS	ML	120	0.21 ML/DIA	• TUBERÍA CIEGA DE 8" PVC ROSCADA SDR 26 • TUBERÍA MANURADA DE 8" PVC ROSCADA SDR 26 • TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE GRAVILLA DE 2" EN PVC • GRAVILLA PARA FILTRO • TAPA PARA EL POZO DE D=8" EN	MAQUINA PERFORADORA DE POZO	CUADRILLA POZO PROFUNDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS POZO PROFUNDO SEV. 02	13 DIAS	UND	1	0.08 UN/DIA	N/A	MOTOBOMBA EN ACERO INOXIDABLE SUMERGIBLE, MULTITAPAS, ACOPLADA Q=85 GPM, 6",	CUADRILLA POZO PROFUNDO
CONSTRUCCIÓN DE CASETAS	89 DIAS	M2	23	0.26 M2/DIA	N/A	ACCESORIOS DEL POZO	CUADRILLA POZO PROFUNDO
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESABONADA ALTURA TOTAL H=2.5ML	15 DIAS	ML	15	1.00 ML/DIA	• CONCRETO PLACAS Y COLUMNAS • ACERO • BLOQUE DE CEMENTO • PUERTA Y VENTANA	HERRAMIENTA MENOR	CUADRILLA MANPOSTERIA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 165 M3	155 DIAS	M3	320	2.06 M3/DIA	• ACERO • CONCRETO CIMENTACION • MANPOSTERIA • MALLA CERRAMIENTO • EXCAVACIONES • CONCRETO PLACAS Y COLUMNAS • ACERO	HERRAMIENTA MENOR	CUADRILLA MANPOSTERIA
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	81 DIAS	M2	25	0.31 M2/DIA	• CONCRETO PLACA • ACERO	• MEZCLADORA DE CONCRETO • FORMALETAS • PLUMA GRUA	CUADRILLA ESTRUCTURAS
						HERRAMIENTA MENOR	CUADRILLA ESTRUCTURAS

PLANES DE CONTINGENCIA

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN RESTANTE	UND	CANT	RENDIMIENTO	MATERIAL	EQUIPO	M de O
TOTAL, TIEMPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y	160 DIAS						
PRELIMINARES PARA EVALUACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE POZO PROFUNDO SEV. 02	49 DIAS	ML	120	2.45 ML/DIA	N/A	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA INICIAL (LABORATORIO)	CUADRILLA POZO PROFUNDO
					N/A	COMPRESOR PARA DETERMINAR LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE EQUIPO BOMBEO	CUADRILLA POZO PROFUNDO
PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SEV. 02	34 DIAS	ML	120	0.21 ML/DIA	- TUBERÍA CIEGA DE 8" PVC ROSCADA SDR 26 - TUBERÍA RANURADA DE 8" PVC ROSCADA SDR 26 - TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE GRAVILLA DE 2" EN PVC - GRAVILLA PARA FILTRO - TAPA PARA EL POZO DE D=8" EN	MAQUINA PERFORADORA DE POZO	CUADRILLA POZO PROFUNDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS POZO PROFUNDO SEV. 02	13 DIAS	UND	1	0.08 UN/DIA	N/A	MOTOBOMBA EN ACERO INOXIDABLE SUMERGIBLE, MULTITAPAS, ACOPLADA Q=85 GPM, 6",	CUADRILLA POZO PROFUNDO
					N/A	ACCESORIOS DEL POZO	CUADRILLA POZO PROFUNDO
CONSTRUCCIÓN DE CASETAS	89 DIAS	M2	23	0.25 M2/DIA	- CONCRETO PLACAS Y COLUMNAS - ACERO - BLOQUE DE CEMENTO - PUERTA Y VENTANA	HERRAMIENTA MENOR	CUADRILLA MAMPOSTERÍA
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESABONADA ALTURA TOTAL H=2.5M.	15 DIAS	ML	15	1.00 ML/DIA	- ACERO - CONCRETO CIMENTACIÓN - MAMPOSTERÍA - MALLA CERRAMIENTO	HERRAMIENTA MENOR	CUADRILLA MAMPOSTERÍA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.65 M3	155 DIAS	M3	320	2.06 M3/DIA	- EXCAVACIONES - CONCRETO PLACAS Y COLUMNAS - ACERO	- MEZCLADORA DE CONCRETO - PLUMA GRUA - FORMALETAS	CUADRILLA ESTRUCTURAS
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	81 DIAS	M2	25	0.31 M2/DIA	- CONCRETO PLACA - ACERO	HERRAMIENTA MENOR	CUADRILLA ESTRUCTURAS


INCOVENIENTES PRESENTADOS

- 1. ORDEN PUBLICO, SUPERADO.
- 2. PERMISOS AMBIENTALES, SUPERADO.
- 3. INCONFORMISMOS CON LA COMUNIDAD, SUPERADO.

- En lo que respecta al avance financiero del proyecto, el contratista de obra no ha presentado actas parciales de cobro hasta la fecha, sin embargo, según la ejecución actual del proyecto, este se encuentra elaborando la primera cuenta de cobro parcial según los porcentajes establecidos dentro de las consideraciones de pago del CUR 1386.

CURVA S DE EJECUCIÓN DE OBRA		
Mes	% Programado	% Ejecutado
15/11/2023	0.00%	0.00%
15/12/2023	0.13%	1.33%
15/01/2024	0.13%	1.33%
15/02/2024	0.15%	1.37%
15/03/2024	0.19%	2.77%
15/04/2024	1.14%	3.59%
15/05/2024	12.96%	10.11%
15/06/2024	29.05%	19.41%
15/07/2024	42.48%	27.27%
8/08/2024	98.00%	33.50%

CURVA “S”

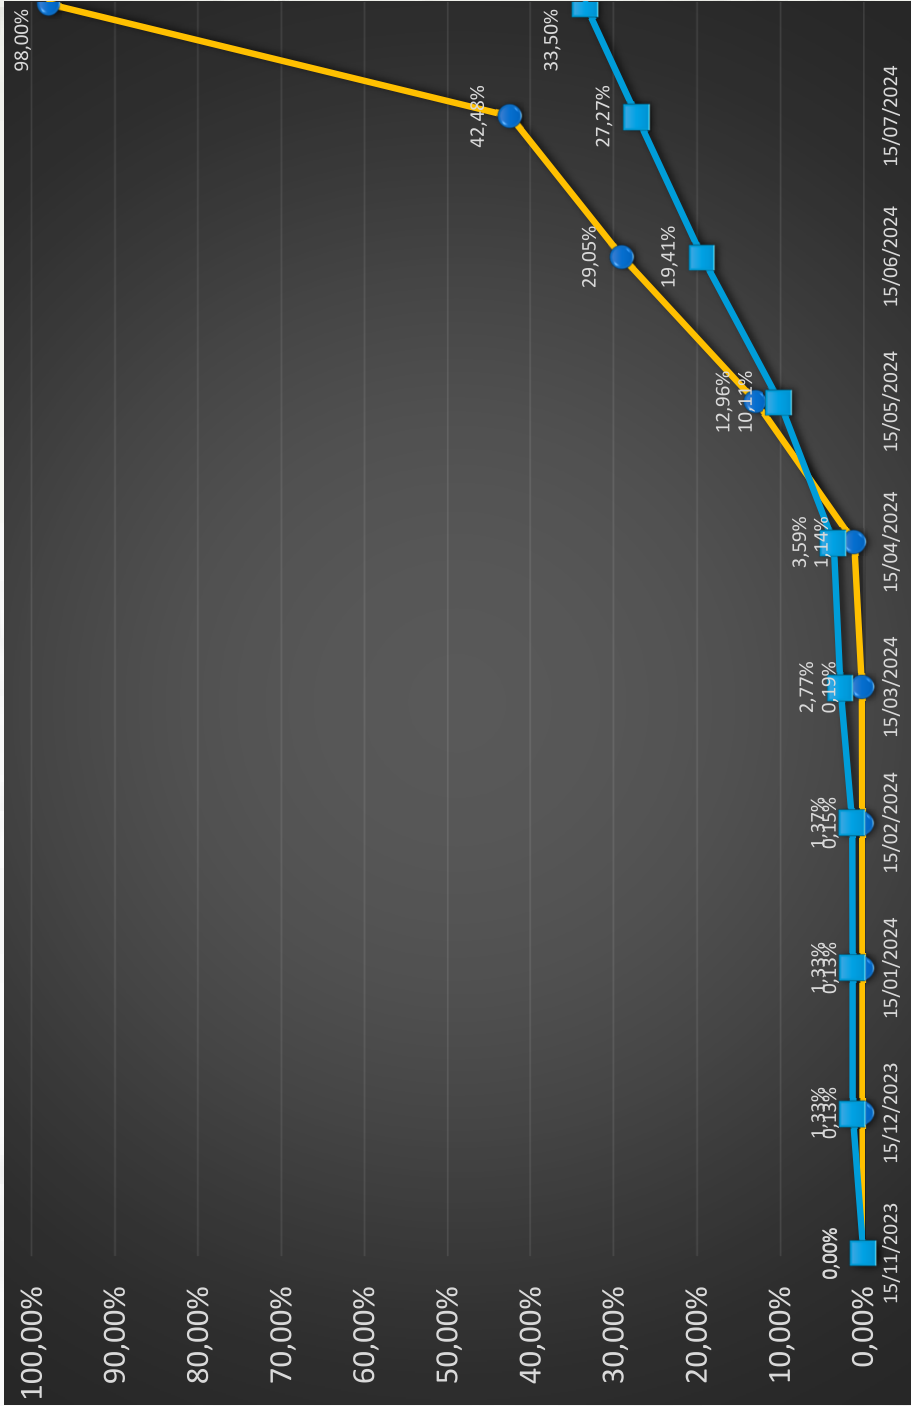

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DE OBRAS.

- Fecha estimada el día 12 de agosto de 2024, según otrosí N°2 suscrito el 15 de julio de 2024.

Esta modificatoria se suscribe con el fin de garantizar la ejecución del contrato de obra, para que se cumpla con los fines establecidos como necesidad y plasmados en los Estudios Previos, y cumplir con el objeto contractual, evitar la paralización y afectación grave de la futura prestación de servicios. Además, no se pueden otorgar los cinco (05) meses de adición de tiempo que solicita el contratista de obra e interventoría, ya que, la fecha de vencimiento del convenio CUR N°1386 de 2023, esta estipulada para el día 12 de agosto de 2024, por consiguiente, se considera necesaria la extensión del tiempo contractual hasta dicha fecha, ya que no se puede extender por fuera de la misma.

- Fecha INDEFINIDA, según acta de suspensión N°1 suscrito el 08 de agosto de 2024.

Esta acta de suspensión se suscribe con el fin de mantener la cobertura de plazo contractual del proyecto, ya que no se tiene definido el tiempo requerido para la suscripción de la prórroga de tiempo del CUR 1386, y, en vista de la proximidad de la fecha de terminación del mismo, se decide suspender el proyecto de manera indefinida hasta que se suscriba el acta modificatoria de tiempo del CUR 1386.

REPORTE AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

- El día 23 de julio de 2024 se envió comunicado G100-897-2024 mediante el cual se cita a una audiencia oral concentrada en el Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual, Contrato de Obra No. LP-ADS-009-2024, para el día 29 de julio del 2024 a las 03:00 p.m
- El día 01 de agosto de 2024 se envió comunicado G100-941-2024 mediante el cual se reprograma la audiencia oral concentrada del Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual, Contrato de Obra No. LP-ADS-009-2024, para el día 06 de agosto del 2024 a las 10:00 a.m. Dicha reprogramación, se presenta debido a situaciones ajenas, que generaron fallas en la conexión de internet, lo cual no permitió llevar a cabo la realización de la diligencia, con el fin de instalar y dar apertura al Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual que se adelantara por presunto incumplimiento en contra del CONSORCIO EL CAYO.
- Una vez concertada la audiencia oral el 06 de agosto de 2024, se da inicio al proceso de incumplimiento y se ordeno la practica de unas pruebas, con un tiempo aproximado de 15 días para reiniciar la audiencia.

ESTADO DE LAS PÒLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RCE, CONTRATO DE OBRA	
Póliza de Cumplimiento N°75-44-101132935 Anexo 03, según otro sí N°2	Aprobada mediante Resolución 312 de 2024, 01/08/2024.
Póliza de RCE, No 75-40-101049815, anexo 2, según acta otro sí N°2	Aprobada mediante Resolución 312 de 2024, 01/08/2024.
Póliza Todo Riesgo, No 75-40-101049815, anexo 2, según acta otro sí N°2	Aprobada mediante Resolución 315 de 2024, 05/08/2024.
ESTADO DE LAS PÒLIZAS DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Póliza de Cumplimiento N° CRC-100014850, Anexo 2, según acta otro sí N°2	Aprobada mediante Resolución 313 de 2024, 02/08/2024.

Se deben actualizar las vigencias según acta de suspensión N°1.

Perforación de pozo



La perforación del pozo se encuentra completada en su totalidad, teniendo una profundidad total de 120 metros, la cual inicio con un diámetro de exploración de 6-1/2". Posteriormente se realizo una ampliación de diámetro a 8", finalizada esta se llevo a cabo ampliación de diámetro a 10" y finalmente se realizo ampliación de diámetro a 14".

Cerramiento en malla eslabonada




El cerramiento perimetral esta próximo a ser culminado, donde se encontraba como tramo faltante el que se encontraba en cercanías a la zona de perforación, ya que, se requería de un área para realizar el retiro de los materiales provenientes de la perforación, además, falta la instalación de pisa malla y puerta de acceso.

Actividades preliminares para sistema de cloración – excavación para losa de cimentación




Una vez terminada las actividades de excavación referentes al tanque de almacenamiento, se da continuidad con la excavación para la losa de cimentación del sistema de cloración y la excavación de las zapatas para la caseta de control.

Suministro e instalación de acero de refuerzo

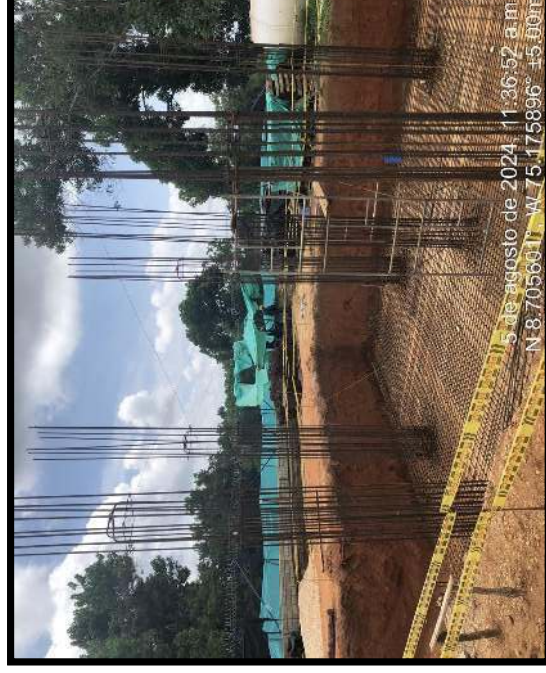

Se continua con la actividad de figurado, armado e instalación de acero de refuerzo para la estructuras de concreto del proyecto.

Excavaciones para instalación de tubería

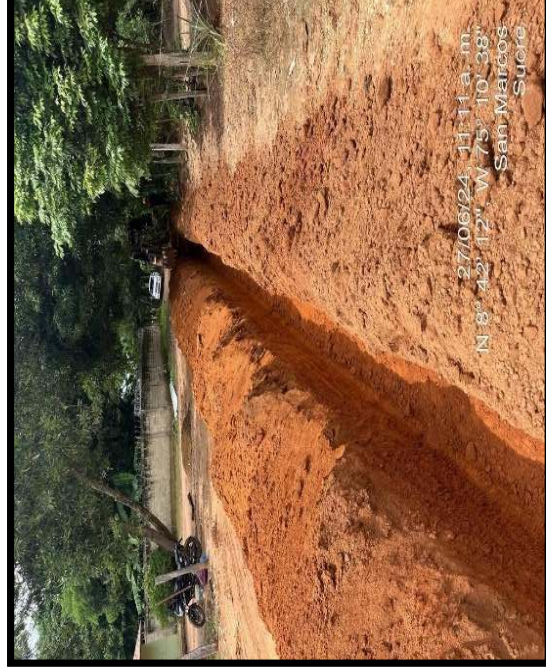


Se continua con la actividad de excavación, para la instalación de las redes de distribución, llevando a cabo dicha actividad en una longitud aproximada de 5.920 metros, que es el valor instalado de la tubería.

Suministro e instalación de tubería



Se continua con la actividad de instalación de tubería en PVC, donde el contratista de obra dispone de la totalidad de la tubería en sitio (aproximadamente 11.721 m de tubería de PVC de 2", 3" y 4") y hasta la fecha ha realizado la instalación de aproximadamente 5.920 m de tubería.

Relleno y compactación con material seleccionado del sitio

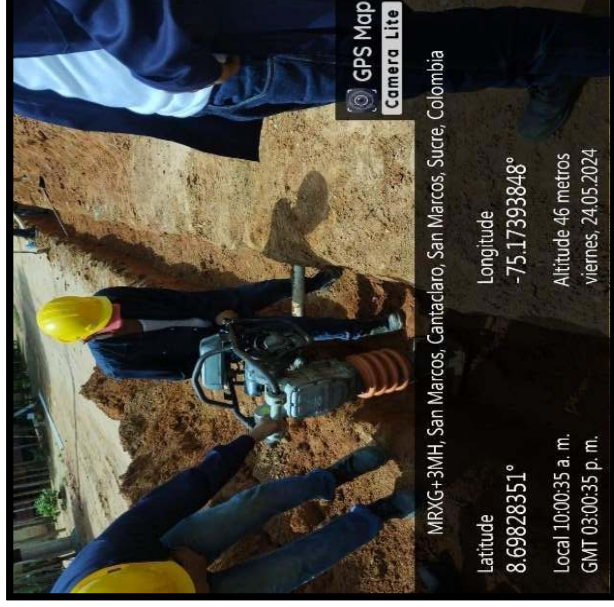

Se continua con la actividad de suministro e instalación de relleno con material del sitio, donde se ha realizado esta actividad en una longitud aproximada de aproximadamente 5.920 m de tubería, que es valor instalado de la tubería.

MUCHAS GRACIAS

Síguenos en nuestra página web y redes sociales



@aguasdesucure



<https://aguasdesucure.com/>



Aguas de Sucre



@pdasucure

“AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS –SUCRE”

GENERALIDADES	
CONTRATO	No. LP-ADS-008-2023
OBJETO	Ampliación y optimización del sistema de acueducto de los corregimientos de Mateo Pérez y Mata de Caña en el municipio de Sampués -sucre
CONTRATISTA	Consorcio Redes Coma R/L Yordy Manuel Diaz Acevedo
VALOR INICIAL	\$4.255.020.003
PLAZO INICIAL	7 MESES + 60 días
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION 1	16 DE JUNIO DE 2024
FECHA TERMINACION 2	17 DE AGOSTO DE 2024
AVANCE TEMPORAL (11-08-2024)	269 días (97,82%)

1. PORCENTAJES PROGRAMADO Y EJECUTADO

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 11-08-2024
34,00%

PORCENTAJE FISICO REPROGRAMADO PARA EL 11-08-2024
97,34%

PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 11-08-2024
63,34%

PORCENTAJE AVANCE TEMPORAL
97,82%

2. ACTIVIDADES DE OBRA ACTUAL

CAPITULO	COSTO PARCIAL	% CAPITULO SOBRE TOTAL	AVANCE INFORME 11/08/2024	VR PARCIAL
POZO PROFUNDO	\$670,103,777.26	15.7%	20.48%	\$ 137,211,382.00
CASETA DE BOMBEO	\$19,803,883.43	0.5%	0.21%	\$ 40,942.80
CERRAMIENTO POZO	\$48,054,444.96	1.1%	0.39%	\$ 189,400.00
DESCARGA DE TUBERIA DE POZO	\$53,805,559.00	1.3%	0.00%	\$ -
SISTEMA ELECTRICO POZO	\$221,859,288.00	5.2%	0.00%	\$ -
LINEA DE CONDUCCION	\$1,792,437,765.20	42.1%	57.74%	\$ 1,034,878,711.52
SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$71,775,353.00	1.7%	0.00%	\$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS CASETA DE CLORACION	\$10,959,133.00	0.3%	0.00%	\$ -
TANQUE ELEVADO	\$848,348,488.53	19.9%	31.76%	\$ 269,447,738.58
REDES DE DISTRIBUCION	\$517,872,310.49	12.2%	0.95%	\$ 4,924,400.00
	\$4,255,020,003	100%	34.00%	\$ 1,446,692,575.00

ACTIVIDADES DE OBRA: Con respecto a la ejecución de las actividades, se puede decir que hay 3 frentes de trabajo activos. Por temas de orden publico las actividades fueron suspendidas el 26 de julio de 2024. En la semana 37 de trabajo, la cual fue la última semana de trabajo antes de la paralización, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Línea de conducción:** Se realizó la excavación de 900 metros lineales en la línea de conducción para un total de 3770 metros lineales de excavación hasta la fecha, de un total de 7132 metros. Se realizó la instalación de 1970 metros lineales de tubería con su respectivo relleno para un total de 3770 metros lineales.
- Tanque Elevado:** Se realizó el armado de acero del cuarto nivel del tanque elevado y la terminación de su formaletería
- Pozo profundo:** Se realizó la perforación exploratoria del pozo profundo hasta una profundidad de 138 metros.



DESENCOFRADO DE LAS COLUMNAS DEL TERCER NIVEL DEL TANQUE



ARMADO DE FORMALETAS PARA INICIAR LA INSTALACION DEL ACERO DE LAS VIGAS DEL CUARTO NIVEL



SUMINISTRO DE ACERO PARA EL TANQUE



EXCAVACIONES EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN



COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN




PERFORACIÓN DEL POZO

NOTA: Aparecen fechas del mes de julio debido a que las actividades en los frentes de trabajo fueron suspendidas desde el día 26 de julio hasta la fecha

3. CURVA S ACTUALIZADA

NOTA: Solo se ha desembolsado el anticipo, no se han tenido pagos parciales, por ende el porcentaje de avance financiero es 0%.

SEMANA	PROGRAMADO	EJECUTADO	Dinero ejecutado
1	0%	0%	\$ 0
2	0%	0%	\$ 0
3	0%	0%	\$ 0
4	0%	0%	\$ 0
5	0%	0%	\$ 0
6	0%	0,08%	\$ 3.404.016
7	0%	0,16%	\$ 6.808.032
8	0%	0,24%	\$ 10.212.048,01
9	0%	0,32%	\$ 13.616.064,01
10	0,11%	0,41%	\$ 17.445.582,01
11	0,24%	0,50%	\$ 21.275.100,02
12	0,37%	0,59%	\$ 25.104.618,02
13	0,50%	0,68%	\$ 28.934.136,02
14	0,73%	0,77%	\$ 32.763.654,02
15	1,78%	0,77%	\$ 32.763.654,02
16	7,30%	0,77%	\$ 32.763.654,02
17	14,60%	0,77%	\$ 32.763.654,02
18	21,73%	0,77%	\$ 32.763.654,02
19	25,73%	0,77%	\$ 32.763.654,02
20	33,90%	1,96%	\$ 83.398.392,06
21	44,12%	3,14%	\$ 133.607.628,09
22	52,52%	4,33%	\$ 184.242.366,13
23	61,28%	5,51%	\$ 234.451.602,17
24	69,84%	5,76%	\$ 245.089.152,17
25	74,60%	6,01%	\$ 255.726.702,18
26	80,29%	6,25%	\$ 265.938.750,19
27	85,38%	6,50%	\$ 276.576.300,20
28	93,76%	6,67%	\$ 283.809.834,20
29	97,29%	10,34%	\$ 439.969.068,31
30	98,79%	14,01%	\$ 596.128.302,42
31	16,52%	14,40%	\$ 612.722.880,43
32	23,12%	14,64%	\$ 622.934.928,44
33	43,90%	14,91%	\$ 634.423.482,45
34	52,15%	15,61%	\$ 664.208.622,47
35	72,93%	25,60%	\$ 1.089.285.120,77
36	80,06%	28,08%	\$ 1.194.809.616,84
37	84,39%	34,00%	\$ 1.446.692.575,00
38	88,84%	34,00%	\$ 1.446.692.575,00
39	97,34%	34,00%	\$ 1.446.692.575,00
40	100,00%		

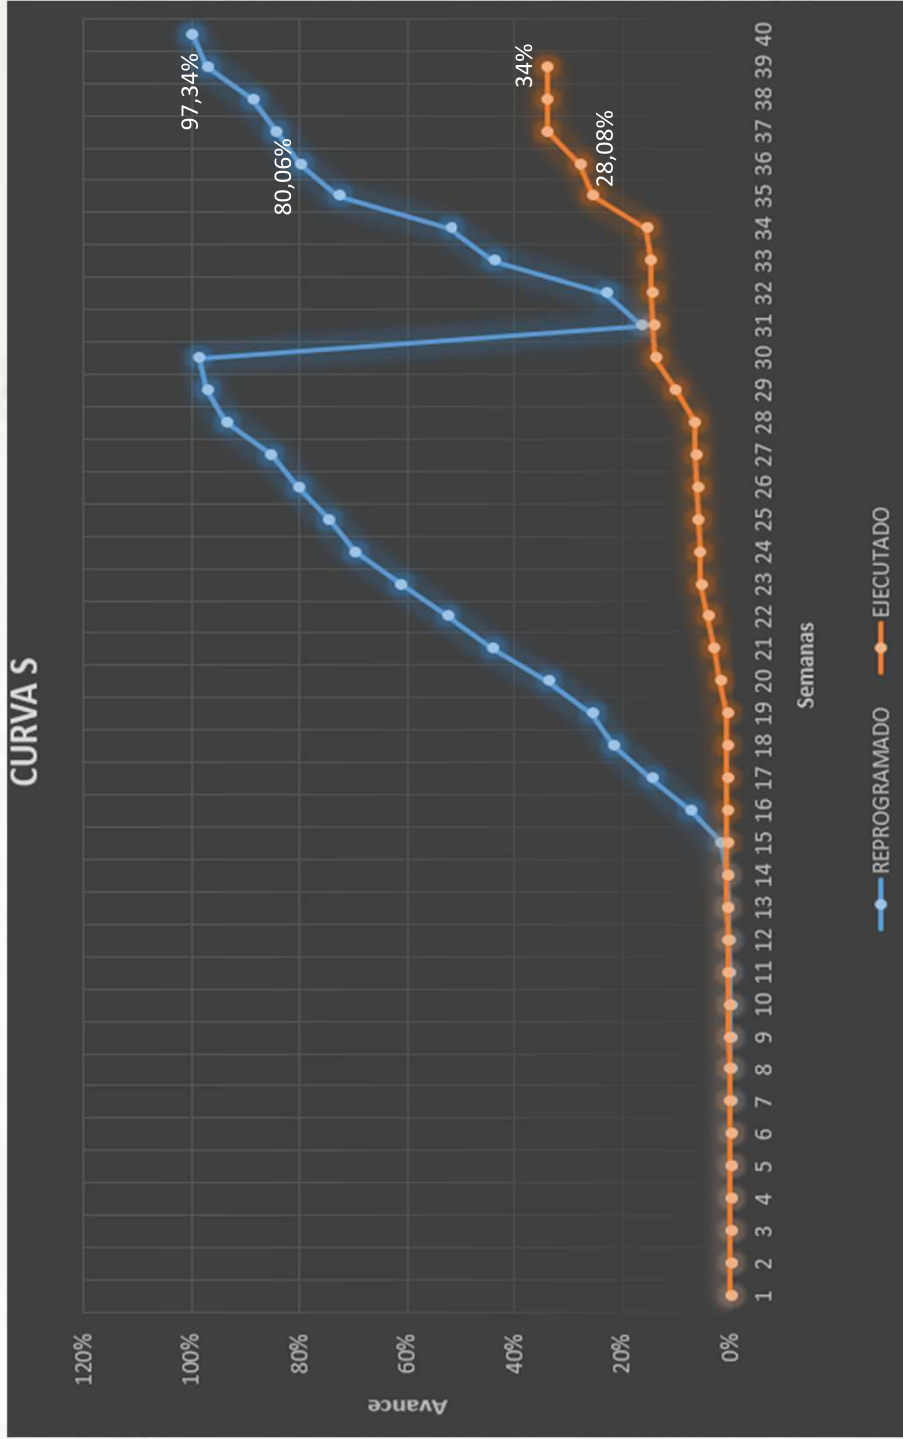

4. ALERTAS DEL PROYECTO

A. Estado presunto incumplimientos con fechas de audiencias realizadas y programadas

Resolución 092 de 2024 apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Obras LP-ADS-008-2023, de 13 de marzo de 2024

Sesión 1 _ 20-03-2024, 9:00 A.M	Sesión 2_ 22-03-2024, 10:30 A.M	Sesión 3_ 12-04-2024, 2:00 P.M	Practica de pruebas en campo	Imposición de multas	Audiencia Oral Concentrada_ 06-08- 2024, 3:00 P.M
Aplazada por ausencia del representante del garante SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aplazada por ausencia del representante del garante SEGUROS DEL ESTADO S.A	Descargos del Contratista de obra	Plazo máximo hasta el 19-04-2024 (Cumplida el 15-04-2024)	Alegato de conclusión 02 de agosto, se suspende por 1 hora y resuelve recurso de reposición	Alegatos de conclusión, se suspendió la audiencia para revisar lo expresado por el apoderado del Contratista de obra. Se reanudará la audiencia el día 14 de agosto

En las ultimas semanas, el equipo Jurídico en compañía del gerente de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. ha trabajado en la sanción en contra del CONSORCIO REDES COMA.

4. ALERTAS DEL PROYECTO

B. Alertas técnicas

- El contrato de obra LP-ADS-008-2023 tenía un plazo inicial de ejecución hasta el día 16 de junio de 2024, sin embargo se aprobó una prórroga en tiempo sin adición de recursos por dos meses, por ende la fecha de terminación según la adición de tiempo es el día 17 de agosto de 2024.
 - El avance general reportado por la Interventoría CONSORCIO INTER MATEO PEREZ para el día 11 de agosto de 2024, es del **34,00%** y un avance reprogramado del **97,34%** lo que demuestra un atraso del **63,34%** en la novena semana reprogramada.
 - Pendiente por ejecutar el 66,00% del objeto contractual en 6 días.
 - Las actividades fueron suspendidas en los diferentes frentes de obra desde el día 26 de julio debido a alteraciones de orden público.
 - **ACTIVIDADES DE OBRA:** Con respecto a la ejecución de las actividades, se puede decir que hay 3 frentes de trabajo activos. Por temas de orden público las actividades fueron suspendidas el 26 de julio de 2024. En la semana 37 de trabajo, la cual fue la última semana de trabajo antes de la paralización, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1. **Línea de conducción:** Se realizó la excavación de 900 metros lineales en la línea de conducción para un total de 3770 metros lineales de excavación hasta la fecha, de un total de 7132 metros. Se realizó la instalación de 1970 metros lineales de tubería con su respectivo relleno para un total de 3770 metros lineales.
 2. **Tanque Elevado:** Se realizó el armado de acero del cuarto nivel del tanque elevado y la terminación de su formaletería
 3. **Pozo profundo:** Se realizó la perforación exploratoria del pozo profundo hasta una profundidad de 138 metros.

4. ALERTAS DEL PROYECTO

C. Plan de contingencia

A continuación se presentan las actividades adoptadas por el contratista en su plan de contingencia, teniendo en cuenta cuadrillas, horarios y equipos mecánicos.

Frente	Horario	Personal	Maquinaria	Cumplimiento
Tanque	7:00 A.M – 6:00 P.M	Inicialmente habían 9 trabajadores, actualmente hay 14 trabajadores	-	Con respecto al plan de Contingencia y a los avances del contratista de obra, se puede decir que, este no a cumplido a cabalidad lo propuesto.
Línea de Conducción	7:00 A.M – 6:00 P.M	Inicialmente habían 15 trabajadores, actualmente hay 45 trabajadores	2 compactadores tipo canguro, Minicargador	
Pozo	6:00 A.M – 7:30 P.M	Operarios de la maquina perforadora	Maquina perforadora	

5. ESTADO DE POLIZAS

ACTO ADMINISTRATIVO	POLIZA	APROBACION
FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	CUMPLIMIENTO N° 75-44-101133377 – ANEXO 0	RESOLUCIÓN N° 684 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 75-40-101049948-ANEXO 2	
	POLIZA TODO TODO RIESGO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE No. CG-100000155	
ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO N° 75-44-101133377 – ANEXO 2	RESOLUCION N° 004 DE 2024
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 75-40-101049948-ANEXO 2	
OTROS! No.2	PENDIENTE	PENDIENTE

5. POLIZAS

- Las pólizas de la Interventoría con novedad de prórroga fueron radicadas en la Entidad Contratante y fue aprobada mediante Resolución No. 276 del 2024 .
- Con respecto al contratista de obra, radico la póliza Todo Riesgo según OTROSI No.2 y las demás pólizas según dicho OTROSI expresa que están en trámite.

5. INFORMES DE INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL	PERIODO	ENTREGADO POR INTERVENTORIA	APROBADO POR SUPERVISIÓN
N°1	16/11/2023-15/12/2023	SI	SI
N°2	16/12/2023-15/01/2024	SI	SI
N°3	16/01/2024-15/02/2024	SI	SI
N°4	16/02/2024-15/03/2024	SI	SI
N°5	16/03/2024-15/04/2024	SI	SI
N°6	16/04/2024-15/05/2024	SI	SI
N°7	16/05/2024-15/06/2024	SI	SI
N°8	16/06/2024-15/07/2024	SI	SI

7. ESTADO DE CARGUE AL SIGEVAS

Soporte Documental de Proyectos

2-2019-193	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE
Otros Documentos Legales:	
Actas de Reunión	
Documentos Contractuales	
Informes de Interventoría	
Informes de Comisión	
Reformulaciones	
Otros Documentos Legales	
Oficios Recibidos	
Lista de Chequeo	
Presentación Proyectos Comité	
Oficios Enviados	
Ficha de Evaluación	
Acta de Comité	
Proyecto con Concepto - Viabilidad	
Informes de Supervisión Seguimiento	
Informe Supervisión Consultoría	
Registro Fotográfico	

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	
OTROSÍ No.02_Contrato de Obra	23/06/2024	OTROSÍ No.02_Contrato de Obra		Alvaro Marino Marenco	
OTROSÍ No.01_Contrato de Interventoría	23/06/2024	OTROSÍ No.01_Contrato de Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
CTA ACLACIÓN A VEEDORES LUGAR POZO MATEO PEREZ	18/04/2024	Solicitada en Comité Social 3		Alvaro Marino Marenco	
CTA SOCIALIZACION PROYECTO MATEO PEREZ EN SEGOVIA	18/04/2024	Solicitada en Comité Social 3		Alvaro Marino Marenco	
Presupuesto de Obra	17/04/2024	Propuesta ganadora		Alvaro Marino Marenco	
Plan de inversión de Anticipo	11/04/2024	Plan de inversión anticipo Mateo perez		Alvaro Marino Marenco	
Reprogramación de obras	08/04/2024	Aprobada por Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Flujo de caja reprogramación	08/04/2024	Aprobada por interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Programación Project	08/04/2024	Aprobada por interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Relación de equipo y maquinaria mínima	08/04/2024	Aprobado por Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Programa de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA	08/04/2024	Aprobado por la Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Presupuesto PAGA	08/04/2024	Aprobado por Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Plan de Calidad	08/04/2024	Aprobado por la Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Plan de Manejo de Transito	08/04/2024	Aprobado por Interventoría		Alvaro Marino Marenco	

Otros Documentos Legales:

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	
OTROSÍ No.02_Contrato de Obra	23/06/2024	OTROSÍ No.02_Contrato de Obra		Alvaro Marino Marenco	
OTROSÍ No.01_Contrato de Interventoría	23/06/2024	OTROSÍ No.01_Contrato de Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
CTA ACLACIÓN A VEEDORES LUGAR POZO MATEO PEREZ	18/04/2024	Solicitada en Comité Social 3		Alvaro Marino Marenco	
CTA SOCIALIZACION PROYECTO MATEO PEREZ EN SEGOVIA	18/04/2024	Solicitada en Comité Social 3		Alvaro Marino Marenco	
Presupuesto de Obra	17/04/2024	Propuesta ganadora		Alvaro Marino Marenco	
Plan de inversión de Anticipo	11/04/2024	Plan de inversión anticipo Mateo perez		Alvaro Marino Marenco	
Reprogramación de obras	08/04/2024	Aprobada por Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Flujo de caja reprogramación	08/04/2024	Aprobada por interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Programación Project	08/04/2024	Aprobada por interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Relación de equipo y maquinaria mínima	08/04/2024	Aprobado por Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Programa de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA	08/04/2024	Aprobado por la Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Presupuesto PAGA	08/04/2024	Aprobado por Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Plan de Calidad	08/04/2024	Aprobado por la Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Plan de Manejo de Transito	08/04/2024	Aprobado por Interventoría		Alvaro Marino Marenco	

Resumen

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	
OTROSÍ No.02_Contrato de Obra	23/06/2024	OTROSÍ No.02_Contrato de Obra		Alvaro Marino Marenco	
OTROSÍ No.01_Contrato de Interventoría	23/06/2024	OTROSÍ No.01_Contrato de Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
CTA ACLACIÓN A VEEDORES LUGAR POZO MATEO PEREZ	18/04/2024	Solicitada en Comité Social 3		Alvaro Marino Marenco	
CTA SOCIALIZACION PROYECTO MATEO PEREZ EN SEGOVIA	18/04/2024	Solicitada en Comité Social 3		Alvaro Marino Marenco	
Presupuesto de Obra	17/04/2024	Propuesta ganadora		Alvaro Marino Marenco	
Plan de inversión de Anticipo	11/04/2024	Plan de inversión anticipo Mateo perez		Alvaro Marino Marenco	
Reprogramación de obras	08/04/2024	Aprobada por Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Flujo de caja reprogramación	08/04/2024	Aprobada por interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Programación Project	08/04/2024	Aprobada por interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Relación de equipo y maquinaria mínima	08/04/2024	Aprobado por Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Programa de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA	08/04/2024	Aprobado por la Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Presupuesto PAGA	08/04/2024	Aprobado por Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Plan de Calidad	08/04/2024	Aprobado por la Interventoría		Alvaro Marino Marenco	
Plan de Manejo de Transito	08/04/2024	Aprobado por Interventoría		Alvaro Marino Marenco	



Actas de Reunión	Documentos Contractuales	Informes de Interventoría	Informes de Comisión	Reformulaciones	Otros Documentos Legales	Oficios Recibidos	Lista de Chequeo	Presentación Proyectos Comité	Oficios Enviados	Ficha de Evaluación	Acta de Comité	Proyecto con Concepto - Viabilidad	Informes de Supervisión Seguimiento	Informe Supervisión Consultoría	Registro Fotográfico
------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	------------------	-------------------------------	------------------	---------------------	----------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------------------

✚ Informes de Supervision Seguimiento:

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	
INFORME SUPERVISION N 8	01/08/2024	INFORME SUPERVISION N 8		Alvaro Marino Marenco	
INFORME N° 7	23/07/2024	INFORME DE SUPERVISION N° 7		Alvaro Marino Marenco	
INFORME DE SUPERVISION #6	04/06/2024	INFORME DE SUPERVISION #6		Alvaro Marino Marenco	
INFORME DE SUPERVISION #5	07/05/2024	INFORME DE SUPERVISION #5		Alvaro Marino Marenco	
INFORME DE SUPERVISION #4	25/04/2024	INFORME DE SUPERVISION #4		Alvaro Marino Marenco	
Informe Supervision presunto incumplimiento	25/04/2024	Informe Supervision presunto incumplimiento del Contrato de obras		Alvaro Marino Marenco	
INFORME DE SUPERVISION # 3	10/04/2024	INFORME DE SUPERVISION # 3		Alvaro Marino Marenco	
INFORME DE SUPERVISION # 2	13/02/2024	INFORME DE SUPERVISION # 2		Victor Enrique Montes Madrid	
INFORME DE SUPERVISION 1	13/02/2024	INFORME DE SUPERVISION 1		Victor Enrique Montes Madrid	
INFORME DE SUPERVISION PARA MVCT	13/02/2024	INFORME DE SUPERVISION PARA MVCT		Victor Enrique Montes Madrid	
INFORME DE SUPERVISION INICIAL ison N° 1	11/01/2024	Informe ejecutivo de Supervision		Victor Enrique Montes Madrid	

Resumer

	X	X	X	X	X	X	X								
	Pencil	Pencil	Pencil	Pencil	Pencil	Pencil	Pencil								

7. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

1	Entrega de Balance de obra	Contratista de obra	Hasta 02 de julio	Cumplido (esta en revisión por parte de la supervisión)
2	Entrega plan de contingencia	Contratista de obra	Hasta 27 de junio	Cumplido
3	Convocatoria a comités de obra	ADS		• 30 de julio de 2024 • 14 de agosto de 2024 • 15 de agosto de 2024
4	Visita a obra	ADS		• 16 de julio de 2024 • Visita programada para el día 30 de julio de 2024 no se pudo llevar a cabo por razones de seguridad
5	Subsanación de pólizas	Contratista de obra		Incumplido

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

CUR	SALDO EN FIDUCIA (CON RENDIMIENTOS) A JUNIO DE 2024	SALDO NETO DISPONIBLE (SIN RENDIMIENTOS NI GMF NI RETEFUENTE) A JUNIO DE 2024	AVANCE FÍSICO DEL VEINTE (20%), VALOR Y PERÍODO	FECHA ESTIMADA DE PAGO	NUEVO SALDO EN FIDUCIA (SIN RENDIMIENTO)	RECURSOS POR SOLICITAR (3ER TRIMESTRE/2024) -30%
1341	\$ 99.993.563,00	\$ 556.911.885,42	(\$ 962.013.352,60 julio de 2024)	14/08/2024	\$ 1.062.006.915,60	\$ 1.443.020.028,90

MUCHAS GRACIAS

Síguenos en nuestra página web y redes sociales



@aguasdesucure



<https://aguasdesucure.com/>



Aguas de Sucre



@pdasucure

“CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE”

**GENERALIDADES Y FECHA DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**

GENERALIDADES	
CONTRATO	No. LP-ADS-010-2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO REDES SANTIAGO R/L CRISTIAN ALEXANDER OLIVO ARELLANO
VALOR INICIAL	\$9.709.306.024,00
PLAZO	9 MESES
FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION	15 DE AGOSTO DE 2024
AVANCE TEMPORAL (14-08-2024)	269 DÍAS (82,26%)

COMPONENTES ESENCIALES DE OBRAS DENTRO DEL CONTRATO

RESUMEN AVANCES

PORCENTAJE FISICO CON CORTE 14-08-2024	
ITEM	PORCENTAJE
PRELIMINARES	89,12%
EXCAVACIONES Y RELLENOS	35,98%
REDES COLECTORES SUMINISTRO	10,75%
REDES COLECTORES INSTALACIÓN	3,19%
CONEXIONES DOMICILIARIAS	3,91%
CÁMARA DE CAÍDA	0,0%
CÁMARAS DE INSPECCIÓN	2,73%
TOTAL	58,00%

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 14-08-2024
58,00%

PORCENTAJE FISICO REPROGRAMADO PARA EL 14-08-2024
99,00%

PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 14-08-2024
41,00%

PORCENTAJE AVANCE TEMPORAL
82,26%

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

- El PAC N°2 se envió el día 12 de agosto de 2024.

CUR	SALDO EN FIDUCIA (CON RENDIMIENTOS) A JUNIO DE 2024	SALDO NETO DISPONIBLE (SIN RENDIMIENTOS NI GMF NI RETEFUENTE) A JUNIO DE 2024	AVANCE FISICO DEL CUARENTA (40%), VALOR Y PERIODO	FECHA ESTIMADA DE PAGO	NUEVO SALDO EN FIDUCIA SIN RENDIMIENTOS	RECURSOS POR SOLICITAR (3ER TRIMESTRE/2024)
CUR 1364	\$166.111.516,76	\$123.856.157,70	(\$4.321.469.153,2 0 julio de 2024)	13/09/2024	\$6.774.171.404,26	\$2.160.734.576,00

PLANES DE CONTINGENCIA EN UNA COLUMNA PLASMAR EL

- COMPONENTE TÉCNICO, este componente encontramos los diseños, los equipos de topografía, maquinaria, herramientas y materiales que se requerirán para la construcción del alcantarillado. Se trabajarán en 5 frentes de trabajo cada uno estará compuesto por 5 cuadrillas, distribuidos de la siguiente manera:

FRENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDAD	PERSONAL	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HERRAMIENTAS
Excavación a maquina	1 operario de retroexcavadora	Descapote de instalaciones domiciliarias. Excavación tubería principal. Excavación manjoles. Rellenos de con material común.	1 Retroexcavadora
Excavación manual	6 ayudantes	Excavaran las instalaciones domiciliarias. Relleno y compactación de material seleccionado (0.3m)	Palas, picos, bugís Compactador tipo canguro.
Instalación de tuberías y accesorios	Oficiales (2) Ayudantes (8)	Instalaran las tuberías y accesorios en las tuberías principales y domiciliarias. cámaras de caída, encabezarán en los manjoles instalación arena de nivelación. instalación de relleno de relleno inicial	Herramienta menor. Compactador tipo canguro
Manjoles	Oficiales (1) Ayudantes (3)	Construcción de manjoles incluye solado, piso, cañuelas, paredes, tapas, escalera de acceso y resane de entrada de tuberías. Rellenos y compactación alrededor de los manjoles	Mezcladora. Vibrador de concreto Herramienta menor. Compactador tipo canguro
Entibados.	6 ayudantes	Instalación de entibados metálicos en profundidades mayores a 1.5m como lo requiere la normatividad SST en Colombia	Entibados. Madera. Herramienta menor
Registros domiciliarios	Oficiales (1) Ayudantes (2)	Construcción de registro con accesorio de salida	Mezcladora. Vibrador de concreto Herramienta menor

- En cuanto al plan de contingencia, se han adoptado horarios de trabajo de 6:00 A.M. a 5:00 P.M., dedicada a las actividades de suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario, construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias, incluyendo registros. Estas actividades se ejecutan en paralelo con cinco equipos de excavación mecánica. Cada cuadrilla está compuesta por 11 personas, incluyendo oficiales y ayudantes, y actualmente hay cinco frentes de obra activos.

Inicialmente, había dos (2) frentes de obra. Posteriormente, se incrementaron a cinco (5) frentes y luego se reorganizaron en cuatro (4) frentes de trabajo, distribuidos de la siguiente manera:

Frentes 1 y 2: Dedicados a la excavación e instalación de tuberías de alcantarillado sanitario. Estas actividades incluyeron la excavación manual y a máquina de las tuberías principales, la instalación de tuberías accesorias, cámaras de inspección, y la realización de rellenos y compactación del terreno. El personal en estos frentes estuvo compuesto por un operador de retroexcavadora, seis (6) ayudantes para excavación manual, dos (2) oficiales y ocho (8) ayudantes para la instalación de tuberías.

Frente 3: Enfocado en la construcción de acometidas domiciliarias y la instalación de manholes (pozos de registro). Aquí, se llevaron a cabo actividades como la construcción de manholes, que incluyó soldado, instalación de accesorios y conexiones, así como el relleno y compactación de las áreas trabajadas. El equipo en este frente incluyó dos (2) oficiales y tres (3) ayudantes.

Frente 4: Centrado en la instalación de registros domiciliarios y entibados. Este frente manejó la instalación de entibados metálicos, así como la colocación de registros con accesorios de salida. Contó con seis (6) ayudantes para el trabajo en entibados y un equipo de un (1) oficial y dos (2) ayudantes para la instalación de registros domiciliarios.


- En cumplimiento del contrato de consultoría CMA-ADS-017-2023, el 26 de junio de 2024 se realizó una visita técnico-jurídica. Posteriormente, el 4 de julio de 2024 se llevó a cabo una audiencia de pruebas orales con la directora de interventoría, conforme a la Resolución 096 de 2024, dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual. En dicha audiencia, se discutieron las pruebas de presunto incumplimiento, y en caso de confirmarse, se procederá a la tasación de las multas correspondientes. Se actualizó el informe de incumplimiento, cubriendo del 15 de noviembre de 2023 al 23 de julio de 2024. Actualmente, se está a la espera de la fecha para la audiencia de fallo definitivo.
- En el marco del proceso administrativo sancionatorio contractual iniciado mediante la Resolución 096 de 2024, relacionado con el contrato LP-ADS-010-2023 para la construcción de la segunda etapa del sistema de alcantarillado del corregimiento de Santiago Apóstol, se realizó una visita de práctica de pruebas en campo el 2 de agosto de 2024. Durante esta visita, se verificó la implementación del plan de choque y el estado de los frentes de trabajo. Se observó la operación de cinco máquinas realizando excavaciones, así como el progreso en el suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario, la construcción de acometidas domiciliarias y la instalación de pozos de inspección, todo conforme a lo estipulado en el contrato. La documentación relacionada con esta visita fue remitida al gerente mediante el documento ST130-700-2024 del 8 de agosto de 2024.

El proyecto registra un avance acumulado del 58,00% al 14 de agosto de 2024, según la información actualizada al 12 de agosto de 2024. El contratista de obra solicitó una extensión del plazo contractual, la cual fue evaluada y avalada por la interventoría, fundamentándose en dificultades para el acceso a los materiales. Como resultado, la entidad contratante aprobó una prórroga de cincuenta y siete (57) días, estableciendo la nueva fecha de terminación del contrato para el 12 de octubre de 2024. Cabe mencionar que el convenio de San Benito también concluye el 12 de octubre.

- Los avances en el Contrato de obra son: Socialización del proyecto, elección de veeduría puntual, avance en Actas de Vecindad, instalación de la valla informativa del proyecto.
- El 2 de agosto de 2024, durante la visita al corregimiento de Santiago Apóstol, se verificaron diversas actividades relacionadas con el seguimiento al contrato LP-ADS-010-2023. Se constató la ejecución de trabajos de excavación en los frentes de obra, avanzando en la preparación del terreno para la instalación de las infraestructuras. Asimismo, se revisó el progreso en la instalación de las tuberías para el sistema de alcantarillado sanitario, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Además, se observó el inicio de la construcción de acometidas domiciliarias, conectando las viviendas al sistema principal de alcantarillado. También se supervisó la instalación de pozos de inspección, necesarios para el mantenimiento y la operación del sistema. Estas actividades fueron revisadas para verificar el cumplimiento de los términos contractuales

CURVA S DE REPROGRAMACION- ACTUALIZAR PORCENTAJES

CURVA S DE EJECCIÓN DE OBRA		
SEMANA	% Programado	% Ejecutado
2	0,12%	0,15%
4	0,27%	0,29%
6	0,43%	0,43%
8	0,46%	0,48%
10	0,49%	0,59%
12	0,52%	0,64%
14	0,55%	0,70%
16	0,58%	0,70%
18	5,49%	0,70%
20	10,18%	0,70%
22	11,17%	0,70%
24	17,83%	0,70%
26	29,36%	6,84%
28	41,61%	14,81%
30	54,11%	28,50%
31	60,04%	30,89%
32	66,00%	43,50%
34	77,35%	43,50%
36	86,26%	45,29%
38	95,09%	51,00%
40	100,00%	58,00%

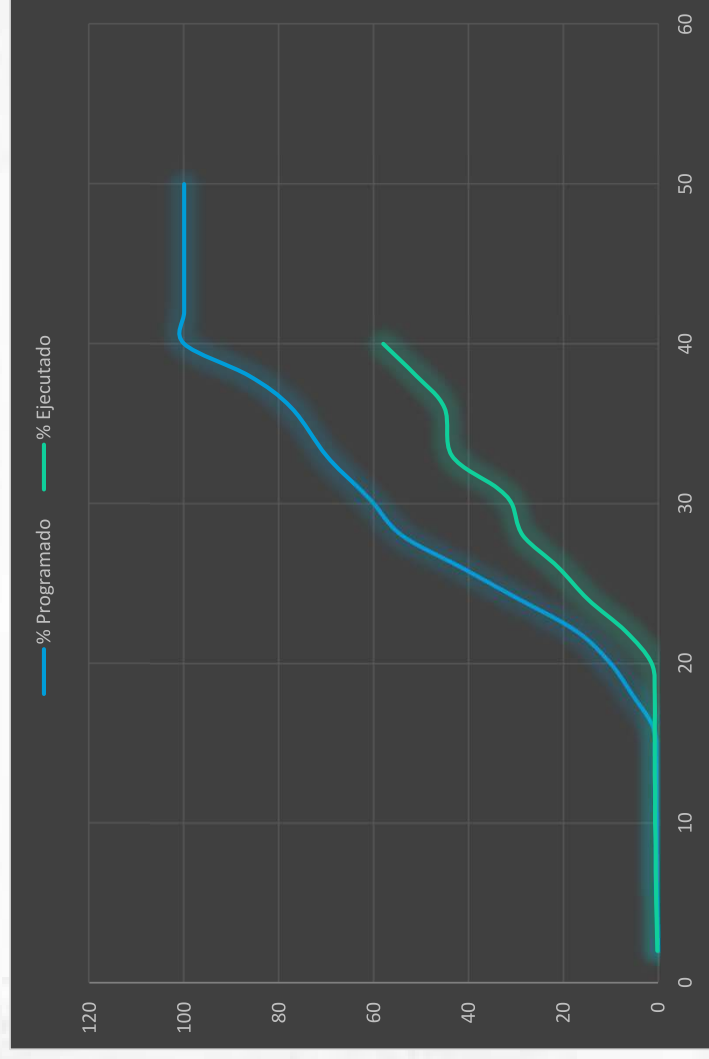

- Fecha estimada el día 12 de octubre de 2024.

REPORTE AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

Resolución 085 de 2024 apertura a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Consultoría para la Interventoría CMA-ADS-017-2023

Sesión 1 _ 18-03-2024, 9:00 A.M	Sesión 2 _ 22-03-2024, 4:00 P.M	Sesión 3 _ 08-04-2024, 3:00 P.M	Sesión 4 _ 21-06-2024, 2:30 P.M	Sesión 28- 06-2024	Sesión 6 _ 04-07-2024	Sesión 7 _
Aplazada por ausencia del apoderado del Interventor	Aplazada por Solicitud del interventor	Realizada y suspendida (entrega de pruebas hasta 19-04-2024, y a la fecha en evaluación jurídica de pruebas).	Pruebas orales a directora de interventoría .	Citación alegatos de conclusión	Prueba Oral Directora de interventoría .	Pendiente de programación para la audiencia de fallo definitivo.

REPORTE AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

Resolución 096 de 2024 apertura a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Obras LP-ADS-010-2023

Sesión 1 _ 01-04-2024, 3:00 P.M	Sesión 2_ 11-04-2024, 3:00 P.M	Sesión 3_ 24-04-2024, 9:00 A.M	Sesión 4_
Aplazada por solicitud del contratista	Aplazada por solicitud del contratista	Llamado a descargos y suspendida (entrega de pruebas, y a la fecha en evaluación jurídica de pruebas).	Práctica de pruebas en campo realizada el 2 de agosto de 2024. Acta remitida a la supervisión de AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., con cinco folios, para su evaluación



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

ALERTAS PROYECTOS (INTERVENTORÍA)



	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:	
		Versión:	
		Fecha:	
RESOLUCIÓN No.085 DE 2024			

"Por medio de la cual se da inicio a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión a la ejecución del Contrato de Consultoría - Interventoría N.º CMA-ADS-017-2023"

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial las dadas por los artículos 33, 34 y 35 del Manual de Contratación de la empresa de servicios públicos mixta del Departamento de Sucre "AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.", los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, modificada por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 1º de la Resolución 293 del 2004 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico, y las demás normas vigentes que la reglamentan, modifican o adicionan, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 365 de la Constitución Política dispone, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fija la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita;

Que, el artículo 366 de la Constitución Política dispone, que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación;

Que, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política la función administrativa se rige por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad;

Que, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas;

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:	
		Versión:	
		Fecha:	
RESOLUCIÓN No.085 DE 2024			

Universitario Especializado, apoyo a la supervisión, HERNANDO MONTES SEVILLA, con el fin de que rindan declaración en audiencia bajo la gravedad de juramento de las condiciones responsables de la supervisión por parte de la Entidad para con el contrato de contrato de interventoría N.º CMA-ADS-017-2023.

ARTÍCULO CUARTO: CÍTESE a la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., a través de su apoderado(a) como parte del proceso administrativo sancionatorio, el propósito que se haga parte de las garantías expedidas POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO. No. POLIZA 53-44-101029108-EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO (08-11-2023) Y POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO. No. POLIZA 53-44-101029108-EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO (26-01-2024), a favor EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., expedida por la empresa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. E.S.P., que asegura y beneficia a la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., la cual fue aprobada por la empresa, de conformidad con lo establecido en la regulación legal vigente, mediante Resoluciones N.º 682 del 14 de noviembre de 2023 y N.º 033 del 26 de enero de 2024, respectivamente, para el Contrato CMA-ADS-017-2023.

ARTÍCULO QUINTO: FÚJESE, la fecha de la audiencia oral concentrada para el día jueves (14) de marzo de 2024, a las 9.00 a.m. a través de la plataforma teams en el link, <https://teams.live.com/join?si=131714137497p=K05NL68W7TICP7g>

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto no procede recurso alguno.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo a los siete (7) días del mes de marzo del año 2024.

TULIO ALFREDO PINILLA CHAVEZ
Gerente
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Proyecto	Nombre y Apellidos	Cargo o Vinculación	Firma
Revisó	Orlando Choca Hernández	Asesor Jurídico -Secretaría	
Revisó	Jenny Emilia Ruiz	Secretaría General	
Revisó	Jenny Emilia Ruiz	Secretaría General	

ALERTAS PROYECTO (OBRA)

 AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	RESOLUCIÓN No.096 DE 2024	Versión: Página: Fecha:

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO, SE CITA Y SE
APERTURA UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
CONTRACTUAL CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE
OBRA LP-ADS-010-2023"

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., en
uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial las que
dicta los artículos 33, 34 y 35 del Manual de Contratación de la empresa de servicios
públicos mixta del Departamento de Sucre "AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.", los
artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, modificada por el artículo 3 de la Ley 689
de 2001, el artículo 1 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 1 de la Resolución 293
del 2004 de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento básico, y
las demás normas vigentes que la reglamentan, modifican o adicionan, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 365 de la Constitución Política dispone, los servicios públicos son
instituciones de carácter social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación en condiciones de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que le fija la ley, y no al de los
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la
vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el
Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra
cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades
estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las
personas que, en virtud de dicha ley, quedan privadas del ejercicio de una actividad
lícita.

Que, el artículo 369 de la Constitución Política dispone, que el bienestar general y
el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación;

Que, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política la función
pública se regirá por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas;


 AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	RESOLUCIÓN No.096 DE 2024	Versión: Página: Fecha:

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto no procede recurso alguno.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo al veintiuno día de marzo del año 2024


TULIO ALFREDO PINILLA CHÁVEZ
Gerente
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Proyecto	Nombre y Apellidos	Cargo o Vinculación	Firma
Revisó	Christian Correa H	Abogado Externo -Secretaría	
	Jenny Emilia Ruiz	Secretaria General	

Los arriba firmantes acordamos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales por encima vigentes, por lo tanto, damos nuestra responsabilidad de presentarnos para la firma del presente.



Excavaciones – Construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias. (fecha del registro 02-08-2024).



Construcción de pozos de inspección. (fecha del registro 02-08-2024).

ESTADO DE APROBACION POLIZAS

ACTO ADMINISTRATIVO	POLIZA	APROBACION
FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	CUMPLIMIENTO N° 4008871 – ANEXO 0	RESOLUCIÓN N° 681 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 4001864 - ANEXO 0	
	TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° CRC-1000000018	RESOLUCIÓN N° 759 DE 2023
ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO N° 4008871 – ANEXO 1	RESOLUCIÓN N° 032 DE 2024
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 4001864 ANEXO 1	
	TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° CRC-1000000018	RESOLUCIÓN N° 759 DE 2023



AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

CARGUE INFORMACION AL SIGEVAS



- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría
- Informes de Comisión
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comité
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervisión Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

Documentos Contractuales:

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	Resumen
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-010-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
APROBACION_POLIZATR_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
CUM_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
CUM_LP-ADS-010-2024_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
RCE_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
RCE_LP-ADS-010-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
OTRO SI LP-ADS-010-2023	05/03/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
ACTA SOCIALIZACION SANTIAGO APOSTOL	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	
ACTAS INICIO INTERVENTORIA DEBIDAMENTE FIRMADAS-1	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	
ACTAS INICIO OBRA DEBIDAMENTE FIRMADAS-1	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INTER CON CONTRATO	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INTER CON ACTA DE INICIO	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	
contrato de inter.	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	
contrato de obra.	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	
POLIZA INTERVENTORIA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENT	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	
RESOLUCIÓN APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO.p	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE POLIZA OBRA	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN POLIZA TODO RIESGO	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	
ACTA DE INICIO CMA-ADS-017-2023 CONSULTORIA	23/11/2023			Victor Enrique Montes Madrid	
ACTA DE INICIO OBRA LP-ADS-010-2023 SANTIAGO APOST	23/11/2023			Victor Enrique Montes Madrid	

Activar Windows.
Ve a Configuración para activar Windows.

	Actas de Reunión
	Documentos Contractuales
	Informes de Interventoría
	Informes de Comision
	Reformulaciones
	Otros Documentos Legales
	Oficios Recibidos
	Lista de Chequeo
	Presentación Proyectos Comité
	Oficios Enviados
	Ficha de Evaluación
	Acta de Comité
	Proyecto con Concepto - Viabilidad
	Informes de Supervision Seguimiento
	Informe Supervisión Consultoría
	Registro Fotográfico

Informes de Interventoría:

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	Resumen
INFORME DE INTERVENTORÍA N°1 COMPLETO	25/04/2024	INFORME DE INTERVENTORÍA N°1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023		Hernando de Jesús Montes Sevilla	
INFORME DE INTERVENTORÍA N°2	25/04/2024	INFORME DE INTERVENTORÍA N°2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 14 DE ENERO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	
INFORME DE INTERVENTORÍA N°3	25/04/2024	INFORME DE INTERVENTORÍA N°3, DEL PEIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 14 DE FEBRERO DE 2024.		Hernando de Jesús Montes Sevilla	
INFORME INTERVENTORIA # 2	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	
informe #1 interventoria radicado 1	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	

NOTA: Los informes de interventoría N°4 al N°7 no se han cargado en el SigeVas porque no han sido allegados por parte de la interventoría, muy a pesar de los requerimientos realizados por la Supervisión (los allegados no cumplen con el anexo técnico).



- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría
- Informes de Comisión
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comité
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervisión Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

Informes de Supervisión Seguimiento:

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	Archivo	
INFORME DE SUPERVISION N°8-VERSION-1.	12/07/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024.		Hernando de Jesús Montes Sevilla		X
INFORME DE SUPERVISION N°7-VERSION 1	10/06/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2024-VERSION N°1		Hernando de Jesús Montes Sevilla		X
INFORME N°6	03/05/2024	Correspondiente al periodo del 15 de marzo al 14 de abril de 2024 (Versión N°1)		Hernando de Jesús Montes Sevilla		X
INFORME DE SUPERVISION N°5	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		X
INF PRESUNTO INCUMPLIMIENTO SANTIAGO APOSTOL Fil.p	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid		
INFORME DE SUPERVISION 1.	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid		
INFORME DE SUPERVISION 2 SANTIAGO APOSTOL Fil.pdf	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid		
INFORME DE SUPERVISION 3 SANTIAGO APOSTOL Fil	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid		
INFORME DE SUPERVISION 4 SANTIAGO APOSTOL Fil	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid		

Resumen

- Fecha estimada 28 de agosto de 2024 en el sitio de las obras.
- Proceso del estado de cuenta de desembolso del 40% y el valor del desembolso, fecha de envió al Ministerio 12 de agosto de 2024.

“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ”

GENERALIDADES Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

GENERALIDADES	
CONTRATO	No. LP-ADS-011-2023
OBJETO	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCE
CONTRATISTA	CONSORCIO ALCANTARILLADO SINCE R/L MIGUEL EDUARDO MERCADO BUENDIA
VALOR INICIAL	\$17.609.067.885.00
PLAZO	16 MESES
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION	16 DE MARZO DE 2025
AVANCE TEMPORAL (20-04-2024)	268 DÍAS (55,83%)

COMPONENTES ESENCIALES DE OBRAS DENTRO DEL CONTRATO

RESUMEN AVANCES

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 13-08-2024
29,99%

PORCENTAJE FISICO REPROGRAMADO PARA EL 13-08-2024
36,48%

PORCENTAJE AVANCE TEMPORAL
50,41%

PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 13-08-2024
6,49%

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	%
1	LOCALIZACIÓN, NIVELACION Y REPLANTEO	100,00%
2	EXCAVACIONES	31,05%
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN BASES DE PAVIMENTO	37,66%
4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO	27,42%
5	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO DE 28 MPA VACIADAS EN EL SITIO, INCLUYE MESA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.20 M DE ESPESOR, CAÑUELAS DE TRANSICIÓN ESMALTADAS, CONO Y CILINDRO DE 1,20 M, FORMALETERÍA, CONTROL DE AGUA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFUERZO, Y SE INCLUYEN LOS DEMÁS COSTOS DIRECTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. INCLUYE SUMINISTRO DE ANILLO Y TAPA	31,82%
6	ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS	13,49%
7	SUMINISTRO DE TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO	28,65%
	TOTAL	
	% FÍSICO EJECUTADO 13-8-24	29,99%
	% FÍSICO REPROGRAMADO 13-8-24	36,48%
	% ATRASADO 13-8-24	6,49%

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

- El PAC N°1 se envió al Ministerio el día 12 de agosto de 2024.

CUR	SALDO EN FIDUCIA (CON RENDIMIENTOS) A JUNIO DE 2024	SALDO NETO DISPONIBLE (SIN RENDIMIENTOS NI GMF NI RETEFUENTE) A JUNIO DE 2024	AVANCE FISICO DEL VEINTE (20%), VALOR Y PERIODO	FECHA ESTIMADA DE PAGO	NUEVO SALDO EN FIDUCIA SIN RENDIMIENTOS	RECURSOS POR SOLICITAR (3ER TRIMESTRE/2024)
CUR 1334	\$ 347.005.822,50	\$ 399.144.103,35	(\$ 3.753.150.792,00 julio de 2024)	16/08/2024	\$4.100.156.614,50	\$5.629.726.188,00

- COMPONENTE TÉCNICO, este componente encontramos los diseños, los equipos de topografía, maquinaria, herramientas y materiales que se requieran para la construcción del alcantarillado. Se trabajarán en 2 frentes de trabajo cada uno estará compuesto por 3 cuadrillas, distribuidos de la siguiente manera:

7. METODOLOGIA DE TRABAJO.

Con el fin de ejecutar las actividades establecidas en el cronograma de obras vigente y cumplir con el plazo contractual estipulado se emplearán las siguientes estrategias:

- Organización del segundo frente de trabajo. Es preciso anotar que estos frentes trabajarán la jornada laboral ordinaria establecida por la ley. No obstante, es pertinente aclarar que debido a la época de lluvias que ya ha iniciado, la implantación de un nuevo frente de obras no garantizará el avance significativo de las actividades, ya que los factores climáticos no son imputables al Contratista.

Inicio Frente de Obra N°2: 2 de julio 2024.

- Se mantendrá una comunicación continua con el personal en obra, oficina y proveedores para no correr riesgo de retrasos por escasez de materiales; lo mismo aplica para las empresas de servicios públicos cuando se presenten casos en los que se necesiten reparaciones de redes existentes en los tramos a intervenir. Plazo: INMEDIATO.

- Se planificarán con anterioridad todas las actividades para prevenir retrasos durante la ejecución de la obra. Plazo: INMEDIATO.

8. PERSONAL EN OBRA.

Para dar cumplimiento con la nueva programación de obra en el tiempo estipulado de acuerdo con el Contrato, se contará con el siguiente personal, el cual es el requerido contractualmente al Contratista.

Tabla 3. Personal en Obra.

Frente de trabajo No.1	
Personal	Cantidad
Residente de Obra	1
Maestro de Obra	1
Oficial	1
Topógrafo	1
Cadenero	1
Obreros Domiciliarios	6
Obreros instalación de tuberías	3
Profesional SISO	1
Trabajadora social	1

Ahora, al implementar un segundo frente de obras Consorcio Alcantarillado Sincé, debe organizar administrativamente el nuevo personal, teniendo en cuenta que se requiere de nuevos profesionales y mano de obra no calificada.

Frente de trabajo No.2	
Personal	Cantidad
Auxiliar de Residente de Obra	1
Maestro de Obra	1
Oficial	1
Topógrafo	1
Cadenero	1
Obreros Domiciliarios	6
Obreros instalación de tuberías	3

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Para el desarrollo de las actividades se están utilizando la siguiente maquinaria y equipos:


Tabla 4. Maquinaria y Equipos.

Frente de Obras N°1	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
COMPACTADOR TIPO RANA	1
BOMBA SUMERGIBLE.	1
MEZCLADORA	1
PLANTA ELECTRICA	1
CANGURO	1
CORTADORA DE CONCRETO RIGIDO	1
HERRAMIENTAS MENORES	1
MOTOBOMBA	1
RETROEXCAVADORA	1
VOLQUETA	1
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
MINICARGADOR	1

- En cuanto al plan de contingencia, se ha adoptado horario de trabajo de 7:00 A.M. a 5:00 P.M, dedicadas a las actividades de suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario, construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias, incluyendo registros. Estas actividades se ejecutan en paralelo con dos equipos de excavación mecánica. Cada cuadrilla está compuesta por 7 personas, incluyendo oficiales y ayudantes, y actualmente hay cuatro frentes de obra activos.
- Teniendo en cuenta los retrasos que se están presentando en la obra, se puede decir que el plan de contingencia no se esta cumpliendo a cabalidad.

CURVA S DE REPROGRAMACION

CURVA S DE EJECUCIÓN DE OBRA		
Mes	% Programado	% Ejecutado
16/11/2023	0,00%	0,00%
16/12/2023	0,05%	0%
20/02/2024	0,07%	1,37%
19/03/2024	4,11%	5,56%
16/04/2024	9,85%	9,08%
16/05/2024	16,04%	10,60%
7/06/2024	18,50%	14,50%
16/06/2024	24,70%	17,85%
10/07/2024	29,66%	23,05%
16/07/2024	30,90%	23,60%
13/08/2024	36,48%	29,99%
16/08/2024	37,10%	
16/09/2024	44,52%	
16/10/2024	50,72%	
16/11/2024	64,52%	
16/12/2024	76,23%	
16/01/2025	82,99%	
16/02/2025	91,61%	
16/03/2025	100,00%	

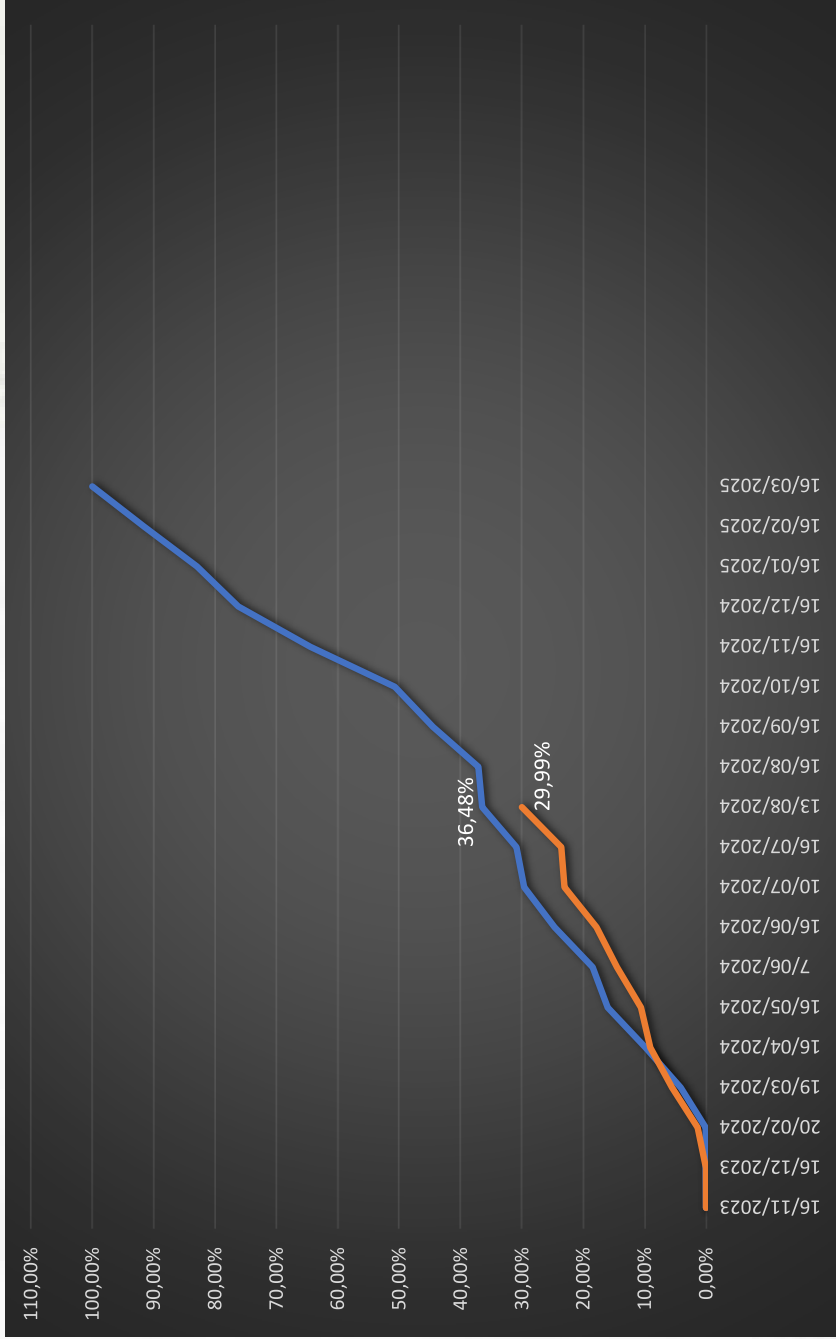

- Compromisos: de acuerdo con visita realizada el día 13 de junio de 2024, el contratista se comprometido a incluir nuevos frentes de trabajo para la primera semana de Julio de 2024, actualmente según lo reportado por la interventoría, cumplió el compromiso.
- El proyecto presenta un avance acumulado a fecha del día 13 de agosto de 2024 del 29,99 según ultimo reporte de la interventoría, frente al 36,48% (atraso del 6,49%) según reprogramación aprobada por la Interventoría del día 16 de abril de 2024. El Contrato tiene fecha de acta de inicio de 16 de noviembre de 2023 y terminación de 16 de marzo de 2025 (avance temporal 55,83%).
- Los avances en el Contrato de obra son: Socialización del proyecto, elección de veeduría puntual, avance en Actas de Vecindad, instalación de la valla informativa del proyecto, localización, nivelación y replanteo, excavaciones, relleno y compactación bases de pavimento, instalación de tubería alcantarillado sanitario, construcción de cámaras de inspección, estructuras complementarias, suministro de tubería alcantarillado sanitario.

- Plan de contingencia y permisos ambientales: Plan de choque del contrato de obra anexas fecha de inicio y fecha de finalización (aumento de cuadrillas), referente a los permisos ambientales no se requiere.
- Solicitud de informes de interventoría: El contratista de consultoría ha presentado hasta la fecha todos los informes de interventoría dentro del plazo contractual, fecha máxima de entrega el día 26 de cada mes.
- Fecha estimada de terminación de las obras es el día 16 de marzo de 2025.
- De acuerdo al reporte de la audiencia por presunto incumplimiento, el contratista ha ejecutado las actividades contractuales.
- De acuerdo a lo reportado por la interventoría, las actividades que se están llevando a cabo son excavaciones y rellenos con respecto a la instalación de redes de alcantarillado, construcción de pozos de inspección.



Excavaciones - Suministro e instalación de redes alcantarillado



Excavaciones y rellenos - Construcción de pozos de inspección.

ESTADO DE APROBACION POLIZAS

ACTO ADMINISTRATIVO	POLIZA	APROBACION
FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	CUMPLIMIENTO N° 21-44-101428959 – ANEXO 0	RESOLUCIÓN N° 680 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 21-40- 101221355 - ANEXO 0	
	TODOS RIESGOS CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° C-000000083	RESOLUCIÓN N° 717 DE 2023
ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO N° 21-44-101428959 – ANEXO 1	RESOLUCIÓN N° 743 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 21-40- 101221355 ANEXO 1	
	TODOS RIESGOS CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° C-000000083	RESOLUCIÓN N° 202 DE 2024

Actas de Reunión Documentos Contractuales Informes de Interventoría Informes de Comisión Reformulaciones Otros Documentos Legales Oficios Recibidos Lista de Chequeo Presentación Proyectos Comité Oficios Enviados Ficha de Evaluación Acta de Comité Proyecto con Concepto - Viabilidad Informes de Supervisión Seguimiento Informe Supervisión Consultoría Registro Fotográfico						Actas de Reunión: <table><tr><th>Nombre</th><th>Fecha</th><th>Descripción</th><th>Archivo</th><th>Cargado Por</th><th></th></tr><tr><td>20231219 ACTA DE SEGUIMIENTO</td><td>10/04/2024</td><td></td><td></td><td>Hernando de Jesús Montes Sevilla</td><td> </td></tr><tr><td>20240110 ACTA DE SEGUIMIENTO</td><td>10/04/2024</td><td></td><td></td><td>Hernando de Jesús Montes Sevilla</td><td> </td></tr><tr><td>20240118 ACTA DE SEGUIMIENTO</td><td>10/04/2024</td><td></td><td></td><td>Hernando de Jesús Montes Sevilla</td><td> </td></tr><tr><td>20240125 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT</td><td>10/04/2024</td><td></td><td></td><td>Hernando de Jesús Montes Sevilla</td><td> </td></tr><tr><td>20240202 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT</td><td>10/04/2024</td><td></td><td></td><td>Hernando de Jesús Montes Sevilla</td><td> </td></tr><tr><td>20240209 ACTA DE SEGUIMIENTO</td><td>10/04/2024</td><td></td><td></td><td>Hernando de Jesús Montes Sevilla</td><td> </td></tr><tr><td>20240216 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT</td><td>10/04/2024</td><td></td><td></td><td>Hernando de Jesús Montes Sevilla</td><td> </td></tr><tr><td>20240220 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT</td><td>10/04/2024</td><td></td><td></td><td>Hernando de Jesús Montes Sevilla</td><td> </td></tr><tr><td>20240226 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT</td><td>10/04/2024</td><td></td><td></td><td>Hernando de Jesús Montes Sevilla</td><td> </td></tr><tr><td>20240305 ACTA DE SEGUIMIENTO</td><td>10/04/2024</td><td></td><td></td><td>Hernando de Jesús Montes Sevilla</td><td> </td></tr><tr><td>20240319 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT</td><td>10/04/2024</td><td></td><td></td><td>Hernando de Jesús Montes Sevilla</td><td> </td></tr><tr><td>20240402 ACTA DE COMITE</td><td>10/04/2024</td><td></td><td></td><td>Hernando de Jesús Montes Sevilla</td><td> </td></tr></table>					Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por		20231219 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		20240110 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		20240118 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		20240125 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		20240202 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		20240209 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		20240216 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		20240220 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		20240226 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		20240305 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		20240319 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		20240402 ACTA DE COMITE	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por																																																																																				
20231219 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla																																																																																				
20240110 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla																																																																																				
20240118 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla																																																																																				
20240125 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla																																																																																				
20240202 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla																																																																																				
20240209 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla																																																																																				
20240216 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla																																																																																				
20240220 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla																																																																																				
20240226 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla																																																																																				
20240305 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla																																																																																				
20240319 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla																																																																																				
20240402 ACTA DE COMITE	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla																																																																																				
					Resumen																																																																																			



CARGUE INFORMACION AL SIGEVAS



1-2021-206

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE



Actas de Reunión

Documentos Contractuales

Informes de Interventoría

Informes de Comisión

Reformulaciones

Otros Documentos Legales

Oficios Recibidos

Lista de Chequeo

Presentación Proyectos Comité

Oficios Enviados

Ficha de Evaluación

Acta de Comité

Proyecto con Concepto - Viabilidad

Informes de Supervisión Seguimiento

Informe Supervisión Consultoría

Registro Fotográfico

Documentos Contractuales:

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por		
OTROSI N°1 LP-ADS-011-2023	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		
APROBACION_POLIZATR_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		
APROBACION_POLIZATR_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		
CUM LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		
CUM LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		
RCE LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		
RCE LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		
TR LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla		
ACTA DE INICIO OBRA FIRMADA.	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid		
ACTA DE INICIO SINCE INTER.	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid		
CONTRATO Inter	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid		
CONTRATO obra	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid		
POLIZA CUMPLIMIENTO Y RCE OBRA CON RESOLUCIÓN DE A	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid		
Póliza inter con acta de inicio y resolución de ap	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid		
póliza inter con contrato y resolución de aprobaci	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid		
Pólizas de Cumplimiento y RCE de obra con resoluci	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid		

Activar Windows



Actas de Reunión

Documentos Contractuales

Informes de Interventoría

Informes de Comisión

Reformulaciones

Otros Documentos Legales

Oficios Recibidos

Lista de Chequeo

Presentación Proyectos Comité

Oficios Enviados

Ficha de Evaluación

Acta de Comité

Proyecto con Concepto - Viabilidad

Informes de Supervisión Seguimiento

Informe Supervisión Consultoría

Registro Fotográfico

+ Informes de Interventoría:

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
OFICIO A LA INTERVENTORIA N°8	25/07/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 16 DE JULIO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒		
INFORME MENSUAL N° 7.pdf	10/07/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO DE 2024 AL 16 DE JUNIO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒		
INFORME N°6	31/05/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL DE 2024 AL 15 DE MAYO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒		
INFORME DE INTERVENTORIA N°5_V1	26/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒		
INFORME DE INTERVENTORIA No. 3	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒		
INFORME DE INTERVENTORIA No. 4	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒		
INFORME DE INTERVENTORIA No. 1	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒		
INFORME DE INTERVENTORIA No. 2	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒		

Resumen



- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comité
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

Informes de Supervision Seguimiento:

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por		
INFORME DE SUPERVISIÓN N°7_VERSION-N1	10/06/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	X
INFORME N°6.pdf	02/05/2024	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	X
INFORME N°2.pdf	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	X
INFORME N°3	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	X
INFORME N°4	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	X
INFORME N°5	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	X
INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISIÓN N°1	11/03/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	X
				Victor Enrique Montes Madrid	☒	

Resumen

- Fecha programada 27 de agosto de 2024 en el sitio de las obras.

MUCHAS GRACIAS

Síguenos en nuestra página web y redes sociales



@aguasdesucure



<https://aguasdesucure.com/>



Aguas de Sucre



@pdasucure
