

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 27/08/2024, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 20240827

PROYECTOS:

- OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ – CONVENIO 1334-2023
- CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE - CONVENIO 1334-2023.
- AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS –SUCRE - CONVENIO 1341-2023.
- AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAYO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE – CONVENIO 1386-2023.

DATOS GENERALES

FECHA:	27-08-2024
HORA:	9:00 a.m.
LUGAR:	Plataforma TEAMS
ASISTENTES	<p>Por parte de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.:</p> <p>Ing. Andrés Rhenals– Apoyo a la supervisión Ing. Jhony Garay – Apoyo a la supervisión Ing. Ángel Martínez Gómez – Apoyo a la supervisión Ing. Álvaro Marino Marenco- Apoyo a la Supervisión Ing. Nilka Ceballos – Subgerente Aguas de Sucre Ing. Hernando Montes - Apoyo a la supervisión</p> <p>Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT:</p> <p>Arq. Martha Romero – Apoyo a la supervisión. Ing. Laura Daniela Macías. Ing. Freddy Lozano.</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 27/08/2024, **Código:** GDC-F-01

ORDEN DEL DIA:

1. AVANCES DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS – SUCRE
2. AVANCES PROYECTO ACUEDUCTO CAYO DE LA CRUZ - SAN MARCOS.
3. AVANCES CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
4. AVANCES PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ

DESARROLLO:

1. Sampués rural. El ingeniero Álvaro Marino inicia la presentación aclarando que el plazo contractual del proyecto era de siete (7) meses inicialmente, pero posteriormente se realizaron 2 prórrogas al proyecto, ambas prórrogas fueron de 2 meses. La primera prórroga en tiempo tenía terminación el día 17 de agosto de 2024, y la segunda prórroga tiene fecha de finalización el día 18 de octubre de 2024. El avance real a fecha de 25 de agosto de 2024 es 38,31%, y el avance reprogramado está en revisión, ya que la reprogramación esta reciente, el porcentaje reprogramado a fecha de corte del día 25 de agosto de 2024 es 37.41%, de acuerdo a la reprogramación según Prorroga N°2. La supervisión aclara que hizo unas observaciones a la interventoría con respecto a la reprogramación, debido a que con respecto a la reciente prórroga arrancaron con un porcentaje reprogramado por debajo de lo que llevan ejecutado actualmente.

El ingeniero Marino expone los avances por capítulo de las actividades:

- Pozo profundo: 20.48%
- Caseta de bombeo: 0.21%
- Cerramiento Pozo: 0.39%
- Descarga de tubería de pozo: 0%
- Sistema eléctrico pozo: 0%

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 27/08/2024, **Código:** GDC-F-01

- Línea de conducción: 57.74%
 - Sistema de tratamiento: 0%
 - Instalaciones eléctricas caseta de cloración: 0%
 - Tanque elevado: 53.40%
 - Redes de distribución: 0.95%
- La ingeniera Laura Macías manifiesta la preocupación que tiene debido a que el porcentaje de avance en el frente del tanque elevado es mayor al del pozo profundo, debido a que según recomendación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se deben respetar los procesos constructivos, lo cual ante un posible incumplimiento en la ejecución de las actividades puede conllevar a la presencia de infraestructura no operativa sin funcionalidad.
- El ingeniero Álvaro Marino da a conocer que el primer componente por el cual se inició el proyecto fue el pozo, posteriormente arranco el tanque y por último la red de aducción, la red de distribución únicamente se hizo el replanteo. Actualmente el tanque va más adelantado que el pozo debido a temas de orden público, el contratista de obra suspendió las actividades en el frente del pozo profundo hasta que no se garanticen condiciones de seguridad, pero en un comité de seguridad el contratista de obra solicitó el acompañamiento de las autoridades en el frente del tanque debido a que contaba con acero y formaletería (tanque), y por ende se continuaron con las actividades del tanque. Como es sabido, en un proyecto de este contexto lo primero que se ejecuta es el pozo profundo, pero esta obra ha sido atípica por problemas de orden público. Se está gestionando con las autoridades un acompañamiento permanente en el frente del pozo para que el perforador continúe con sus actividades.
- La ingeniera Laura Macías pregunta porque no se solicitó la suspensión del convenio-contrato por los temas de orden público, además reitera la explicación técnica del porque el frente del tanque tiene un mayor avance que el pozo.
- La ingeniera Nilka Ceballos manifiesta que constructivamente se debe garantizar primero el abastecimiento, pero si el proyecto hubiera tenido una ejecución normal eso era lo que se esperaba, pero se han tenido problemas por el incumplimiento del contratista de obra al iniciar las actividades de obra del proyecto, por lo cual se inició un Proceso Administrativo Sancionatorio contra el CONSORCIO REDES COMA. Cuando el contratista inicio con las actividades del proyecto inicio en el frente del

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 27/08/2024, **Código:** GDC-F-01

pozo, pero se han presentado retrasos durante la perforación por las condiciones del subsuelo y averías en la máquina, además, con respecto al orden público, el pozo se encuentra en una zona más rural en comparación al tanque, el cual se encuentra en una zona aledaña a una vía principal (variante Sampués – Sincelejo), por tal razón la presencia de personas inescrupulosas se ha dado más frecuente en la zona del pozo que en la del tanque. La supervisión manifiesta que con diálogos con el MVCT era necesario hacer la reformulación del proyecto. La ingeniera Nilka Ceballos manifiesta que las autoridades competentes han hecho acompañamiento y rondas en los frentes de trabajo, pero los operarios del frente del pozo no retomaron actividades por temor. Además, expresa que desde el Ministerio se sugirió la realización de otro ensayo más sencillo, el cual permite determinar a qué profundidad se encuentra agua, por lo cual se hicieron las respectivas cotizaciones.

- La ingeniera Laura Macías sugiere que todo lo que pase relacionado con el proyecto debe ser informado al MVCT para llevar un mejor control de las actividades realizadas en este y tomar decisiones.
- La arquitecta Martha manifiesta que se explique el tema de la suspensión del proyecto.
- El ingeniero Álvaro Marino expresa que contractualmente el proyecto no estaba suspendido, y que el contratista inicio las actividades en el tanque debido a que hubo presencia de las autoridades competentes en este frente.
- El apoyo a la supervisión continua con la presentación y muestra el debido registro fotográfico de las actividades realizadas en los frentes de trabajo, además plasma la curva S de los porcentajes de avance y reitera que la interventoría está revisando la reprogramación con respecto a la prórroga N°2. También expresa que con respecto al proceso administrativo sancionatorio en contra del CONSORCIO REDES COMA, ya se realizó la imposición de la multa mediante la resolución N°321 de 2024, y que el apoderado del contratista de obra interpuso recurso de reposición para el día 23 de agosto de 2024 y se está evaluando por parte del equipo jurídico de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. la defensa del contratista de obra. El valor de la multa oscila los 212.000.000 de pesos.
- El Ingeniero Álvaro Marino con respecto al frente del pozo manifiesta que: el especialista hidrogeólogo Antonio Arrumado, encargado de la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 27/08/2024, **Código:** GDC-F-01

perforación informó, en comité técnico No. 18 de fecha 13 de agosto de 2024, que de los 200m de profundidad contratados van adelantados 138 m de perforación exploratoria y que solo se encontró una capa de acuífero de espesor de 1 m. En el estudio hidrogeológico del proyecto se determinó la presencia de la capa acuífera a partir de los 115 m.

Posteriormente realizó un nuevo sondeo eléctrico vertical SEV, por parte del perforador, para corroborar resultados de la tomografía y sondeo eléctrico vertical de la consultoría del proyecto y muestran que se presenta una capa acuífera a partir de los 250 metros. El especialista recomendó culminación de la perforación exploratoria hasta los 200 metros, realizar la columna litológica, registro eléctrico y prueba de bombeo a pozo abierto. Posteriormente contemplar la posibilidad de continuar realizando la exploración del pozo a una profundidad hasta los 350 metros para garantizar un mayor espesor de la capa acuífera.

En mesa virtual de 14 de agosto de 2024 con presencia de Contratista, Interventoría, entidad Contratante y el supervisor de zona norte del MVCT, Ing. Freddy Lozano, se exponen las consideraciones técnicas del pozo profundo y se acuerda desarrollar las recomendaciones del especialista hidrogeólogo de continuar exploración hasta los 200m y determinar las características del acuífero con recomendación de seguir explorando hasta los 250m con métodos más eficientes que demanden menor tiempo de perforación.

- De acuerdo a las pólizas, la supervisión ADS manifiesta que las pólizas de la interventoría se encuentran aprobadas, pero que con respecto a las del contratista de obra, el CONSORCIO REDES COMA manifiesta que no ha podido actualizar las pólizas debido a que la aseguradora requiere unos documentos relacionados con el Proceso Administrativo Sancionatorio.
- Durante el comité se tuvo la presencia del asesor técnico (MVCT) de la zona Norte Phanor Duque, especialista en Geotecnia, quien sugiere la realización de una perforación vertical dirigida desde la profundidad donde están en estos momentos hasta los 200 metros con el fin de verificar la presencia de agua, con el fin de verificar que el estudio inicial no este desfasado.
- El secretario General de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. reporta las acciones realizadas desde la entidad con respecto al Proceso Administrativo Sancionatorio en contra del CONSORCIO REDES COMA, en el cual se profirió una decisión de fondo acerca del incumplimiento del contratista de obra, se expidió la resolución N°321 de 2024 con fecha de

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 27/08/2024, **Código:** GDC-F-01

14 de agosto de 2024, en el cual se ordenó el recaudo de la multa impuesta al CONSORCIO REDES COMA en cuantía de aproximadamente \$212.751.000,15. Actualmente, el contratista de obra interpuso recurso de reposición en audiencia de fecha 23 de agosto de 2024, en la cual procedió a sustentar el recurso antes mencionado, y así mismo lo hizo la compañía aseguradora. En ese sentido estamos analizando los argumentos presentados por las partes, para posteriormente resolver el recurso de reposición. Es el proyecto más adelantado con respecto a las imposiciones de multas.

- Durante el transcurso del comité se tuvo la presencia del gerente de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. y del ingeniero Freddy Lozano para tratar temas relacionados del proyecto ejecutado en el municipio de Sampués.
- El ingeniero Álvaro Marino manifiesta que de acuerdo a las cotizaciones que habían realizado de acuerdo al ensayo, esta se asemejaba al propuesto por el ingeniero Phanor Duque, y que para llegar a los 200 metros de profundidad se necesitaría aproximadamente una semana.
- El ingeniero Freddy Lozano manifiesta que una semana es mucho tiempo. Además, expresa que la situación que se está presentando en el pozo es preocupante, ya que en esta clase de proyectos el abastecimiento es primordial. El contratista de obra está dilatando las cosas, ya que, a pesar de la situación de orden público, las autoridades han realizado acompañamiento y este no retoma las actividades.
- La ingeniera Laura Macías propone hacer el cambio del subcontratista encargado de la perforación del pozo, y solicitar el acompañamiento completo de las autoridades competentes en la realización del nuevo ensayo.
- El ingeniero Freddy Lozano expresa que en reuniones anteriores sugirió que en estos dos meses se debe ejecutar lo que contractualmente si se puede ejecutar, lo cual es profundizar hasta los 200 metros, trabajar de manera intermitente en la línea de conducción y el tanque. En el pozo se debía perforar a la profundidad hasta donde se encontrará agua.
- El gerente ADS Tulio Pinilla manifiesta que el contratista de obra siempre ha buscado cualquier tipo de pretexto para suspender el contrato, pero la entidad ha buscado todas las formas para respaldar al contratista en los

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 27/08/2024, **Código:** GDC-F-01

frentes de trabajo con respecto al tema de orden público solicitando el acompañamiento de las autoridades competentes y que continúe con la ejecución de las actividades.

- El MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. acuerdan que para los 210 metros restantes de profundidad de 350 metros para encontrar agua se deben utilizar los imprevistos (40.000.000 de pesos), y que el faltante sale de un balance de mayores y menores, asumiéndose con el proyecto. Sería un Ítem No Previsto con un balance de mayores y menores.

- 2. San Marcos. El ingeniero Jhony Garay manifiesta que el proyecto está suspendido contractualmente desde el día 8 de agosto de 2024, debido a que no se tenía el Otrosí del convenio aprobado. Estas causas fueron superadas, el proyecto fue reiniciado el día 27 de agosto de 2024.
 - El avance físico del proyecto es del 33.50%, frente a un programado de 98%, generándose de esta manera un atraso de 64.50%. estos porcentajes se mantuvieron debido a que el contrato estuvo suspendido para este periodo.

 - La supervisión ADS manifiesta que el avance financiero del proyecto es del 0%, ya que no se han realizado desembolsos de actas parciales, únicamente se ha desembolsado el anticipo.

 - Las actividades de obra actual son:
 - Pozo profundo (preliminares): 90.38%
 - Perforación pozo: 64.60%
 - Equipos de bombeo y accesorios: 0%
 - Construcción de casetas: 22.73%
 - Construcción de cerramiento: 83.98%
 - Tanque de almacenamiento de 165 m3: 15.47%
 - Planta de tratamiento: 0%
 - Redes de distribución: 44.24%
 - Sistema eléctrico media y baja tensión: 0%
 - Instalación de baja tensión: 0.95%

Estos porcentajes se mantuvieron debido a que el contrato estuvo suspendido para este periodo.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 27/08/2024, **Código:** GDC-F-01

- La arquitecta Martha Romero, pregunta porque la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. demoro tanto tiempo para iniciar el Proceso Administrativo Sancionatorio.
 - El Secretario General de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., manifiesta que, habían tenido retrasos en cuanto a la ejecución del proceso administrativo sancionatorio contractual, debido a que las partes involucradas en el proceso, en reiteradas ocasiones no han comparecido las audiencias, lo cual ha generado situaciones que generan dilataciones en el proceso hasta el punto de que esta Secretaría tomara la iniciativa de surtir la diligencia y hacer el traslado del video de la grabación de las audiencias por medio de oficio para que las partes tengan conocimiento de ello, y que en la próxima audiencia procedieran a efectuar sus descargos pertinentes. Sin embargo, se deja claro que se tiene varios procesos sancionatorios y se han ido priorizando para avanzar con los mismos.
 - MVCT solicita actualizar la curva "S" e incluir columna con avance financiero
 - MVCT solicita incluir el porcentaje de cada componente de las actividades de obra.
 - MVCT solicita proyectar oficio a CORPOMOJANA, solicitando la realización de la prueba de bombeo del pozo profundo, ya que ADS informa que la actividad se encuentra en un 100% de ejecución.
3. San Benito. La reunión se centró en evaluar el estado de avance del proyecto, específicamente en el Corregimiento de Santiago Apóstol, San Benito Abad.

Avance de la Obra:

ADS informó que el avance ejecutado actual es del 60.40% y programado del 99%, según lo reportado en el último informe de interventoría. Se están ejecutando actividades como excavaciones, rellenos, instalación de redes colectoras y acometidas domiciliarias.

Se identificó la necesidad de incluir un cuadro detallado que refleje las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría.

Plan de Contingencia:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 27/08/2024, **Código:** GDC-F-01

Se discutió la implementación del plan de contingencia, el cual ADS informó que está siendo ejecutado conforme a lo acordado, con cada frente de trabajo operando con su respectiva maquinaria y cuadrilla.

Se recomendó incluir en el informe una columna adicional para detallar el impacto de los recursos implementados en la mejora de los rendimientos de la obra.

SITUACIÓN DE LAS PÓLIZAS:

- Actualización de Pólizas:
Se informó que las pólizas, que inicialmente tenían vigencia hasta el 15 de agosto de 2024, han sido prorrogadas hasta el 12 de octubre de 2024. Sin embargo, estas actualizaciones aún no han sido entregadas, por lo que se debe hacer seguimiento para garantizar su recepción oportuna.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

- Informe de Interventoría:

Se revisaron los informes de interventoría recibidos hasta el momento. Se acordó que los informes deben ser actualizados y aprobados antes de ser cargados al sistema SIGEVAS.

Se destacó la importancia de que los informes reflejen con precisión los avances ejecutados y que estén debidamente aprobados por la interventoría antes de ser presentados ante el MVCT.

AUDIENCIA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO:

- Estado del Proceso:

o Se discutió el proceso de audiencia por presunto incumplimiento, que actualmente está en curso. Se programó una nueva sesión para el 30 de agosto de 2024, en la que se espera la presentación de los alegatos finales por parte del contratista y la interventoría.

PRÓXIMAS ACCIONES Y SEGUIMIENTO:

- Visita de Obra:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 27/08/2024, **Código:** GDC-F-01

ADS programó una visita de obra para el 5 de septiembre de 2024, con el fin de verificar el avance de las actividades y el cumplimiento del plan de contingencia.

- Seguimiento a Desembolsos:

Se acordó seguir de cerca el proceso de desembolso de los recursos, asegurando que las cuentas de cobro se presenten con toda la documentación requerida y presentar el estado financiero, se presentaran en el mes de septiembre de 2024.

4. Avance del Proyecto:

Sincé. El avance físico del proyecto se encuentra en un 30.13% con un avance programado del 37,10%. Las fechas de expiración permanecen sin cambios, manteniéndose las establecidas previamente. A la fecha el proyecto cuenta con un atraso del 6,97%, ADS informa que no cuenta con alertas técnicas el proyecto.

Revisión de Responsabilidades:

Se discutió la delegación de futuras tareas al ingeniero Andrés, subrayando la importancia de que las actividades de seguimiento sean gestionadas por quienes participaron en reuniones anteriores, dado su conocimiento detallado de los temas complejos tratados.

Documentación:

Se confirmó el envío de los informes de supervisión del proyecto, incluyendo las correcciones necesarias. Se reiteró la necesidad de revisar estos documentos para asegurar que reflejen adecuadamente las actualizaciones y sean utilizados en el control del proyecto.


Nota: Como soporte para cada comité de seguimiento, el MVCT ha solicitado al ejecutor Aguas de Sucre una presentación con el estado de cada uno de los proyectos bajo su supervisión, la cual complementa y hace parte de la presente acta de comité de seguimiento.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 27/08/2024, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.



Ing. Jhony Garay
Apoyo a la Supervisión



Ing. Ángel Martínez Gómez
Apoyo a la Supervisión



Álvaro Marino Marengo
Apoyo a la Supervisión




HERNANDO MONTES SEVILLA
Apoyo a la Supervisión



NILKA PAOLA CEBALLOS GÓMEZ
Subgerente Técnico

FIRMAS MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT:



Martha Romero
Apoyo a la Supervisión

Laura Macías
Apoyo Técnico MVCT

Freddy Lozano
Gestor Zona Norte



**“AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS
DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO
DE SAMPUÉS –SUCRE”**

GENERALIDADES	
CONTRATO	No. LP-ADS-008-2023
OBJETO	Ampliación y optimización del sistema de acueducto de los corregimientos de Mateo Pérez y Mata de Caña en el municipio de Sampedrés -sucre
CONTRATISTA	Consorcio Redes Coma R/L Yordy Manuel Diaz Acevedo
VALOR INICIAL	\$4.255.020.003
PLAZO INICIAL + PRORROGA 1 + PRORROGA 2	7 MESES + 60 días + 60 días
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION 1	16 DE JUNIO DE 2024
FECHA TERMINACION 2	17 DE AGOSTO DE 2024
FECHA TERMINACION 3	18 DE OCTUBRE DE 2024
AVANCE TEMPORAL (25-08-2024)	283 días (83,98%)



1. PORCENTAJES PROGRAMADO Y EJECUTADO



PORCENTAJE FISICO REPROGRAMADO EJECUTADO PARA EL 25-08-2024

38,31%

PORCENTAJE FISICO REPROGRAMADO PARA EL 25-08-2024

En revisión para aprobación por parte de la Interventoría

PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 25-08-2024

-

PORCENTAJE AVANCE TEMPORAL

83,98%

2. ACTIVIDADES DE OBRA ACTUAL

CAPITULO	COSTO PARCIAL	% CAPITULO SOBRE TOTAL	AVANCE INFORME 11/08/2024	VR PARCIAL
POZO PROFUNDO	\$670,103,777.26	15.7%	20.48%	\$ 137,211,382.00
CASETA DE BOMBEO	\$19,803,883.43	0.5%	0.21%	\$ 40,942.80
CERRAMIENTO POZO	\$48,054,444.96	1.1%	0.39%	\$ 189,400.00
DESCARGA DE TUBERIA DE POZO	\$53,805,559.00	1.3%	0.00%	\$ -
SISTEMA ELECTRICO POZO	\$221,859,288.00	5.2%	0.00%	\$ -
LINEA DE CONDUCCION	\$1,792,437,765.20	42.1%	57.74%	\$ 1,034,878,711.52
SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$71,775,353.00	1.7%	0.00%	\$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS CASETA DE CLORACION	\$10,959,133.00	0.3%	0.00%	\$ -
TANQUE ELEVADO	\$848,348,488.53	19.9%	53.40%	\$ 453,052,265.38
REDES DE DISTRIBUCION	\$517,872,310.49	12.2%	0.95%	\$ 4,924,400.00
	\$4,255,020,003	100%	38.31%	\$ 1,630,297,102.00



ARMADO DE ACERO DE LAS COLUMNAS DEL CUARTO AL QUINTO NIVEL



FUNDIDA DE LAS COLUMNAS DEL CUARTO AL QUINTO NIVEL



ACOMPÑAMIENTO DE AUTORIDADES COMPETENTES EN LOS FRENTE DE TRABAJO




NOTA: Únicamente se adjuntan imágenes del frente del tanque elevado, ya que en este es donde se están adelantando actividades. En los demás frentes el contratista de obra no ha reiniciado actividades ya que manifiesta temor de los trabajadores por orden publico. La Entidad así como la interventoría han solicitado iniciar las actividades en los demás frentes, teniendo en cuenta el acompañamiento que han brindado las autoridades competentes.

3. CURVA S ACTUALIZADA

NOTA: Solo se ha desembolsado el anticipo, no se han tenido pagos parciales, por ende el porcentaje de avance financiero es 0%.

SEMANA	REPROGRAMADO	% EJECUTADO	COSTO EJECUTADO REAL
1	0%	0%	\$ 0
2	0%	0%	\$ 0
3	0%	0%	\$ 0
4	0%	0%	\$ 0
5	0%	0%	\$ 0
6	0%	0,08%	\$ 3.404.016
7	0%	0,16%	\$ 6.808.032
8	0%	0,24%	\$ 10.212.048,01
9	0%	0,32%	\$ 13.616.064,01
10	0,11%	0,41%	\$ 17.445.582,01
11	0,24%	0,50%	\$ 21.275.100,02
12	0,37%	0,59%	\$ 25.104.618,02
13	0,50%	0,68%	\$ 28.934.136,02
14	0,73%	0,77%	\$ 32.763.654,02
15	1,78%	0,77%	\$ 32.763.654,02
16	7,30%	0,77%	\$ 32.763.654,02
17	14,60%	0,77%	\$ 32.763.654,02
18	21,73%	0,77%	\$ 32.763.654,02
19	25,73%	0,77%	\$ 32.763.654,02
20	33,90%	1,96%	\$ 83.398.392,06
21	44,12%	3,14%	\$ 133.607.628,09
22	52,52%	4,33%	\$ 184.242.366,13
23	61,28%	5,51%	\$ 234.451.602,17
24	69,84%	5,76%	\$ 245.089.152,17
25	74,60%	6,01%	\$ 255.726.702,18
26	80,29%	6,25%	\$ 265.938.750,19
27	85,38%	6,50%	\$ 276.576.300,20
28	93,76%	6,67%	\$ 283.809.834,20
29	97,29%	10,34%	\$ 439.969.068,31
30	98,79%	14,01%	\$ 596.128.302,42
31	16,52%	14,40%	\$ 612.722.880,43
32	23,12%	14,64%	\$ 622.934.928,44
33	43,90%	14,91%	\$ 634.423.482,45
34	52,15%	15,61%	\$ 664.208.622,47
35	72,93%	25,60%	\$ 1.089.285.120,77
36	80,06%	28,08%	\$ 1.194.809.616,84
37	84,39%	34,00%	\$ 1.446.692.575,00
38	88,84%	34,00%	\$ 1.446.692.575,00
39	97,34%	34,00%	\$ 1.446.692.575,00
40	100,00%	34,01%	\$ 1.446.994.753,00
41	-	38,31%	\$ 1.630.297.102,00

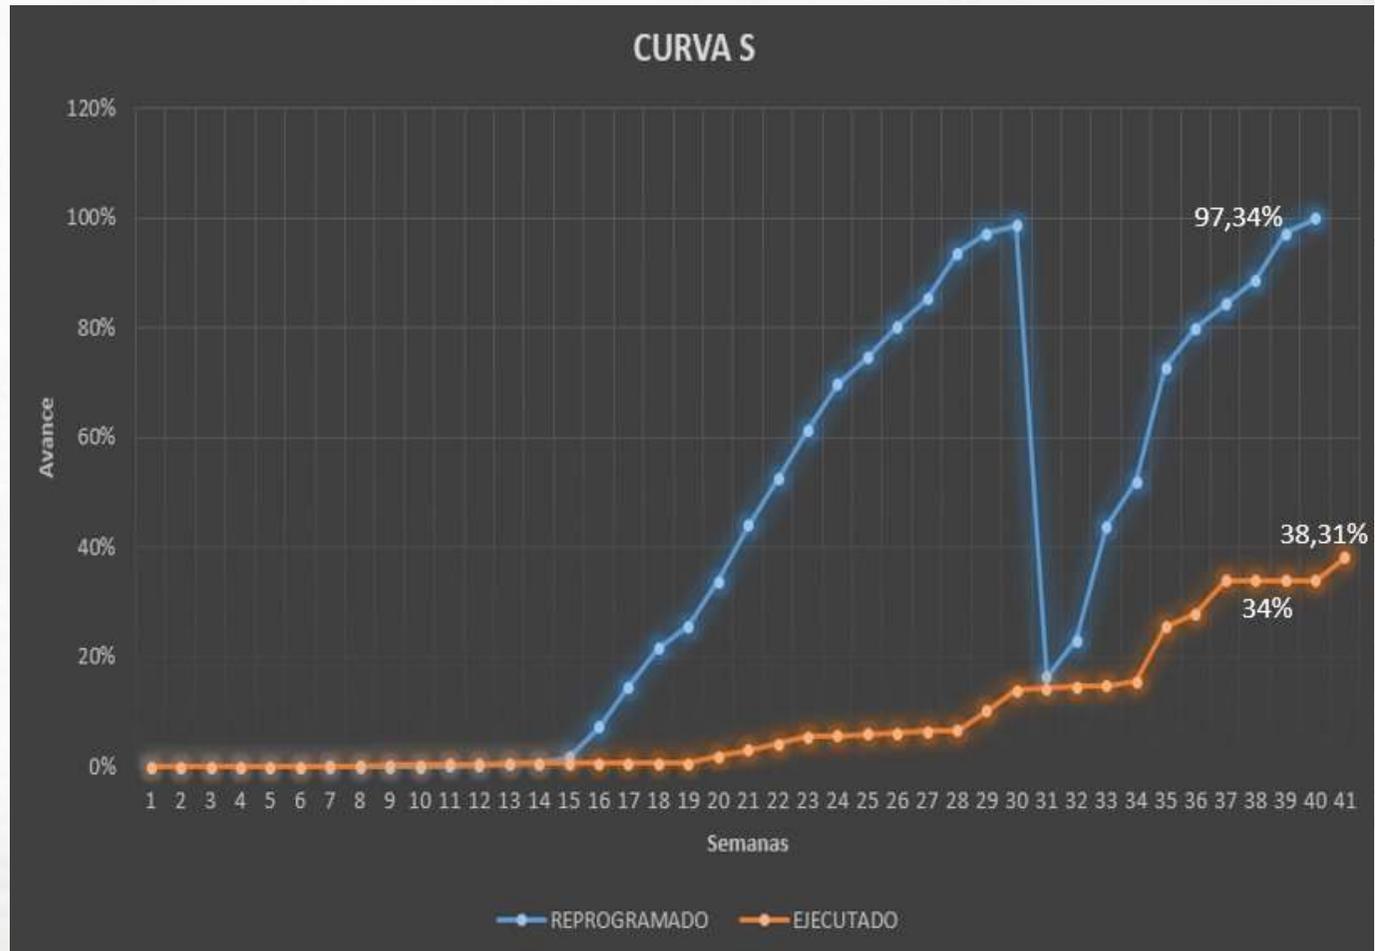

4. ALERTAS DEL PROYECTO

A. Estado presunto incumplimientos con fechas de audiencias realizadas y programadas

Resolución 092 de 2024 apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Obras LP-ADS-008-2023, de 13 de marzo de 2024

Sesión 1 _ 20-03-2024, 9:00 A.M	Sesión 2 _ 22-03-2024, 10:30 A.M	Sesión 3 _ 12-04-2024, 2:00 P.M	Practica de pruebas en campo	Audiencia 02-08-2024	Audiencia Oral Concentrada_06-08-2024, 3:00 P.M	Audiencia 16-08-2024	Audiencia 23-08-2024
Aplazada por ausencia del representante del garante SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aplazada por ausencia del representante del garante SEGUROS DEL ESTADO S.A	Descargos del Contratista de obra	Plazo máximo hasta el 19-04-2024 (Cumplida el 15-04-2024)	Alegato de conclusión 02 de agosto, se suspende por 1 hora y resuelve recurso de reposición	Alegatos de conclusión, se suspendió la audiencia para revisar lo expresado por el apoderado del Contratista de obra. Se reanudara la audiencia el día 16 de agosto	Se llevo a cabo la lectura de la resolución N°321 de 2024, y posterior a esto se impuso la multa al contratista de obra. Se interpuso recurso de reposición para el día 23 de agosto de 2024	El apoderado del contratista de obra expone sus observaciones haciendo uso del recurso de reposición.

B. Alertas técnicas

- El contrato de obra LP-ADS-008-2023 tenía un plazo inicial de ejecución hasta el 16 de junio de 2024, sin embargo se aprobó una prórroga en tiempo sin adición de recursos por dos meses, con fecha de terminación de 17 de agosto de 2024. Posterior a esto se aprobó una nueva prórroga sin adición de recursos de 2 meses, teniéndose una nueva fecha de terminación para el 18 de octubre de 2024.
- El avance general reportado por la Interventoría CONSORCIO INTER MATEO PEREZ para el día 25 de agosto de 2024, es del **38,31%** y un avance reprogramado en revisión respecto a la nueva prórroga.
- Pendiente por ejecutar el **61,69%**.

ACTIVIDADES DE OBRA: Por situación de orden público, relacionada a presuntas extorsiones al Contratista de obras por grupos al margen de la ley, las actividades fueron suspendidas el 26 de julio de 2024. En la semana 37 de trabajo (culminada el 27 de julio), la cual, fue la última semana de trabajo antes de la paralización, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. **Línea de conducción:** Se realizó la excavación de 900 metros lineales en la línea de conducción para un total de 3770 metros lineales de excavación hasta la fecha, de un total de 7132 metros. Se realizó la instalación de 1970 metros lineales de tubería con su respectivo relleno para un total de 3770 metros lineales.
2. **Tanque Elevado:** Se realizó el armado de acero del cuarto nivel del tanque elevado y formaleteado.
3. **Pozo profundo:** Se realizó la perforación exploratoria del pozo profundo hasta una profundidad de 138 metros.

Actualmente únicamente se está trabajando en el frente del tanque elevado, en donde la última semana se llevó a cabo el armado de acero de las columnas del cuarto al quinto nivel, además se realizó la fundición de las columnas del cuarto al quinto nivel. El contratista de obra manifiesta que en los demás frentes no se han reiniciado las actividades por el temor de los trabajadores ante la situación del orden público. Hay que destacar el acompañamiento de las autoridades competentes (GAULA, Infantería de Marina y Policía) ante la situación del orden público. Se ha realizado un comité de seguridad y un consejo de seguridad con presencia del municipio de Sampués y la Gobernación de Sucre.



4. ALERTAS DEL PROYECTO



Con respecto al pozo en construcción, el especialista hidrogeólogo Antonio Argumedo, encargado de la perforación informó, en comité técnico No. 18 de fecha 13 de agosto de 2024, que de los 200m de profundidad contratados van adelantados 140 m de perforación exploratoria y que solo se encontró una capa de acuífero de espesor de 1 m. En el estudio hidrogeológico del proyecto se determinó la presencia de la capa acuífera a partir de los 115 m.

Posteriormente realizo un nuevo sondeo electico vertical SEV, por parte del perforador, para corroborar resultados de la tomografía y sondeo eléctrico vertical de la consultoría del proyecto y muestran que se presenta una para acuífera a partir de los 250 metros.

El especialista recomendó culminación de la perforación exploratoria hasta los 200 metros, realizar la columna litológica, registro eléctrico y prueba de bombeo a pozo abierto. Posteriormente contemplar la posibilidad de continuar realizando la exploración del pozo hasta una profundidad hasta los 350 metros para garantizar un mayor espesor de la capa acuífera.

En mesa virtual de 14 de agosto de 2024 con presencia de Contratista, Interventoría, entidad Contratante y el supervisor de zona norte del MVCT, Dr. Freddy Lozano, se exponen las consideraciones técnicas del pozo profundo y se acuerda desarrollar las recomendaciones del especialista hidrogeólogo de continuar exploración hasta los 200m y determinar las características del acuífero con recomendación de seguir explorando hasta los 250m con métodos mas eficientes que demanden menor tiempo de perforación.

4. ALERTAS DEL PROYECTO

C. Plan de contingencia

A continuación se presentan las actividades adoptadas por el contratista en su plan de contingencia, teniendo en cuenta cuadrillas, horarios y equipos mecánicos.

Frente	Horario	Personal	Maquinaria	Cumplimiento
Tanque	7:00 A.M – 6:00 P.M	Inicialmente habían 9 trabajadores, actualmente hay 14 trabajadores	-	Con respecto al plan de Contingencia y a los avances del contratista de obra, se puede decir que, este no a cumplido a cabalidad lo propuesto.
Línea de Conducción	7:00 A.M – 6:00 P.M	Inicialmente habían 15 trabajadores, actualmente hay 45 trabajadores	2 compactadores tipo canguro, Minicargador	
Pozo	6:00 A.M – 7:30 P.M	Operarios de la maquina perforadora	Maquina perforadora	

5. ESTADO DE POLIZAS

ACTO ADMINISTRATIVO	POLIZA	APROBACION
FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	CUMPLIMIENTO N° 75-44-101133377 – ANEXO 0	RESOLUCIÓN N° 684 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 75-40-101049948- ANEXO 2	
	POLIZA TODO TODO RIESGO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE No. CG-100000155	RESOLUCION N° 004 DE 2024
ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO N° 75-44-101133377 – ANEXO 2	RESOLUCIÓN N° 052 DE 2024
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 75-40-101049948- ANEXO 2	
OTROSI No.2	POLIZA TODO TODO RIESGO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE No. CG-100000155 PENDIENTES POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RCE DE OTRO SI No. 2	RESOLUCIÓN N° 232 DE 2024



5. POLIZAS



- Las pólizas de la Interventoría con novedad de prórroga fueron radicadas en la Entidad Contratante y fue aprobada mediante Resolución No. 276 del 2024.
- Con respecto al contratista de obra, radico la póliza Todo Riesgo según OTROSI No.2. Las pólizas según de cumplimiento y RCE del OTROSI 2, el contratista de obra manifiesta que la aseguradora esta solicitando las actas de la audiencia del Proceso Administrativo Sancionatorio. Desde la Entidad se esta analizando dicha situación, ya que dicho proceso sancionatorio esta en curso.
- Las pólizas con respecto a la nueva Prorroga de dos meses están pendientes por entregar.

5. INFORMES DE INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL	PERIODO	ENTREGADO POR INTERVENTORIA	APROBADO POR SUPERVISIÓN
N°1	16/11/2023-15/12/2023	SI	SI
N°2	16/12/2023-15/01/2024	SI	SI
N°3	16/01/2024-15/02/2024	SI	SI
N°4	16/02/2024-15/03/2024	SI	SI
N°5	16/03/2024-15/04/2024	SI	SI
N°6	16/04/2024-15/05/2024	SI	SI
N°7	16/05/2024-15/06/2024	SI	SI
N°8	16/06/2024-15/07/2024	SI	SI
N°9	16/07/2024-15/08/2024	SI (27/08/2024)	En revision

7. ESTADO DE CARGUE AL SIGEVAS

2-2019-193 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE

		+ Informes de Interventoría:					Resumen		
	Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	<input checked="" type="checkbox"/>			
Actas de Reunión	INFORME N 8 INTERVENTORIA	01/08/2024	INFORME N 8 INTERVENTORIA		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Documentos Contractuales	INFORME N 7	15/07/2024	INFORME INTERVENTORIA N 7		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Informes de Interventoría	INFORME MENSUAL # 6	05/06/2024	INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Informes de Comision	PROGRAMACION DE OBRA	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Reformulaciones	ENSAYOS	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Otros Documentos Legales	ENSAYOS CONTRATISTA OBRA	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Oficios Recibidos	BITACORA	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Lista de Chequeo	COMITE S TECNICOS	05/06/2024	ANEXOS INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Presentación Proyectos Comite	OFICIOS ENVIADOS	05/06/2024	ANEXOS INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Oficios Enviados	OFICIOS RECIBIDOS AGUAS DE SUCRE	05/06/2024	ANEXOS INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ficha de Evaluación	SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Acta de Comité	SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Proyecto con Concepto - Viabilidad	SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Informes de Supervision Seguimiento	SEGUIMIENTO PLAN DE SST	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Informe Supervisión Consultoría	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Registro Fotográfico	INFORME MENSUAL #5	07/05/2024	DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>			

7. ESTADO DE CARGUE AL SIGEVAS

2-2019-193 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE

+ Otros Documentos Legales: Resumen									
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por					
OTRO SI N 3	26/08/2024	OTRO SI N 3 OBRA		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
OTRO SI N 2 INTERVENTORIA	26/08/2024	OTRO SI N 2 INTERVENTORIA		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
OTROSÍ No.02_Contrato de Obra	23/06/2024	OTROSÍ No.02_Contrato de Obra		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
OTROSÍ No.01_Contrato de Interventoría	23/06/2024	OTROSÍ No.01_Contrato de Interventoría		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
CTA ACLACIÓN A VEEDORES LUGAR POZO MATEO PEREZ	18/04/2024	Solicitada en Comite Social 3		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
CTA SOCIALIZACION PROYECTO MATEO PEREZ EN SEGOVIA	18/04/2024	Solicitada en Comite Social 3		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
Presupuesto de Obra	17/04/2024	Propuesta ganadora		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
Plan de inversión de Anticipo	11/04/2024	Plan de inversion anticipo Mateo perez		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
Reprogramacion de obras	08/04/2024	Aprobada por Interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
Flujo de caja reprogramacion	08/04/2024	Aprobada por interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
Programacion Project	08/04/2024	Aprobada por interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
Relacion de equipo y maquinaria minima	08/04/2024	Aprobado por Interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input type="checkbox"/>				
Programa de Adaptacion a la Guía Ambiental - PAGA	08/04/2024	Aprobado por la Interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				
Presupuesto PAGA	08/04/2024	Aprobado por Interventoria		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>				

7. ESTADO DE CARGUE AL SIGEVAS

2-2019-193 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE

+ Informes de Supervision Seguimiento:		Resumen					
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORME SUPERVISION N 8	01/08/2024	INFORME SUPERVISION N 8		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME N° 7	23/07/2024	INFORME DE SUPERVISION N° 7		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME DE SUPERVISION #6	04/06/2024	INFORME DE SUPERVISION #6		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME DE SUPERVISION #5	07/05/2024	INFORME DE SUPERVISION #5		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME DE SUPERVISION #4	25/04/2024	INFORME DE SUPERVISION #4		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Informe Supervision presunto incumplimiento	25/04/2024	Informe Supervision presunto incumplimiento del Contrato de obras		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME DE SUPERVISION # 3	10/04/2024	INFORME DE SUPERVISION # 3		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME DE SUPERVISION # 2	13/02/2024	INFORME DE SUPERVISION # 2		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISION 1	13/02/2024	INFORME DE SUPERVISION 1		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISION PARA MVCT	13/02/2024	INFORME DE SUPERVISION PARA MVCT		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISION INICIAL ision N° 1	11/01/2024	Informe ejecutivo de Supervision		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		

7. ESTADO DE CARGUE AL SIGEVAS

2-2019-193 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE

+ Acta de Comité:		Resumen						
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE N 12	26/08/2024	COMITE N 12		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE N° 13	26/08/2024	COMITE N° 13		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE N° 14	26/08/2024	COMITE N° 14		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE N° 15	26/08/2024	COMITE N° 15		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE N° 16	26/08/2024	COMITE N° 16		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE N° 17	26/08/2024	COMITE N° 17		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	24/06/2024			Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reunión extraordinaria	23/06/2024	Reunión extraordinaria		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE_11_11-06-2024	11/06/2024	COMITE_11_11-06-2024		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE_10_22-05-2024	22/05/2024	COMITE_10_22-05-2024		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE_6_12-03-2024	24/04/2024	COMITE_6_12-03-2024		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE_7_20-03-2024	24/04/2024	COMITE_7_20-03-2024		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE_8_8-04-2024	24/04/2024	COMITE_8_8-04-2024		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE_9_15-04-2024	24/04/2024	COMITE_9_15-04-2024		Alvaro Marino Marengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE_5_09-02-2024	06/03/2024	COMITE_5_09-02-2024		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE_2_26-01-2024	13/02/2024	COMITE_2_26-01-2024		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE_3_31-01-2024	13/02/2024	COMITE_3_31-01-2024		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE_4_02-02-2024	13/02/2024	COMITE_4_02-02-2024		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMITE N°1	15/01/2024	COMITE N°1		Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

COMPROMISOS

1	Entrega de pólizas actualizadas con OTRO SI 2	Contratista	14 de agosto (NO CUMPLIDO)
---	-----------------------------------------------	-------------	----------------------------

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

CUR	SALDO EN FIDUCIA (CON RENDIMIENTOS) A JUNIO DE 2024	SALDO NETO DISPONIBLE (SIN RENDIMIENTOS NI GMF NI RETEFUENTE) A JUNIO DE 2024	AVANCE FISICO DEL VEINTE (20%), VALOR Y PERIODO	FECHA ESTIMADA DE PAGO	NUEVO SALDO EN FIDUCIA (SIN RENDIMIENTO)	RECURSOS POR SOLICITAR (3ER TRIMESTRE/2024)- 30%
1341	\$ 0	\$ 0	(\$ 962.013.352,60 julio de 2024) Correspondientes al 20%	14/08/2024	\$ 0	\$ 1.443.020.028,90

MUCHAS GRACIAS

Síguenos en nuestra página web y redes sociales



@aguasdesucre



<https://aguasdesucre.com/>



Aguas de Sucre



@pdasucre



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-ADS-009-2023
CUYO OBJETO ES: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE
CAYO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE**



GENERALIDADES Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA



GENERALIDADES	
CONTRATO	No. LP-ADS-009-2023
OBJETO	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAYO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO DEL CAYO R/L BETTY GRACIELA CASTRO ESCORCIA
VALOR INICIAL	\$3.739.002.271,00 M/CTE
PLAZO	8 MESES
FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION	12 DE AGOSTO DE 2024
AVANCE TEMPORAL (20-03-2024)	259 DÍAS (96,64%)

PORCENTAJE EJECUTADO Y PROGRAMADO, ACTIVIDADES DE OBRA A FECHA 08 DE AGOSTO DE 2024

ESTADO DEL PROYECTO: SE CELEBRA COMITÉ DE SEGUIMIENTO EL DÍA 26/08/2024 PARA ANALIZAR EL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO Y EL REINICIO DEL MISMO

PORCENTAJE FISICO CON CORTE 08-08-2024		
COMPONENTE	PORCENTAJE FISICO PROGRAMADO (%)	PORCENTAJE FISICO EJECUTADO (%)
1. POZO PROFUNDO (PRELIMINARES)	100	90.38
2. PERFORACION POZO	100	64.60
3. EQUIPOS DE BOMBEO Y ACCESORIOS	100	0.00
4. CONTRUCCION DE CASSETAS	18	22.73
5. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	100	83.98
6. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 165 M3	5	15.47
7. PLANTA DE TRATAMIENTO	13	0.00
8. REDES DE DISTRIBUCION	72	44.24
9. SISTEMA ELECTRICO MEDIA Y BAJA TENSION	0	0.00
10. INSTALACIONES DE BAJA TENSION	0	0.00

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 08-08-2024
33.50%

PORCENTAJE FISICO PROGRAMADO PARA EL 08-08-2024
98%

PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 08-08-2024
64.50%

a. ESTADO PRESUNTO INCUMPLIMIENTOS CON FECHAS DE AUDIENCIAS REALIZADAS Y PROGRAMADAS:

- El día 23 de julio de 2024 se envió comunicado G100-897-2024 mediante el cual se cita a una audiencia oral concentrada en el Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual, Contrato de Obra No. LP-ADS-009-2024, para el día 29 de julio del 2024 a las 03:00 p.m.
- El día 01 de agosto de 2024 se envió comunicado G100-941-2024 mediante el cual se reprograma la audiencia oral concentrada del Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual, Contrato de Obra No. LP-ADS-009-2024, para el día 06 de agosto del 2024 a las 10:00 a.m.

b. ALERTAS TÉCNICAS PROYECTO:

- Nuevo Trazado y Redes tubería de planteo de las redes de Distribución. (El Contratista de obra, inició con las actividades de instalación Distribución). **Superado, NO GENERÓ ADICION PRESUPUESTAL.**

c. PLAN DE CONTINGENCIA, PERMISOS AMBIENTALES, ETC.

- ENTREGADO POR LA INTERVENTORIA, A LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE, SEGUIMIENTO, **Aprobado por interventoría de obra mediante comunicado OF-039 R 1312 19/06/2024, avance de obra 33.50% con respecto a programado de 98.00%, se enviara comunicado a la interventoría solicitando rendimiento de obra en el tiempo ejecutado hasta la fecha de suscripción de la suspensión.**

PERMISOS AMBIENTALES:

- **Permiso de Aprovechamiento Forestal: Superado, mediante RESOLUCIÓN N° 239, 07/06/2024.**
- **Permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas. Superado, mediante RESOLUCIÓN N° 225, 24/05/2024.**



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO



- El PAC N°1 se enviara como fecha máxima 26 de agosto de 2024.

CUR	SALDO EN FIDUCIA (CON RENDIMIENTOS) A MAYO DE 2024	SALDO NETO DISPONIBLE (SIN RENDIMIENTOS NI GMF NI RETEFUENTE) A MAYO DE 2024	AVANCE FISICO DEL VEINTE (20%), VALOR Y PERIODO	FECHA ESTIMADA DE PAGO	NUEVO SALDO EN FIDUCIA	RECURSOS POR SOLICITAR (3ER TRIMESTRE/2024) ACLARAR/REVISAR PORCENTAJE A SOLICITAR (30%)
CUR 1386	\$92,675,591.10	\$103.210,503.95	\$809,584,181.60	10/09/2024	\$ 195,886,095.05	\$1,214,376,272.40

- Se envía comunicado G100-895-2024 22/07/2024 solicitando cuenta de cobro a la alcaldía de San Marcos para PAC del 20% en el mes de julio 2024.
- Se envía comunicado G100-906-2024 24/07/2024 reiterando cuenta de cobro a la alcaldía de San Marcos para PAC del 20% en el mes de julio 2024.
- Se envía comunicado G100-915-2024 29/07/2024 a MVCT sobre seguimiento solicitud cuenta de cobro PAC del 20% en el mes de julio 2024.
- Se envía comunicado G100-970-2024 12/08/2024 a MVCT solicitando cuenta de cobro a la alcaldía de San Marcos para PAC del 20% en el mes de agosto 2024.
- Se recibe respuesta por parte de la alcaldía municipal de San Marcos, y se realiza envió de los documentos pertinentes para la solicitud del PAC del 20% el día 17 de agosto de 2024.
- Se reciben observaciones por parte del MVCT a través de correo electrónico el día 21 de agosto de 2024, las cuales fueron subsanadas y remitidas mediante correo electrónico el día mismo día. Se esta a la espera de respuesta y/o aprobación.

- COMPONENTE TÉCNICO, este componente encontramos los diseños, los equipos de topografía, maquinaria, herramientas y materiales que se requieran para la construcción del alcantarillado. Se trabajarán en 3 frentes de trabajo destinados enfocadas en las siguientes actividades: 1) Suministro e instalación de redes 2) Construcción de tanque elevado 3) Perforación de pozo y cerramiento perimetral

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN RESTANTE	UND	CANT	RENDIMIENTO	MATERIAL	EQUIPO	M de O
TOTAL, TIEMPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y	160 DIAS						
PRELIMINARES PARA EVALUACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE POZO PROFUNDO SEV. 02	49 DIAS	ML	120	2.45 ML/DIA	N/A	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA INICIAL (LABORATORIO)	CUADRILLA POZO PROFUNDO
					N/A	COMPRESOR PARA DETERMINAR LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE EQUIPO BOMBEO	CUADRILLA POZO PROFUNDO
PERFORACION Y CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SEV. 02	34 DIAS	ML	120	0.21 ML/DIA	<ul style="list-style-type: none"> • TUBERIA CIEGA DE 8" PVC ROSCADA SDR 26 • TUBERIA RANURADA DE 8" PVC ROSCADA SDR 26 • TUBERIA DE ALIMENTACION DE GRAVILLA DE 2" EN PVC • GRAVILLA PARA FILTRO • TAPA PARA EL POZO DE D=8" EN 	MAQUINA PERFORADORA DE POZO	CUADRILLA POZO PROFUNDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS POZO PROFUNDO SEV. 02	13 DIAS	UND	1	0.08 UN/DIA	N/A	MOTOBOMBA EN ACERO INOXIDABLE SUMERGIBLE, MULTITAPAS, ACOPLADA Q=85 GPM, 6",	CUADRILLA POZO PROFUNDO
					N/A	ACCESORIOS DEL POZO	CUADRILLA POZO PROFUNDO
CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS	89 DIAS	M2	23	0.26 M2/DIA	<ul style="list-style-type: none"> • CONCRETO PLACAS Y COLUMNAS • ACERO • BLOQUE DE CEMENTO • PUERTA Y VENTANA 	HERRAMIENTA MENOR	CUADRILLA MAMPOSTERIA
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA ALTURA TOTAL H=2.5M.	15 DIAS	ML	15	1.00 ML/DIA	<ul style="list-style-type: none"> • ACERO • CONCRETO CIMENTACION • MAMPOSTERIA • MALLA CERRAMIENTO 	HERRAMIENTA MENOR	CUADRILLA MAMPOSTERIA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 165 M3	155 DIAS	M3	320	2.06 M3/DIA	<ul style="list-style-type: none"> • EXCAVACIONES • CONCRETO PLACAS Y COLUMNAS • ACERO 	<ul style="list-style-type: none"> • MEZCLADORA DE CONCRETO • PLUMA GRUA • FORMALETAS 	CUADRILLA ESTRUCTURAS
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	81 DIAS	M2	25	0.31 M2/DIA	<ul style="list-style-type: none"> • CONCRETO PLACA • ACERO 	HERRAMIENTA MENOR	CUADRILLA ESTRUCTURAS


PLANES DE CONTINGENCIA

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN RESTANTE	UND	CANT	RENDIMIENTO	MATERIAL	EQUIPO	M de O
TOTAL, TIEMPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y	160 DIAS						
PRELIMINARES PARA EVALUACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE POZO PROFUNDO SEV. 02	49 DIAS	ML	120	2.45 ML/DIA	N/A	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA INICIAL (LABORATORIO)	CUADRILLA POZO PROFUNDO
					N/A	COMPRESOR PARA DETERMINAR LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE EQUIPO BOMBEO	CUADRILLA POZO PROFUNDO
PERFORACION Y CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SEV. 02	34 DIAS	ML	120	0.21 ML/DIA	<ul style="list-style-type: none"> • TUBERIA CIEGA DE 8" PVC ROSCADA SDR 26 • TUBERIA RANURADA DE 8" PVC ROSCADA SDR 26 • TUBERIA DE ALIMENTACION DE GRAVILLA DE 2" EN PVC • GRAVILLA PARA FILTRO • TAPA PARA EL POZO DE D=8" EN 	MAQUINA PERFORADORA DE POZO	CUADRILLA POZO PROFUNDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS POZO PROFUNDO SEV. 02	13 DIAS	UND	1	0.08 UN/DIA	N/A	MOTOBOMBA EN ACERO INOXIDABLE SUMERGIBLE, MULTITAPAS, ACOPLADA Q=85 GPM, 6",	CUADRILLA POZO PROFUNDO
					N/A	ACCESORIOS DEL POZO	CUADRILLA POZO PROFUNDO
CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS	89 DIAS	M2	23	0.26 M2/DIA	<ul style="list-style-type: none"> • CONCRETO PLACAS Y COLUMNAS • ACERO • BLOQUE DE CEMENTO • PUERTA Y • VENTANA 	HERRAMIENTA MENOR	CUADRILLA MAMPOSTERIA
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA ALTURA TOTAL H=2.5M.	15 DIAS	ML	15	1.00 ML/DIA	<ul style="list-style-type: none"> • ACERO • CONCRETO CIMENTACION • MAMPOSTERIA • MALLA CERRAMIENTO 	HERRAMIENTA MENOR	CUADRILLA MAMPOSTERIA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.65 M3	155 DIAS	M3	320	2.06 M3/DIA	<ul style="list-style-type: none"> • EXCAVACIONES • CONCRETO PLACAS Y COLUMNAS • ACERO 	<ul style="list-style-type: none"> • MEZCLADORA DE CONCRETO • PLUMA GRUA • FORMALETAS 	CUADRILLA ESTRUCTURAS
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	81 DIAS	M2	25	0.31 M2/DIA	<ul style="list-style-type: none"> • CONCRETO PLACA • ACERO 	HERRAMIENTA MENOR	CUADRILLA ESTRUCTURAS

CURVA "S"

- En lo que respecta al avance financiero del proyecto es del cero por ciento (0%), el contratista de obra no ha presentado actas parciales de cobro hasta la fecha, sin embargo, según la ejecución actual del proyecto, este se encuentra elaborando la primera cuenta de cobro parcial según los porcentajes establecidos dentro de las consideraciones de pago del CUR 1386.

CURVA S DE EJECUCIÓN DE OBRA		
Mes	% Programado	% Ejecutado
15/11/2023	0.00%	0.00%
15/12/2023	0.13%	1.33%
15/01/2024	0.13%	1.33%
15/02/2024	0.15%	1.37%
15/03/2024	0.19%	2.77%
15/04/2024	1.14%	3.59%
15/05/2024	12.96%	10.11%
15/06/2024	29.05%	19.41%
15/07/2024	42.48%	27.27%
8/08/2024	98.00%	33.50%

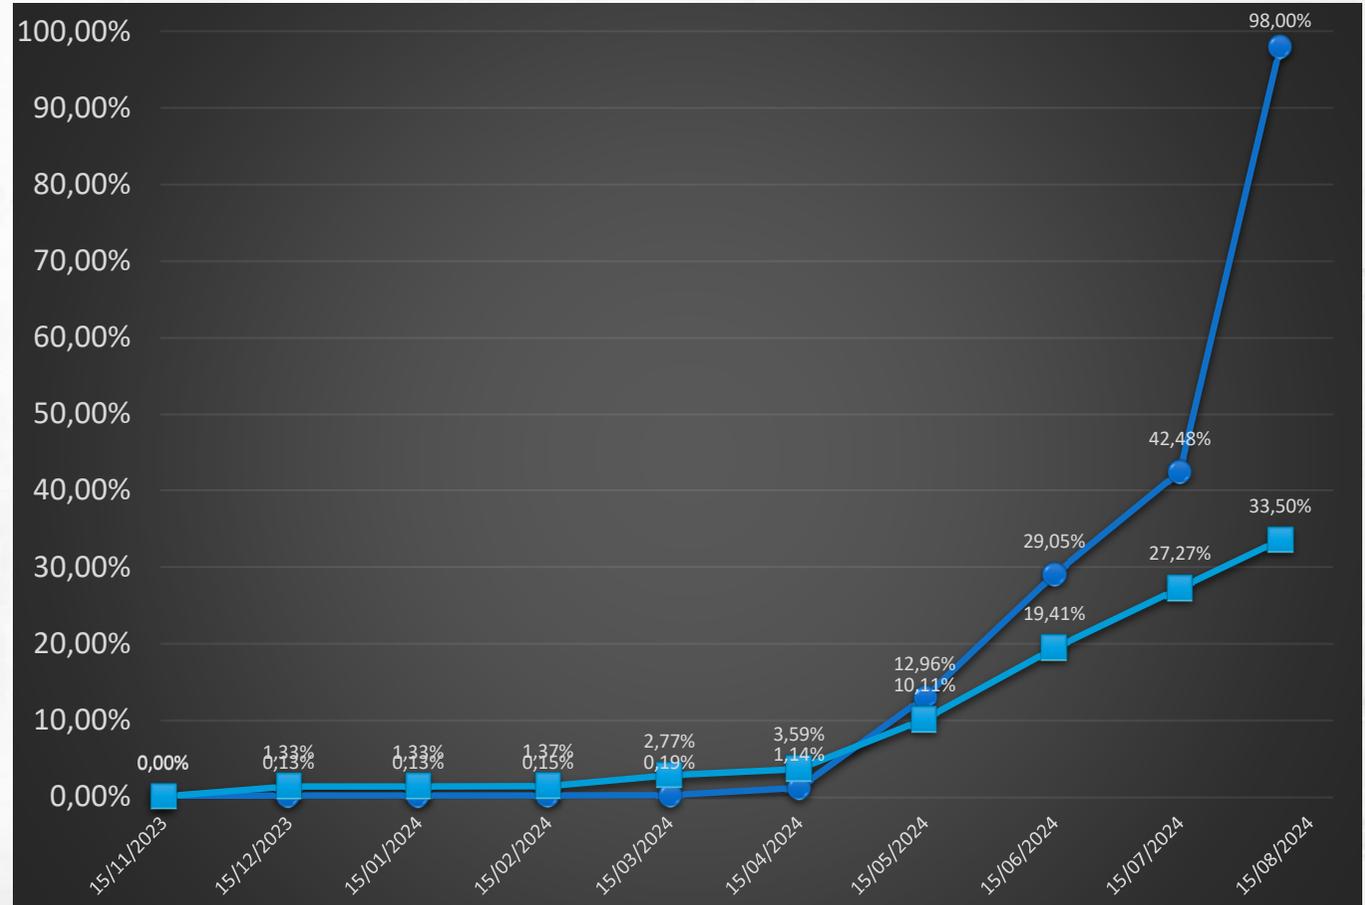

- 1. Perforación de pozo:** La perforación del pozo se encuentra completada en su totalidad, teniendo una profundidad total de 120 metros, la cual inicio con un diámetro de exploración de 6-1/2". Posteriormente se realizo una ampliación de diámetro a 8", finalizada esta se llevo a cabo ampliación de diámetro a 10" y finalmente se realizo ampliación de diámetro a 14". (90.38% de avance)
- 2. Cerramiento en malla eslabonada:** El cerramiento perimetral esta próximo a ser culminado, donde se encontraba como tramo faltante el que se encontraba en cercanías a la zona de perforación, ya que, se requería de un área para realizar el retiro de los materiales provenientes de la perforación, además, falta la instalación de pisa malla y puerta de acceso. (83.98% de avance)
- 3. Actividades preliminares para sistema de cloración – excavación para losa de cimentación:** Una vez terminada las actividades de excavación referentes al tanque de almacenamiento, se da continuidad con la excavación para la losa de cimentación del sistema de cloración y la excavación de las zapatas para la caseta de control. (22.73% de avance)
- 4. Excavaciones para instalación de tubería:** Se continua con la actividad de figurado, armado e instalación de acero de refuerzo para la estructuras de concreto del proyecto. (22.73% de avance)
- 5. Excavaciones para instalación de tubería:** Se continua con la actividad de excavación, para la instalación de las redes de distribución, llevando a cabo dicha actividad en una longitud aproximada de 5.920 metros, que es el valor instalado de la tubería. (83.28% de avance) (44.24% de avance)
- 6. Suministro e instalación de tubería:** Se continua con la actividad de instalación de tubería en PVC, donde el contratista de obra dispone de la totalidad de la tubería en sitio (aproximadamente 11.721 m de tubería de PVC de 2", 3" y 4") y hasta la fecha ha realizado la instalación de aproximadamente 5.920 m de tubería. (44.24% de avance)
- 7. Relleno y compactación con material seleccionado del sitio:** Se continua con la actividad de suministro e instalación de relleno con material del sitio, donde se ha realizado esta actividad en una longitud aproximada de aproximadamente 5.920 m de tubería, que es valor instalado de la tubería. (44.24% de avance)

Perforación de pozo



Cerramiento en malla eslabonada



Actividades preliminares para sistema de cloración – excavación para losa de cimentación



Suministro e instalación de acero de refuerzo



Excavaciones para instalación de tubería



Suministro e instalación de tubería



Relleno y compactación con material seleccionado del sitio





FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DE OBRAS.



- **Fecha estimada el día 12 de agosto de 2024, según otrosí N°2 suscrito el 15 de julio de 2024.**

Esta modificatoria se suscribe con el fin de garantizar la ejecución del contrato de obra, para que se cumpla con los fines establecidos como necesidad y plasmados en los Estudios Previos, y cumplir con el objeto contractual, evitar la paralización y afectación grave de la futura prestación de servicios. Además, no se pueden otorgar los cinco (05) meses de adición de tiempo que solicita el contratista de obra e interventoría, ya que, la fecha de vencimiento del convenio CUR N°1386 de 2023, esta estipulada para el día 12 de agosto de 2024, por consiguiente, se considera necesaria la extensión del tiempo contractual hasta dicha fecha, ya que no se puede extender por fuera de la misma.

- **Fecha INDEFINIDA, según acta de suspensión N°1 suscrito el 08 de agosto de 2024.**

Esta acta de suspensión se suscribe con el fin de mantener la cobertura de plazo contractual del proyecto, ya que no se tiene definido el tiempo requerido para la suscripción de la prórroga de tiempo del CUR 1386, y, en vista de la proximidad de la fecha de terminación del mismo, se decide suspender el proyecto de manera indefinida hasta que se suscriba el acta modificatoria de tiempo del CUR 1386.

- **Fecha estimada para el día 30 de agosto de 2024, según comité de seguimiento 26 de agosto de 2024, asunto: reinicio de obra.**

Este comité de seguimiento se llevo a cabo con el objetivo de analizar el estado actual del proyecto y las razones por las cuales se decidió suspender el mismo, donde la razón principal de la suspensión estaba enmarcado por la incertidumbre del tiempo requerido para la suscripción de la prórroga de tiempo del CUR 1386, que, una vez una vez celebrado el OTROSI N°1 al CUR 1386, donde se prórroga nueve (09) meses; que, mediante correo electrónico del día 20 de agosto de se cita a los contratista de obras realizar el comité de seguimiento para el día 21 de agosto de 2024, este no se pudo presentar debido a problemas de salud del R/L de interventoría, por lo que se reprogramo para el día 26 de agosto de 2024; que una vez celebrado, todas las partes ven convenientes reiniciar las actividades de obra, y surge como compromiso la solicitud de ampliación de tiempo de ambos contratos, a razón de cuatro (04) meses y dos (02), tiempo restante que no fue posible aprobar debido a la fecha de vencimiento del CUR 1386; así mismo, se prepara visita de obra para el día 27 de agosto de 2024, para mirar las condiciones actuales de la obra.



REPORTE AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO



- El día 23 de julio de 2024 se envió comunicado G100-897-2024 mediante el cual se cita a una audiencia oral concentrada en el Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual, Contrato de Obra No. LP-ADS-009-2024, para el día 29 de julio del 2024 a las 03:00 p.m
- El día 01 de agosto de 2024 se envió comunicado G100-941-2024 mediante el cual se reprograma la audiencia oral concentrada del Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual, Contrato de Obra No. LP-ADS-009-2024, para el día 06 de agosto del 2024 a las 10:00 a.m. Dicha reprogramación, se presenta debido a situaciones ajenas, que generaron fallas en la conexión de internet, lo cual no permitió llevar a cabo la realización de la diligencia, con el fin de instalar y dar apertura al Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual que se adelantara por presunto incumplimiento en contra del CONSORCIO EL CAYO.
- Una vez concertada la audiencia oral el 06 de agosto de 2024, se da inicio al proceso de incumplimiento y se ordeno la practica de unas pruebas, con un tiempo aproximado de 15 días para reiniciar la audiencia.

ESTADO DE LAS PÒLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RCE, CONTRATO DE OBRA	
Póliza de Cumplimiento N°75-44-101132935 Anexo 03, según otro sí N°2	Aprobada mediante Resolución 312 de 2024, 01/08/2024.
Póliza de RCE, No 75-40-101049815, anexo 2, según acta otro sí N°2	Aprobada mediante Resolución 312 de 2024, 01/08/2024.
Póliza Todo Riesgo, No 75-40-101049815, anexo 2, según acta otro sí N°2	Aprobada mediante Resolución 315 de 2024, 05/08/2024.
ESTADO DE LAS PÒLIZAS DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Póliza de Cumplimiento N° CRC-100014850, Anexo 2, según acta otro sí N°2	Aprobada mediante Resolución 313 de 2024, 02/08/2024.

Se deben actualizar las vigencias según acta de reinicio N°1.

MUCHAS GRACIAS

Síguenos en nuestra página web y redes sociales



@aguasdesucre



<https://aguasdesucre.com/>



Aguas de Sucre



@pdasucre



“CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE”

GENERALIDADES Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

GENERALIDADES	
CONTRATO	No. LP-ADS-010-2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO REDES SANTIAGO R/L ISMAEL SEGUNDO HERNÁNDEZ ESCOBAR
VALOR INICIAL	\$9.709.306.024,00
PLAZO	9 MESES
FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	15 DE AGOSTO DE 2024
OTROSÍ N°1	15 DE AGOSTO DE 2024
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	12 DE OCTUBRE DE 2024
AVANCE TEMPORAL (27-08-2024)	282 DÍAS (86,23%)

COMPONENTES ESENCIALES DE OBRAS DENTRO DEL CONTRATO

RESUMEN AVANCES

PORCENTAJE FISICO CON CORTE 27-08-2024	
ITEM	PORCENTAJE
PRELIMINARES	100,00%
EXCAVACIONES Y RELLENOS	61,86%
REDES COLECTORES SUMINISTRO	65,68%
REDES COLECTORES INSTALACIÓN	79,60%
CONEXIONES DOMICILIARIAS	49,46%
CÁMARA DE CAÍDA	0,00%
CÁMARAS DE INSPECCIÓN	38,81%
TOTAL	60,40%

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 27-08-2024
60,40%

PORCENTAJE FISICO REPROGRAMADO PARA EL 27-08-2024
99,00% (ESPERANDO REPROGRAMACIÓN CON OTRSÍ N°1)

PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 27-08-2024
38,60%

PORCENTAJE AVANCE TEMPORAL
99,00%



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO



- El PAC N°2 se envió el día 12 de agosto de 2024.

CUR	SALDO EN FIDUCIA (CON RENDIMIENTOS) A JUNIO DE 2024	SALDO NETO DISPONIBLE (SIN RENDIMIENTOS NI GMF NI RETEFUENTE) A JUNIO DE 2024	AVANCE FISICO DEL CUARENTA (40%), VALOR Y PERIODO	FECHA ESTIMADA DE PAGO	NUEVO SALDO EN FIDUCIA SIN RENDIMIENTOS	RECURSOS POR SOLICITAR (3ER TRIMESTRE/2024)
CUR 1364	\$166.111.516,76	\$123.856.157,70	(\$4.321.469.153,2 0 julio de 2024)	13/08/2024	\$6.774.171.404,26	\$2.160.734.576,00

- COMPONENTE TÉCNICO, este componente encontramos los diseños, los equipos de topografía, maquinaria, herramientas y materiales que se requieran para la construcción del alcantarillado. Se trabajarán en 5 frentes de trabajo cada uno estará compuesto por 5 cuadrillas, distribuidos de la siguiente manera:

FRENTE DE TRABAJO			
ACTIVIDAD	PERSONAL	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HERRAMIENTAS
Excavación a maquina	1 operario de retroexcavadora	Descapote de instalaciones domiciliarias. Excavación tubería principal. Excavación manjoles. Rellenos de con material común.	1 Retroexcavadora
Excavación manual	6 ayudantes	Excavaran las instalaciones domiciliarias. Relleno y compactación de material seleccionado (0.3m)	Palas, picos, bugís Compactador tipo canguro.
Instalación de tuberías y accesorios	Oficiales (2) Ayudantes (8)	Instalaran las tuberías y accesorios en las tuberías principales y domiciliarias. cámaras de caída, encabezaran en los manjoles. Instalación arena de nivelación. Instalación de relleno de relleno inicial	Herramienta menor. Compactador tipo canguro
Manjoles	Oficiales (1) Ayudantes (3)	Construcción de manjoles incluye solado, piso, cañuelas, paredes, tapas, escalera de acceso y resane de entrada de tuberías. Rellenos y compactación alrededor de los manjoles	Mezcladora. Vibrador de concreto Herramienta menor. Compactador tipo canguro
Entibados.	6 ayudantes	Instalación de entibados metálicos en profundidades mayores a 1.5m como lo requiere la normatividad SST en Colombia	Entibados. Madera, Herramienta menor
Registros domiciliarios	Oficiales (1) Ayudantes (2)	Construcción de registro con accesorio de salida	Mezcladora. Vibrador de concreto Herramienta menor



FECHA DE COMITÉ Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN OBRA



Es

- Visita programada para el día 28 de agosto de 2024.
- Las actividades que se ejecutan son:
 - Excavaciones y rellenos
 - Suministro e instalación de redes de alcantarillado
 - Construcción de pozos de inspección
 - Construcción de acometidas domiciliarias

CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS

1. Preliminares

Descripción	Unidad	Contratado	Ejecutado	% Avance
Localización, replanteo y nivelación de tubería	ML	14,782.00	14,782.00	100%

2. Excavaciones y Rellenos

Descripción	Unidad	Contratado	Ejecutado	% Avance
Excavación manual material común	M3	19,330.64	14,125.00	73%
Excavación a máquina material común de 1.5m a 3m	M3	11,272.52	7,556.00	67%
Excavación a máquina prof. >3.0 material común	M3	1,860.29	1,326.00	71%
Bombeo aguas nivel freático y de escorrentía	HORA	1,440.00	890.00	62%
Entibado continuo en madera tipo 2	M2	20,147.66	12,600.00	63%
Entibado metálico en lámina de acero 3/4"	M2	8,773.74	3,056.00	35%
Relleno con material arenoso	M3	4,678.00	1,570.00	34%
Relleno con material seleccionado	M3	7,121.96	5,250.00	74%
Relleno compactado con material común	M3	24,213.83	17,918.24	74%
Evacuación de escombros y material sobrante	M3-Km	65,026.19	45,693.00	70%

CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS

3. Redes Colectores (Suministro)

Descripción	Unidad	Contratado	Ejecutado	% Avance
Tubería alcantarillado PVC de 8"	ML	13,335.00	12,320.00	92%
Tubería alcantarillado PVC de 6"	ML	5,268.00	3,756.00	71%

4. Redes Colectores (Instalación)

Descripción	Unidad	Contratado	Ejecutado	% Avance
Tubería alcantarillado PVC de 8"	ML	13,335.00	12,320.00	92%
Tubería alcantarillado PVC de 6"	ML	5,268.00	3,756.00	71%

5. Conexiones Domiciliarias

Descripción	Unidad	Contratado	Ejecutado	% Avance
Suministro e instalación de silla yee de 8x6"	UN	729.00	466.00	64%
Suministro e instalación de codo PVC sanitario 6x45	UN	878.00	325.00	37%
Suministro e instalación de conector domiciliario en PVC	UN	878.00	466.00	53%

CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS

6. Cámara de Caída

Descripción	Unidad	Contratado	Ejecutado	% Avance
Suministro e instalación de codo PVC alcantarillado 8" x 90"	UN	40.00	0.00	0%

7. Cámaras de Inspección

Descripción	Unidad	Contratado	Ejecutado	% Avance
Concreto solado de 14 Mpa e=0.05m	M3	39.25	15.70	40%
Base para cámara de inspección de 0 a 3 m	M3	148.54	59.42	40%
Cuerpo para cámara de inspección de 0 a 3 m	M3	209.15	83.66	40%
Losa superior para cámara de inspección de 0 a 3 m	M3	40.91	16.37	40%



PLANES DE CONTINGENCIA



- En cuanto al plan de contingencia, se han adoptado horarios de trabajo de 6:00 A.M. a 5:00 P.M., dedicada a las actividades de suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario, construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias, incluyendo registros. Estas actividades se ejecutan en paralelo con cinco equipos de excavación mecánica. Cada cuadrilla está compuesta por 11 personas, incluyendo oficiales y ayudantes, y actualmente hay cinco frentes de obra activos.
- Inicialmente, había dos (2) frentes de obra con 4 trabajadores, los frentes se incrementaron a 5 con once (11) ayudantes.



INCONVENIENTES PRESENTADOS




- Estado presunto incumplimiento: De acuerdo con el contrato de consultoría, se realizó sesión de audiencia el día 26 de agosto de 2024 donde se escucharán los alegatos de conclusión, por solicitud del representante legal se reprogramó audiencia para el día 30 de agosto de 2024 por solicitud del interventor, ya que su apoderado renunció y el nuevo apoderado no conocía el proceso de fondo, y el despacho en aras de ser garantistas y el derecho a la defensa, se aplazó la audiencia.
- Referente al contrato de obra: Se realizó visita de práctica de pruebas el día 02 de agosto de 2024, se revisó si se implementa el plan de choque y sus frentes de obras (5 máquinas realizando excavaciones, suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario, construcción de acometidas domiciliarias y pozos de inspección).



CURVA S DE REPROGRAMACION



CURVA S DE EJECUCIÓN DE OBRA		
SEMANA	% Programado	% Ejecutado
2	0,12%	0,15%
4	0,27%	0,29%
6	0,43%	0,43%
8	0,46%	0,48%
10	0,49%	0,59%
12	0,52%	0,64%
14	0,55%	0,70%
16	0,58%	0,70%
18	5,49%	0,70%
20	10,18%	0,70%
22	11,17%	0,70%
24	17,83%	0,70%
26	29,36%	6,84%
28	41,61%	14,81%
30	54,11%	28,50%
31	60,04%	30,89%
32	66,00%	43,50%
34	77,35%	43,50%
36	86,26%	45,29%
38	95,09%	51,00%
40	99,00%	60,40%

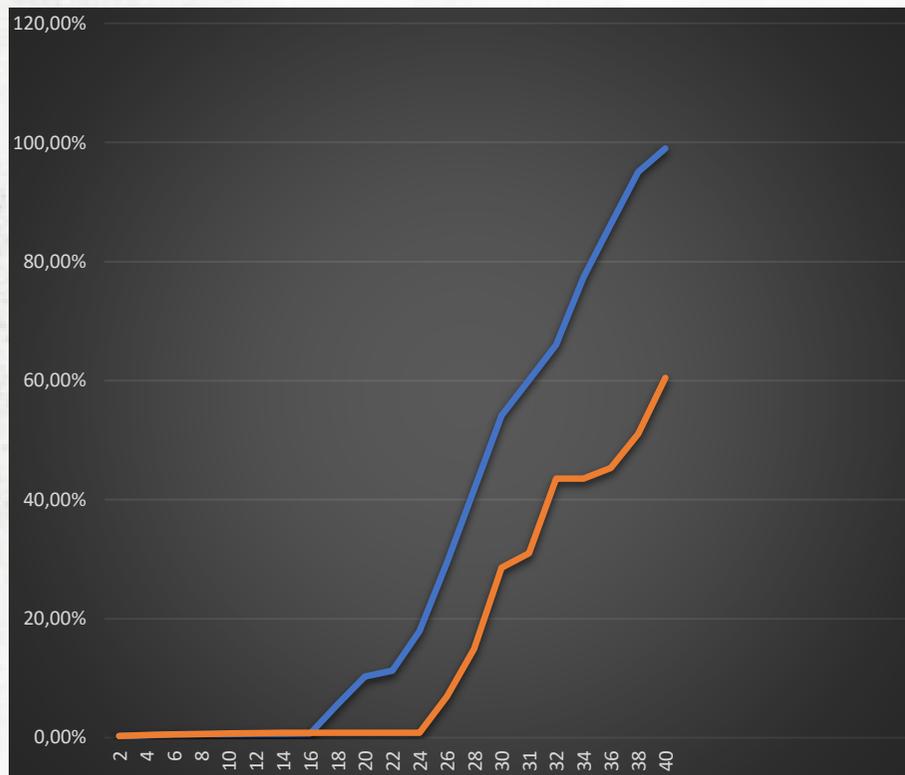

Presupuesto General del Proyecto				\$ 9,709,306,023.78
Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	\$	%	Valor
0	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
2	0.12%	\$ 11,651,167.23	0.09%	\$ 8,738,375.42
4	0.27%	\$ 26,215,126.26	0.18%	\$ 17,476,750.84
6	0.43%	\$ 41,750,015.90	0.27%	\$ 26,215,126.26
8	0.58%	\$ 56,313,974.94	0.36%	\$ 34,953,501.69
10	0.97%	\$ 94,180,268.43	0.45%	\$ 43,691,877.11
12	4.56%	\$ 442,744,354.68	0.54%	\$ 52,430,252.53
14	11.13%	\$ 1,080,645,760.45	0.63%	\$ 61,168,627.95
16	18.84%	\$ 1,829,233,254.88	0.72%	\$ 69,907,003.37
18	26.41%	\$ 2,564,227,720.88	0.81%	\$ 78,645,378.79
20	33.42%	\$ 3,244,850,073.15	0.90%	\$ 87,383,754.21
22	40.80%	\$ 3,961,396,857.70	0.99%	\$ 96,122,129.64
24	49.25%	\$ 4,781,833,216.71	9.00%	\$ 873,837,542.14
26	56.88%	\$ 5,522,653,266.33	15.00%	\$ 1,456,395,903.57
28	63.74%	\$ 6,188,711,659.56	23.30%	\$ 2,262,268,303.54
30	70.55%	\$ 6,849,915,399.78	27.80%	\$ 2,699,187,074.61
32	77.44%	\$ 7,518,886,584.82	42.00%	\$ 4,077,908,529.99
34	84.33%	\$ 8,187,857,769.85	50.50%	\$ 4,903,199,542.01
36	91.22%	\$ 8,856,828,954.89	53.00%	\$ 5,145,932,192.60
38	97.36%	\$ 9,452,980,344.75	58.00%	\$ 5,631,397,493.79
40	100.00%	\$ 9,709,306,023.78	60.40%	\$ 5,864,420,838
TOTAL	100.00%	\$ 9,709,306,023.78	60.40%	\$ 5,864,420,838.36



FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DE OBRAS.



- Fecha estimada el día 12 de octubre de 2024.

Resolución 085 de 2024 apertura a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Consultoría para la Interventoría CMA-ADS-017-2023

Sesión 1 _ 18-03-2024, 9:00 A.M	Sesión 2_ 22- 03-2024, 4:00 P.M	Sesión 3_ 08- 04-2024, 3:00 P.M	Sesión 4_ 21- 06-2024, 2:30 P.M	Sesión 28- 06-2024	Sesión 6_ 04- 07-2024	Sesión 7_26- 08-2024	Sesión 8_ 30- 08-2024
Aplazada por ausencia del apoderado del Interventor	Aplazada por Solicitud del interventor	Realizada y suspendida (entrega de pruebas hasta 19-04-2024, y a la fecha en evaluación jurídica de pruebas).	Pruebas orales a directora de interventoría.	Citación alegatos de conclusión	Prueba Oral Directora de interventoría.	Alegatos de conclusión	Audiencia para fallo definitivo



REPORTE AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO



Resolución 096 de 2024 apertura a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Obras LP-ADS-010-2023

Sesión 1 _ 01-04-2024, 3:00 P.M	Sesión 2 _ 11-04-2024, 3:00 P.M	Sesión 3_ 24-04-2024, 9:00 A.M	Sesión 4_
Aplazada por solicitud del contratista	Aplazada por solicitud del contratista	Llamado a descargos y suspendida (entrega de pruebas, y a la fecha en evaluación jurídica de pruebas).	Traslado de pruebas mediante acta de seguimiento (2 de agosto de 2024).

ALERTAS PROYECTOS (INTERVENTORÍA)

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	RESOLUCIÓN No.085 DE 2024	Versión:
		Página:
		Fecha:

"Por medio de la cual se da inició a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión a la ejecución del Contrato de Consultoría - Interventoría N.º CMA-ADS-017-2023"

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial las que dicta los artículos 33, 34 y 35 del Manual de Contratación de la empresa de servicios públicos mixta del Departamento de Sucre "AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.", los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, modificada por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 1º de la Resolución 293 del 2004 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico, y las demás normas vigentes que la reglamentan, modifican o adicionan, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 365 de la Constitución Política dispone, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita;

Que, el artículo 366 de la Constitución Política dispone, que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación;

Que, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política la función administrativa se rige por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad;

Que, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas;

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	RESOLUCIÓN No.085 DE 2024	Versión:
		Página:
		Fecha:

Universitario Especializado, apoyo a la supervisión, HERNANDO MONTES SEVILLA, con el fin de que rindan declaración en audiencia bajo la gravedad de juramento de las condiciones responsables de la supervisión por parte de la Entidad para con el contrato de contrato de interventoría N.º CMA-ADS-017-2023.

ARTÍCULO CUARTO: CÍTESE a la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., a través de su apoderado(a) como parte del proceso administrativo sancionatorio con el propósito que se haga parte de las garantías expedidas PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO. No. PÓLIZA 53-44-101029108-EXPEDIDA POR SEGUROS DE CUMPLIMIENTO. No. PÓLIZA 53-44-101029108-EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO (26-01-2024), a favor EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., expedida por la empresa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, donde se asegura y beneficia a la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P, la cual fue aprobada por la empresa, de conformidad con lo establecido en la regulación legal vigente, mediante Resoluciones N° 682 del 14 de noviembre de 2023 y N° 033 del 26 de enero de 2024, respectivamente, para el **Contrato CMA-ADS-017-2023**.

ARTÍCULO QUINTO: FÍJESE, la fecha de la audiencia oral concentrada para el día jueves (14) de marzo de 2024, a las 9.00 a.m. a través de la plataforma teams en el link, <https://teams.live.com/join?meetingid=9313171413740?p=Koi5NL68W7TTCPT7e>

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto no procede recurso alguno.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelajo a los Siete (7) días del mes de marzo del año 2024.

TULIO ALFREDO PINILLA CHÁVEZ
 Gerente
 EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Proyecto	Nombres y Apellidos	Cargo o Vinculación	Firma
	Cristian Ochoa Hernández	Abogado Externo -Secretaría General	
Revisión	Jaihy Emiliani Ruiz	Secretaría General	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

ALERTAS PROYECTO (OBRA)

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	RESOLUCIÓN No.096 DE 2024	Versión:
		Página:
		Fecha:

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO, SE CITA Y SE APERTURA UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LP-ADS-010-2023"

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial las que dicta los artículos 33, 34 y 35 del Manual de Contratación de la empresa de servicios públicos mixta del Departamento de Sucre "AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.", los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, modificada por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 1° de la Resolución 293 del 2004 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico, y las demás normas vigentes que la reglamentan, modifican o adicionan, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 365 de la Constitución Política dispone, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita;

Que, el artículo 366 de la Constitución Política dispone, que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación;

Que, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política la función administrativa se rige por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad;

Que, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas;

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	Código:
	RESOLUCIÓN No.096 DE 2024	Versión:
		Página:
		Fecha:

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto no procede recurso alguno.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo el día dieciocho (18) día del mes de marzo del año 2024

TULIO ALFREDO PINILLA CHÁVEZ
Gerente
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Proyecto	Nombres y Apellidos	Cargo o Vinculación	Firma
	Cristian Cotocha H.	Abogado Externo –Secretaría General	
Revisó	Jelny Emiliani Ruiz	Secretaria General	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



Excavaciones – Construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias. (fecha del registro 16-08-2024).



Excavaciones – Construcción de pozos de inspección. (fecha del registro 16-08-2024).

ESTADO DE APROBACION POLIZAS

ACTO ADMINISTRATIVO	POLIZA	APROBACION
FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	CUMPLIMIENTO N° 4008871 – ANEXO 0	RESOLUCIÓN N° 681 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 4001864 - ANEXO 0	
	TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° CRC-100000018	RESOLUCIÓN N° 759 DE 2023
ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO N° 4008871 – ANEXO 1	RESOLUCIÓN N° 032 DE 2024
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 4001864 ANEXO 1	
	TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° CRC-100000018	RESOLUCIÓN N° 759 DE 2023
OTROSÍ N°1	PENDIENTE POR ENTREGAR	



CARGUE INFORMACION AL SIGEVAS



- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales**
- Informes de Interventoría
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comite
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

+ Documentos Contractuales: Resumen									
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-010-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APROBACION_POLIZATR_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUM_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUM_LP-ADS-010-2024_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RCE_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RCE_LP-ADS-010-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTRO SI LP-ADS-010-2023	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA SOCIALIZACION SANTIAGO APOSTOL	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTAS INICIO INTERVENTORIA DEBIDAMENTE FIRMADAS-1	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTAS INICIO OBRA DEBIDAMENTE FIRMADAS-	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INTER CON CONTRATO	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APROBACIÓN DE POLÓLIZAS INTER CON ACTA DE INICIO	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
contrato de inter.	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
contrato de obra.	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POLIZA INTERVENTORÍA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENT	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESOLUCIÓN APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO.p	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE POLIZA OBRA	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN PÓLIZA TODO RIESGO	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE INICIO CMA-ADS-017-2023 CONSULTORIA	23/11/2023			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE INICIO OBRA LP-ADS-010-2023 SANTIAGO APOST	23/11/2023			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.



CARGUE INFORMACION AL SIGEVAS



Soporte Documental de Proyectos

1-2020-315 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE

+ Informes de Interventoría:	Resumen						
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORME DE INTERVENTORÍA N°1 COMPLETO	25/04/2024	INFORME DE INTERVENTORÍA N°1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORME DE INTERVENTORÍA N°2	25/04/2024	INFORME DE INTERVENTORÍA N°2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 14 DE ENERO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORME DE INTERVENTORÍA N°3	25/04/2024	INFORME DE INTERVENTORÍA N°3, DEL PEIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 14 DE FEBRERO DE 2024.		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORME INTERVENTORIA # 2	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
informe #1 interventoria radicado 1	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTA: Los informes de interventoría del N°4 al N°7 no se han cargado en el SigeVas porque no han sido aprobados por parte de la Supervisión, muy a pesar de los requerimientos realizados por la Supervisión (los allegados no cumplen con el anexo técnico).

1-2020-315 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE

- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comité
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

+ Informes de Supervision Seguimiento:

[Resumen](#)

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	<input type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISION N°9	20/08/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME N°8_VERSION N°2	26/07/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISION N°7_VERSION 1	10/06/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2024_VERSION N°1		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME N°6	03/05/2024	Correspondiente al periodo del 15 de marzo al 14 de abril de 2024 (Versión N°1)		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISION N°5	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INF PRESUNTO INCUMPLIMIENTO SANTIAGO APOSTOL FII.p	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISION 1.	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISIÓN 2 SANTIAGO APOSTOL FII.pdf	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISIÓN 3 SANTIAGO APOSTOL FII	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISIÓN 4 SANTIAGO APOSTOL FII	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		



PROGRAMACIÓN DE COMITES DE OBRA E INTERVENTORÍA.



- Fecha estimada el día 5 de septiembre de 2024 en el sitio de las obras.
- Proceso del estado de cuenta de desembolso del 40%, fecha de entrega al Ministerio 12 de agosto de 2024.



“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ”



GENERALIDADES Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA



GENERALIDADES	
CONTRATO	No. LP-ADS-011-2023
OBJETO	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCE
CONTRATISTA	CONSORCIO ALCANTARILLADO SINCE R/L MIGUEL EDUARDO MERCADO BUENDIA
VALOR INICIAL	\$17.609.067.885.00
PLAZO	16 MESES
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	16 DE MARZO DE 2025
AVANCE TEMPORAL (27-08-2024)	244 DÍAS (58,54%)

COMPONENTES ESENCIALES DE OBRAS DENTRO DEL CONTRATO

RESUMEN AVANCES

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 27-08-2024

30,13%

PORCENTAJE FISICO REPROGRAMADO PARA EL 27-08-2024

37,10%

PORCENTAJE AVANCE TEMPORAL

58,54%

PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 27-08-2024

6,97%

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	%
1	LOCALIZACION, NIVELACION Y REPLANTEO	100,00%
2	EXCAVACIONES	31,16%
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN BASES DE PAVIMENTO	37,95%
4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO	27,71%
5	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO DE 28 MPA VACIADAS EN EL SITIO, INCLUYE MESA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.20 M DE ESPESOR, CAÑUELAS DE TRANSICIÓN ESMALTADAS, CONO Y CILINDRO DE 1,20 M, FORMALETERÍA, CONTROL DE AGUA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFUERZO, Y SE INCLUYEN LOS DEMÁS COSTOS DIRECTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. INCLUYE SUMINISTRO DE ANILLO Y TAPA	31,45%
6	ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS	13,49%
7	SUMINISTRO DE TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO	28,82%
TOTAL		
% FÍSICO EJECUTADO 16-8-24		30,13%
% FÍSICO REPROGRAMADO 16-8-24		37,10%
% ATRASADO 16-8-24		6,97%

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

- El PAC N°1 se envió el día 12 de agosto de 2024.

CUR	SALDO EN FIDUCIA (CON RENDIMIENTOS) A JUNIO DE 2024	SALDO NETO DISPONIBLE (SIN RENDIMIENTOS NI GMF NI RETEFUENTE) A JUNIO DE 2024	AVANCE FISICO DEL VEINTE (20%), VALOR Y PERIODO	FECHA ESTIMADA DE PAGO	NUEVO SALDO EN FIDUCIA SIN RENDIMIENTOS	RECURSOS POR SOLICITAR (3ER TRIMESTRE/2024)
CUR 1334	\$ 347.005.822,50	\$ 399.144.103,35	(\$ 3.753.150.792,00 julio de 2024)	16/08/2024	\$4.100.156.614,50	\$5.629.726.188,00

- **COMPONENTE TÉCNICO**, este componente encontramos los diseños, los equipos de topografía, maquinaria, herramientas y materiales que se requieran para la construcción del alcantarillado. Se trabajarán en 2 frentes de trabajo cada uno estará compuesto por 3 cuadrillas, distribuidos de la siguiente manera:

7. METODOLOGIA DE TRABAJO.

Con el fin de ejecutar las actividades establecidas en el cronograma de obras vigente y cumplir con el plazo contractual estipulado se emplearán las siguientes estrategias:

- Organización del segundo frente de trabajo. Es preciso anotar que estos frentes trabajarán la jornada laboral ordinaria establecida por la ley. No obstante, es pertinente aclarar que debido a la época de lluvias que ya ha iniciado, la implantación de un nuevo frente de obras no garantizará el avance significativo de las actividades, ya que los factores climáticos no son imputables al Contratista.

Inicio Frente de Obra N°2: 2 de julio 2024.

- Se mantendrá una comunicación continua con el personal en obra, oficina y proveedores para no correr riesgo de retrasos por escasez de materiales; lo mismo aplica para las empresas de servicios públicos cuando se presenten casos en los que se necesiten reparaciones de redes existentes en los tramos a intervenir. Plazo: INMEDIATO.
- Se planificarán con anterioridad todas las actividades para prever retrasos durante la ejecución de la obra. Plazo: INMEDIATO.

8. PERSONAL EN OBRA.

Para dar cumplimiento con la nueva programación de obra en el tiempo estipulado de acuerdo con el Contrato, se contará con el siguiente personal, el cual es el requerido contractualmente al Contratista.

Tabla 3. Personal en Obra.

Frente de trabajo No.1	
Personal	Cantidad
Residente de Obra	1
Maestro de Obra	1
Oficial	1
Topógrafo	1
Cadenero	1
Obreros Domiciliarias	6
Obreros instalación de tuberías	3
Profesional SISO	1
Trabajadora social	1

Ahora, al implementar un segundo frente de obras Consorcio Alcantarillado Sincé, debe organizar administrativamente el nuevo personal, teniendo en cuenta que se requiere de nuevos profesionales y mano de obra no calificada.

Frente de trabajo No.2	
Personal	Cantidad
Auxiliar de Residente de Obra	1
Maestro de Obra	1
Oficial	1
Topógrafo	1
Cadenero	1
Obreros Domiciliarias	6
Obreros instalación de tuberías	3

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Para el desarrollo de las actividades se están utilizando la siguiente maquinaria y equipos:

Tabla 4. Maquinaria y Equipos.

Frente de Obras N°1	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
COMPACTADOR TIPO RANA	1
BOMBA SUMERGIBLE.	1
MEZCLADORA	1
PLANTA ELÉCTRICA	1
CANGURO	1
CORTADORA DE CONCRETO RÍGIDO	1
HERRAMIENTAS MENORES	1
MOTOBOMBA	1
RETROEXCAVADORA	1
VOLQUETA	1
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
MINICARGADOR	1



FECHA DE COMITÉ Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN OBRA



- Visita programada para el día 04 de septiembre de 2024.
- Las actividades que se ejecutan son:
 - Excavaciones y rellenos
 - Suministro e instalación de redes de alcantarillado
 - Construcción de pozos de inspección
 - Construcción de acometidas domiciliarias




PLANES DE CONTINGENCIA



- En cuanto al plan de contingencia, se ha adoptado horario de trabajo de 7:00 A.M. a 5:00 P.M, dedicadas a las actividades de suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario, construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias, incluyendo registros. Estas actividades se ejecutan en paralelo con dos equipos de excavación mecánica. Cada cuadrilla está compuesta por 7 personas, incluyendo oficiales y ayudantes, y actualmente hay dos frentes de obra activos.

CURVA S DE REPROGRAMACION

CURVA S DE EJECUCIÓN DE OBRA		
Mes	% Programado	% Ejecutado
16/11/2023	0,00%	0,00%
16/12/2023	0,05%	0%
20/02/2024	0,07%	1,37%
19/03/2024	4,11%	5,56%
16/04/2024	9,85%	9,08%
16/05/2024	16,04%	10,6%
7/06/2024	18,50%	14,5%
16/06/2024	24,70%	17,85%
10/07/2024	29,66%	23,05%
16/07/2024	30,90%	23,60%
16/08/2024	37,10%	30,13%
16/09/2024	44,52%	
16/10/2024	50,72%	
16/11/2024	64,52%	
16/12/2024	76,23%	
16/01/2025	82,99%	
16/02/2025	91,61%	
16/03/2025	100,00%	

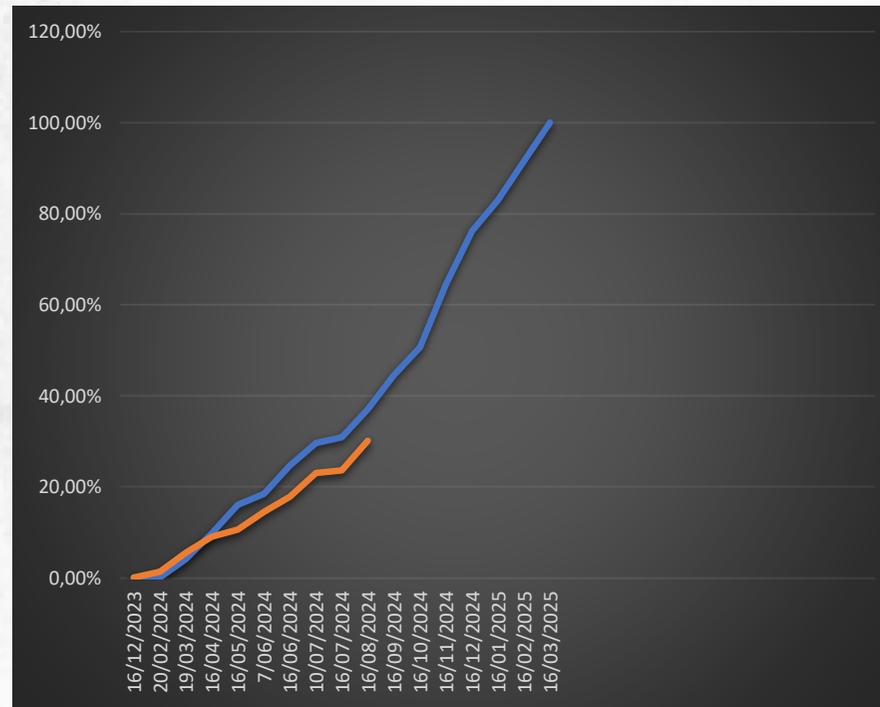

AVANCE FINANCIERO		
No.	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	\$ 6.369.371,58	\$8.804.533,94
2	\$ 12.738.742,98	\$241.244.230,02
3	\$ 723.727.510,65	\$979.064.174,41
4	\$ 1.735.336.048,72	\$1.598.903.363,96
5	\$ 2.825.268.454,35	\$1.864.800.289,02
6	\$ 3.936.642.043,89	\$2.553.314.843,33
7	\$ 5.125.412.348,19	\$3.142.661.066,00
8	\$ 6.236.969.907,33	\$4.155.327.866,00
9	\$ 7.480.813.549,91	
10	\$ 8.602.053.065,29	
11	\$ 9.939.196.970,58	
12	\$ 11.564.834.985,37	
13	\$ 13.064.062.849,89	
14	\$ 14.614.415.071,77	
15	\$ 16.132.423.587,05	
16	\$ 17.609.067.885,00	



ALERTAS PROYECTO



- Compromisos: de acuerdo con visita realizada el día 13 de junio de 2024, el contratista se comprometido a incluir nuevos frentes de trabajo para la primera semana de Julio de 2024, actualmente según lo reportado por la interventoría, cumplió el compromiso.
- El proyecto presenta un avance acumulado a fecha del 16 de agosto de 2024 del 30,13 según ultimo reporte de la interventoría de acuerdo con informe de interventoría N°8 correspondiente al periodo del 17 de junio al 16 de julio de 2024, frente al 37,10% (atraso del 6,97%) según reprogramación aprobada por la Interventoría del día 16 de abril de 2024. El Contrato tiene fecha de acta de inicio de 16 de noviembre de 2023 y terminación de 16 de marzo de 2025 (avance temporal 58,54%).
- Los avances en el Contrato de obra son: Socialización del proyecto, elección de veeduría puntual, avance en Actas de Vecindad, instalación de la valla informativa del proyecto, localización, nivelación y replanteo, excavaciones, relleno y compactación bases de pavimento, instalación de tubería alcantarillado sanitario, construcción de cámaras de inspección, estructuras complementarias, suministro de tubería alcantarillado sanitario.



ALERTAS PROYECTO



- Plan de contingencia y permisos ambientales: Plan de choque del contrato de obra anexar fecha de inicio y fecha de finalización (aumento de cuadrillas), referente a los permisos ambientales no se requiere.
- Solicitud de informes de interventoría: El contratista de consultoría ha presentado hasta la fecha todos los informes de interventoría dentro del plazo contractual, fecha máxima de entrega el día 26 de cada mes.



FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DE OBRAS.



- Fecha estimada el día 16 de marzo de 2025.



Excavaciones - Suministro e instalación de redes alcantarillado – Construcción de pozos de inspección.



Excavaciones - Suministro e instalación de redes alcantarillado – Construcción de pozos de inspección.

ESTADO DE APROBACION POLIZAS

ACTO ADMINISTRATIVO	POLIZA	APROBACION
FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	CUMPLIMIENTO N° 21-44-101428959 – ANEXO 0	RESOLUCIÓN N° 680 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 21-40-101221355 - ANEXO 0	
	TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° C-00000083	RESOLUCIÓN N° 717 DE 2023
ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO N° 21-44-101428959 – ANEXO 1	RESOLUCIÓN N° 743 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 21-40-101221355 ANEXO 1	
	TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° C-00000083	RESOLUCIÓN N° 202 DE 2024

1-2021-206 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

-   
- Actas de Reunión**
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comité
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

+ Actas de Reunión:

[Resumen](#)

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
20231219 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240110 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240118 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240125 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240202 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240209 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240216 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240220 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240226 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240305 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240319 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
20240402 ACTA DE COMITE	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		



CARGUE INFORMACION AL SIGEVAS



1-2021-206 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCHÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales**
- Informes de Interventoría
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comité
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

Documentos Contractuales:

[Resumen](#)

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTROSI N°1_LP-ADS-011-2023	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APROBACION_POLIZATR_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APROBACION_POLIZATR_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUM_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUM_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RCE_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RCE_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TR_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE INICIO OBRA FIRMADA.	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE INICIO SINCE INTER.	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATO Inter	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATO obra	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y RCE OBRA CON RESOLUCIÓN DE A	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Póliza inter con acta de inicio y resolucio de ap	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
poliza inter con contrato y resolucio de aprobaci	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pólizas de Cumplimiento y RCE de obra con resoluci	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Activar Windows

1-2021-206 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCE DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

-
- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría**
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comité
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

+ Informes de Interventoría:

[Resumen](#)

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	<input type="checkbox"/>		
OFICIO A LA INTERVENTORÍA N°8	25/07/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 16 DE JULIO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME MENSUAL N° 7.pdf	10/07/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO DE 2024 AL 16 DE JUNIO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME N°6	31/05/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL DE 2024 AL 15 DE MAYO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE INTERVENTORIA N°5_V1	26/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		

1-2021-206 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

-   
- Actas de Reunión**
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comite
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento**
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

+ Informes de Supervision Seguimiento:

[Resumen](#)

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	<input type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISION N°9	27/08/2024	CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME N°8_VERSION N°1	17/07/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME DE SUPERVISIÓN N°7_VERSION-N1	10/06/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME N°6.pdf	02/05/2024	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME N°2.pdf	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME N°3	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME N°4	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME N°5	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISION N°1	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>		



REPORTE AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO



El contratista ejecuta las actividades contractuales



PROGRAMACIÓN DE COMITES DE OBRA E INTERVENTORÍA.



- Fecha programada 04 de septiembre de 2024 en el sitio de las obras.

MUCHAS GRACIAS

Síguenos en nuestra página web y redes sociales



@aguasdesucre



<https://aguasdesucre.com/>



Aguas de Sucre



@pdasucre
