



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	5 de Septiembre de 2024
HORA:	De 2:30 pm a 3:30pm
LUGAR:	<b>Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes - Ing. Supervisión FINDETER Fernanda Villegas – Auxiliar de Obra Grupo More Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz – Residente Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Obra Grupo MORE Elizabeth Duarte – Social Interventoría INTER JCD Luisa González - Contratista Interventoría INTER JCD Mario Triana – SST Interventoría Olaya Larrahondo - Emquilichao E.S.P
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

El día 5 de septiembre de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Informe de avance del contrato de obra PAT-ATF-O-043-2023
4. Compromisos

### DESARROLLO:

Inicia la presentación del avance de obra mediante la proyección simultanea de diapositivas, en lo cual se evidencia en el periodo semanal comprendido entre el 29 al 04 de septiembre, los porcentajes de avance de obra corresponde a los siguientes:

1. Porcentaje de obra programada esta semana es del 77,60%.
2. Porcentaje de obra ejecutado y aprobado por la Interventoría es de 82,02%, con lo cual, se tiene un adelanto de 4,42%.

Las actividades que se están ejecutando actualmente en obra, son:



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01


1. El 02 de septiembre, se inicia el retiro de formaletas y puntales empleados en el armado de la losa superior del tanque de almacenamiento, adicional a esto, se está realizando la hidratación y/o curado la losa.
2. En la estructura correspondiente al tanque de filtros, se continuó con la instalación de los aceros horizontales, además de, continuar con el encofrado de los muros, actividades desarrolladas de igual manera, en la estructura del tanque de sedimentador.
3. Por otro lado, en la estructura correspondiente a la caseta de sala de juntas y oficina, se culmina con la fundición de la viga aérea, además de, continuar con la pega de mampostería en la zona inmediatamente después de la viga en mención.
4. En cuanto al cerramiento perimetral, se continuó con la pega de mampostería, y culminación de la fundición de la viga de amarre en el tramo total de 44 metros lineales del costado izquierdo de la obra.
5. Con respecto, a la estructura del lecho de secado y tanque de cloración, no se realizaron actividades.
6. En el componente de seguridad y salud en el trabajo, se continua con la verificación de los elementos de protección del personal en obra, además de, continuar con las capacitaciones y pausas activas. Posteriormente, se inspecciona la señalización interna en la obra en pro de salvaguardar la integridad física de los trabajadores. Es primordial que, se garantiza la línea de vida, en los trabajos en altura.
7. En cuanto al componente social, el día 30 de agosto, se realiza la instalación de la valla informativa, así como, se lleva a cabo el quinto comité de sostenibilidad con la comunidad, en articulación con el contratista de obra, Interventoría y Emquilichao, Además de, continuar con la atención en el PAC (Punto de Atención al Ciudadano).
8. Durante la semana se presentó la inmovilización por las vías principales en todo el país, debido al paro camionero, sin embargo, la ejecución de las actividades en la obra, no se vio afectada debido a que, se contaba con el suministro necesario de materiales y elementos.

#### **COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mejorar la instalación de la valla informativa, teniendo en cuenta que, está quede empotrada o	Contratista de obra	12/9/24

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	fijada a un sistema rígido, evitando de esta manera que, la valla pueda desplomarse, ocasionando algún tipo de accidente o incidente en obra.		
2	remitir en la menor brevedad especificaciones técnicas, APU, plano con espesores y diseño, unidades de elementos que se van a implementar, para que la Interventoría en articulación con Findeter mediante un comité interno técnico analicen la propuesta y generen la aprobación, si es factible dicha solicitud referente a cambio de material de compuerta tipo guillotina las cuales, están contempladas en hierro dúctil, sin embargo, el contratista sugiere realizarlas en acero inoxidable. Sumado a esto, se deberá realizar el acta de mayores y menores, además de balance donde se visualice en ceros el ítem anterior y el balance nuevo con la modificación.	Contratista de obra	12/9/24

## FIRMAS: Reunión Virtual

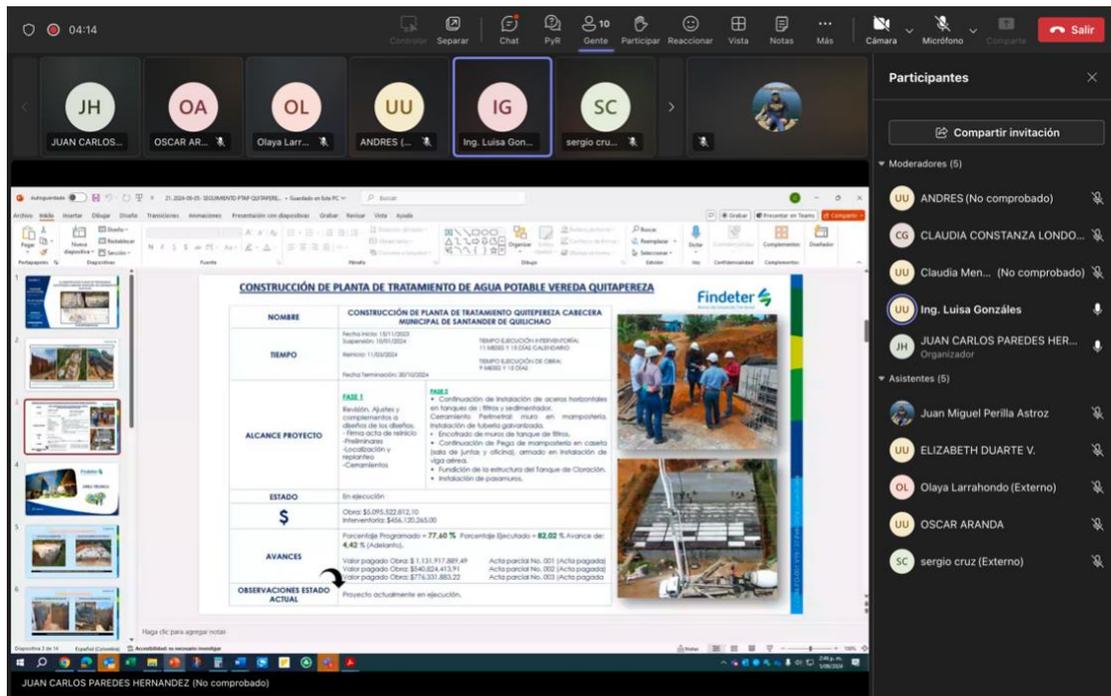

The screenshot shows a virtual meeting interface with a top toolbar containing icons for 'Controlar', 'Separar', 'Chat', 'PVR', 'Gente' (10), 'Participar', 'Reaccionar', 'Vista', 'Notas', 'Más', 'Cámara', 'Micrófono', 'Compartir', and 'Salir'. Below the toolbar is a row of participant avatars: JH (JUAN CARLOS...), OA (OSCAR AR...), OL (Olaya Larr...), UU (ANDRES L...), IG (Ing. Luisa Gon...), and SC (sergio cru...). The main area displays a presentation slide titled 'CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA QUITAPEPERA MUNICIPAL DE SAMPANDE DE GUICHACO'. The slide content includes:

<b>NOMBRE</b>	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEPERA CABECERA MUNICIPAL DE SAMPANDE DE GUICHACO	
<b>TIEMPO</b>	Fecha Inicio: 18/11/2023 Suspensión: 16/01/2024 Número: 110000204	Fecha Terminación: 20/10/2024
<b>AVANCE PROYECTO</b>	<b>FASE I</b> Revisión, Ajustes y complementación de planos de los edificios. Firma del acta de revisión. Prohibición de modificaciones y reparaciones. Cementación.	<b>FASE II</b> Continuación de instalación de accesorios horizontales en tanques de filtro y sedimentador. Cementación, pintura y mazo en mampostería. Instalación de tuberías galvanizadas. Escalación de muros de tanque de filtro. Continuación de Paga de mampostería en casona sala de juntas y oficinas, armado en instalación de agua fría. Fundición de la estructura del tanque de Clarificación. Instalación de pesamuevas.
<b>ESTADO</b>	En ejecución	
<b>\$</b>	Obras \$5.095.522.412,00 Interventoría \$454.135.265,00	
<b>AVANCES</b>	Porcentaje Programado = 77,65 % Porcentaje Ejecutado = 82,02 % Avance de 4,37 % (6,36%) Valor pagado Obras \$ 1.131.917.889,49 Acta parcial No. 021 (Acta pagada) Valor pagado Obras \$545.624.413,91 Acta parcial No. 002 (Acta pagada) Valor pagado Obras \$776.320.882,22 Acta parcial No. 003 (Acta pagada)	
<b>OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL</b>	Proyecto actualmente en ejecución.	

On the right side, the 'Participantes' panel lists 10 participants, including Moderadores (5) and Asistentes (5).
