

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 4 - Mayo 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 9 de mayo de 2024.
HORA:	7:30 a.m. a 8:30 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DÍA:

1. Proyecto Acueducto Mogotes – CUR 1373-2023
2. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos.
3. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
4. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

DESARROLLO:

1. Proyecto Acueducto Mogotes – CUR 1373-2023

Se socializaron por parte de la ESANT S.A. observaciones de carácter técnico en relación con observaciones que fueron presentadas por parte del contratista de obra, en donde se genera compromiso frente a que se requiera al contratista presentar un documento detallado en donde se explique e ilustre lo observado en los diseños vs lo proyectado en el presupuesto.

La Esant indico que el diseñador del proyecto explico que los filtros autolavantes funcionan por diferencias de presión, lo que permite una autolimpieza. Se debe verificar la correspondencia de los planos con los filtros autolavantes o manuales Y realizar ajustes si es necesario, teniendo en cuenta que el sistema de cuatro filtros es preferible por su practicidad especialmente para un municipio de sexta categoría como Mogotes.

Se solicita al Ministerio confirmar cual sistema fue aprobado, se consultara con el viabilizador del Ministerio para clarificar la situación y confirmar los detalles revisados en la ficha de viabilizacion.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

La Esant compartió información remitida por el consultor del proyecto sobre los filtros, indicando que ambos sistemas son funcionales y que la principal diferencia radica en el tamaño y sistema de lavado.

De igual manera, se manifiesta por la ESANT que se realizara recorrido con el municipio y socialización preliminar del proyecto con la comunidad y alcaldía en los días del 15 y 16 de mayo de 2024 en horas de la mañana.

Se reitera que, por parte del Ministerio, la socialización fue reprogramada para el día 30 de mayo de 2024 en donde se espera que para dicha fecha ya se hayan solventado y/o aclarado las observaciones presentadas por parte del contratista de obra frente a la apropiación de diseños.

2. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

La Esant informa que se programara reunión para la semana del 15 al 24 de mayo de 2024.

El Ministerio resalta la necesidad de reactivar la colaboración con el Municipio y resolver los temas pendientes, como la reformulación No. 3 la cual depende de las servidumbres necesarias para el proyecto.

3. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

El Ministerio informo que se recibieron actas de terminación con fecha del 9 de febrero de 2024.

La Esant (Ing. Luz Yaneth Niño) profesional de apoyo, informo que los cambios solicitados por el Municipio, incluyendo la sustitución de llaves plásticas por metálicas y la instalación de protecciones con varilla galvanizada ya fueron realizadas por el contratista. El contratista debe de entregar la subsanación de la documentación final a la Interventoría y proceder a actualización de póliza de acuerdo con el recibo final.

El Ministerio hizo énfasis en la urgencia de tramitar acta de recibo final para su inclusión en la plataforma sigevas a finales del mes de mayo de 2024.

4. Proyecto Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Vélez

El Ministerio plantea la preocupación por la actualización del proyecto de acuerdo con la reformulación No. 3, aprobada por el Ministerio el 29-11-2023,

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

la Esant indico que en un primer momento lo que se quería era incluir el modificatorio con las condiciones aprobadas en la reformulación No. 3, pero debido a cambios de menores y mayores cantidades, el interventor recomendó hacer de una sola modificación para permitir ir a finales del proyecto y se acordó que los ajustes de la reformulación No. 3 y la ejecución de la obra serán indicados en los presupuestos. La reprogramación de la obra esta sujeta a la apertura de la carrera sexta en Vélez y se proyecta socialización para la tercera semana de mayo.

Se tienen arreglos pendientes en el predio de la señora Hilda Bonce, relacionados con el emisario final, sin embargo, debido a asuntos legales con la propietaria no se permite el acceso al lugar.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Diseños vs. lo presentado en presupuesto, proyecto Mogotes.	Contratista	16-06-2024
2	Sistema de filtros viabilizado por el Ministerio del proyecto Mogotes	MVCT	17-05-2024
3	Socialización preliminar proyecto Mogotes	ESANT	15-16 de -05-2024
4	Reunión proyecto Vélez Guayabos	ESANT	15 al 24 de mayo de 2024
5	Subsanación documentación final contratista a Interventoría	CONTRATISTA DE OBRA	17-05-2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	proyecto del Socorro		
--	----------------------	--	--

FIRMAS:

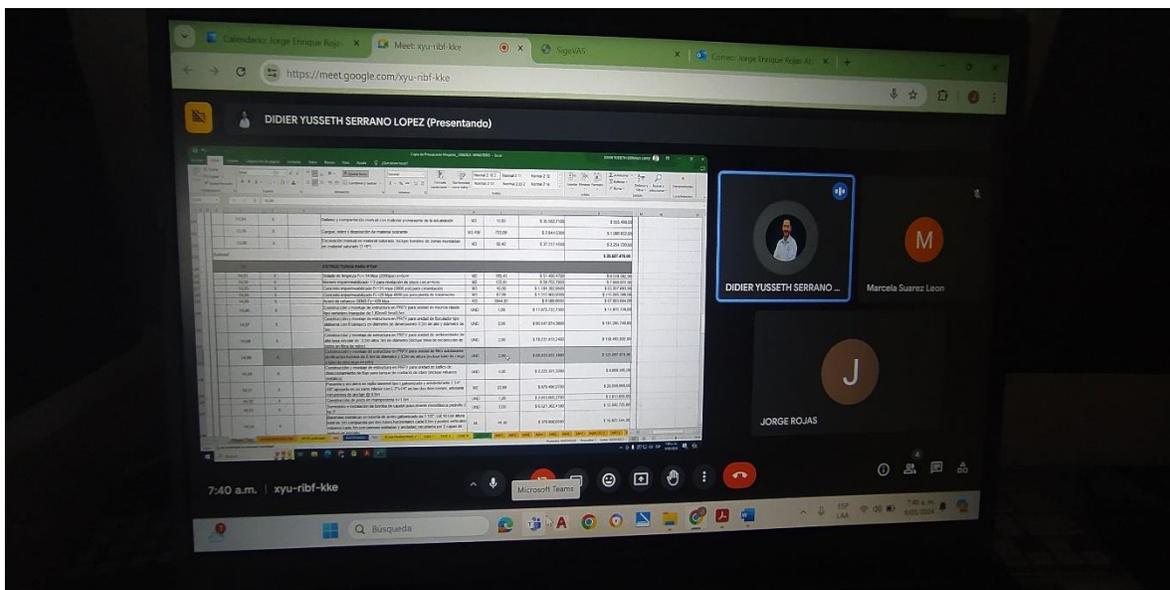

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
 Revisó:
 Fecha: Mayo 9 de 2024
