

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 1 - Julio 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 02 de Julio de 2024.
HORA:	11:30 a.m. a 1:00 p.m.
LUGAR:	Oficinas EPC -Bogotá.
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto Tanque Cajicá.
3. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
5. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte

DESARROLLO:

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

EPC informa que el Ingeniero Cesar Humberto García Rodríguez tel. 3217530656, es el nuevo apoyo a la supervisión para el proyecto

- Se anexa acta de Reunión del día 2 de julio de 2024 entre EPC, Municipio, Contratista de obra e Interventoría y Ministerio.

2. Proyecto Tanque Cajicá.

El contratista presento ajuste a la programación de obra.

Reunión de EPC con Contratista de obra e Interventoría, ampliando viga perimetral

El concepto de modificación técnica de viga perimetral la Interventoría lo entrega para revisión de EPC Cajicá y consultor el 21 de junio de 2024, no se cumplió. En reunión del 4 de julio se informa que el contratista entrega el martes 9 de julio con planos e informe técnico a Interventoría e Interventoría a EPC Cajicá el 11 julio de 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Con informe gerencial de 16 al 22 de junio de 2024, con reprogramación de obra se tiene un avance ejecutado del 8,81% contra un programado del 9,47%. Se tiene un avance financiero del 8,81% contra un programado de 9.47% y pagado 0 %.

Reunión citada el 8 de julio de 2024 de revisión del proyecto en EPC a las 11:00 del día.

3. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca

El 25 de junio de 2024, EPC se reunió con el Municipio y EcoSiecha (Operación planta), el Municipio, informa que se encuentra en trámite de proceso mínima cuantía para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio), optimización de 18 a 32 lts. Se plantea fecha de publicación menor cuantía por el Municipio en reunión por programar con Interventoría, en la semana del 6 al 12 de julio de 2024.

El Municipio está organizando la infraestructura para el funcionamiento temporal del laboratorio, bodega y baños.

El Municipio está adquiriendo terreno para ampliar el área en la que se construye la infraestructura porque el área actual del predio es insuficiente para el proyecto.

4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

EPC informa que el contrato de obra inicial tenía el diseño de 6 pasos elevados tipo, se incluye el diseño de 22 pasos elevados puntuales y los jurídicos, solicitan acta de mayores y menores cantidades cambiando de 6 pasos elevados tipo por 22 pasos elevados puntuales.

EPC informa que realizara la revisión técnica de los diseños de los 22 pasos elevados y entregara al contratista de Obra, para su ejecución.

EPC cita a reunión con el Municipio de San Bernardo para finales de la otra semana julio 12 2024, para realizar seguimiento a obras fase I por parte del Municipio.

Con la información de los diseños y valor de pasos elevados EPC presenta reformulación correspondiente al Ministerio.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte Cundinamarca, Departamento De Cundinamarca

EPC informa que se recibió respuesta parcial de la Interventoría, a solicitud del Municipio de Guasca, indicando que en la ejecución del alcantarillado sanitario del corredor de la carrera 18 entre calle 2 y calle 8a, se construyeron 7 acometidas domiciliarias de alcantarillado específicamente entre la calle 4 y diagonal 7. El contratista e interventor entregan la respuesta completa en la semana del 8 al 12 de julio de 2024 a EPC.

6. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase i para el casco urbano del Municipio de Svania el Departamento de Cundinamarca

El 4 de julio de 2024 en reunión de seguimiento EPC informa; que la tubería de 24" de concreto existente, fue reemplazada por tubería de 24" en PVC, para el descole final del proyecto, El contratista se encuentra rematando la obra.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	• Se programa visita el 5 de julio de 2024, para presentar socialización de reformulación No. 1.	EPC- Contratista de Obra e Interventoría, Municipio Paratebueno	05-07-2024
2	Reunión citada el 8 de julio de 2024 de revisión del proyecto en EPC a las 11:00 en EPC. CAJICA	EPC- Cajicá- Cundinamarca- Contratista De Obra e Interventoría, Municipio de Cajicá	8-07-2024
3	Proceso mínima cuantía para alquiler de container para	Municipio de Guasca	12-07-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio)		
4	Adquirir terreno para el proyecto de Guasca	Municipio Guasca	Lo más pronto posible
5	EPC cita a reunión con el Municipio de San Bernardo para finales de la otra semana julio 12 2024,	EPC- MUNICIPIO	12-07-2024
6	Respuesta completa en la semana del 8 al 12 de julio de 2024 a EPC. Ricaurte.	Contratista de Interventoría	12-07-2024

FIRMAS:

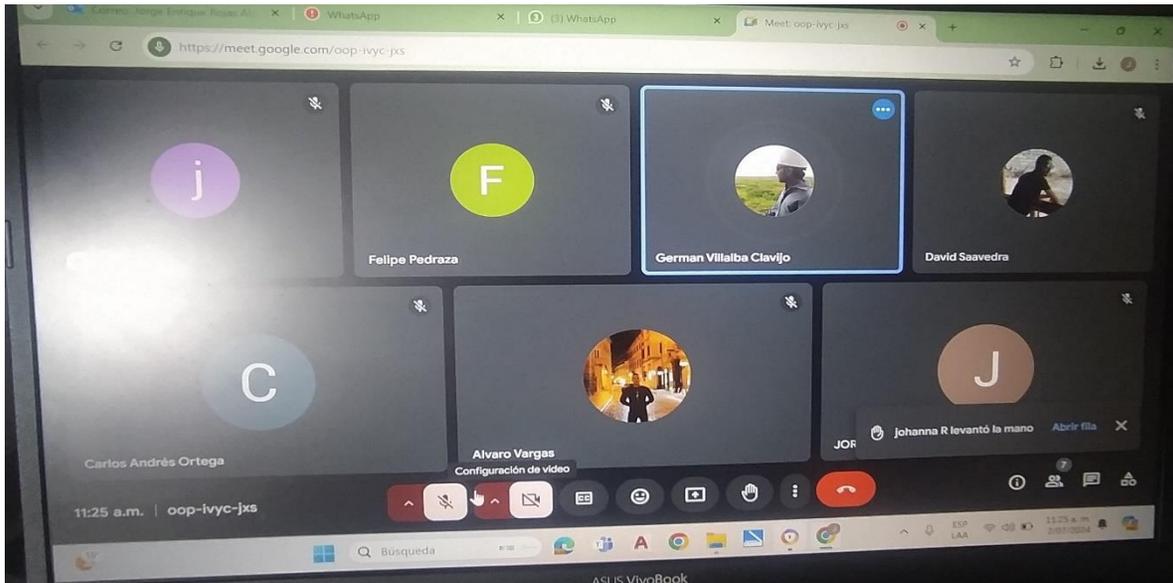

Anexos: acta elaborada por EPC

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: 2 de julio de 2024



ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:	02/07/2024	No. ACTA:	
NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Reformulación plan maestro Paratebano, Cundinamarca		
LUGAR:	Virtual		
HORA INICIO:	11:30 AM	HORA FIN:	

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	David Fernando Saavedra	Interventora	
2	Germin Villalba	Contratista	
3	César García Rodríguez	Apoyo a Supervisión E.P.C.	
4	Manuel E. Granados Caldas	Prof. Master E.P.C. SA E.S.P.	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

FECHA:

No. ACTA:

ORDEN DEL DÍA:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se remem de la ESP Paratebano Claudia Ramos, Felipe Pedraza secretario de planeación, Jorge Rojas del ministerio de vivienda, Alvaro Vargas, de la alcaldía de Paratebano, los ingenieros Manuel Granadas y Liliana Armas de EPC, y Carlos Ortega y David Saavedra de la Interventoría, y Germán Villalba del contratista.

Se presentara un breve resumen de la reformulación a presentar, que ha sufrido cambios a comparación de la reformulación presentada el año pasado.

Se necesitan permisos de ocupación de cauce para unos vertimientos pluviales a construir y unos pasos elevados, y un permiso de vertimiento para el vertimiento de la PTAR, deben ser radicados por el municipio a Corporinoquia.

FECHA:

02/07/2024

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En la reformulación se da alcance completo a la red sanitaria, se presentan redes sanitarias construidas, existentes y parte de la reformulación, que incluyen el barrio Galcán, Guadalupe Salcedo y El Prado. En el barrio El Prado se encuentran redes en 12" y se cambian a 10" PVC mejorando pendientes y fuerza tractiva.

Para el recorrido de la red sanitaria se debe solicitar permiso de ocupación de cauce para dos pasos elevados, uno de 13 metros y otro de 30 metros. Así mismo se debe actualizar la coordenada del cabezal de descarga de la PTAR.

Es importante que unas obras sobre el río Maquya se lleven a cabo en la anterior administración y algunas obras quedarán pendientes sobre esta comisión para enderezar el cauce y garantizar la dilución del vertimiento, por tanto es necesario realizar estas obras.

En tanto para el alcantarillado pluvial se proyectarán dos colectores pluviales en la parte baja del municipio que se adicionarán en la reformulación. Descargas 0-9 y 0-10

Se proyecta un tramo en 16" sobre la calle 3 con cámara 10 para garantizar la evacuación de aguas que se empujan en la calle e inundan los casos circundantes.

Para la descarga de 0-9 y 0-10 así como de los pasos elevados proyectados se incluyen en la solicitud para la radicación de la información a Coposmogua

FECHA:

02/07/2024

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En reunión del día viernes 28 de junio se solicitó a la alcaldía como a la empresa de servicios públicos de Paratebueno, información de los documentos radicados en el anterior permiso de ocupación de cauce para utilizar como base para esta futura radicación y agilizar este trámite.

Se propone tener respuesta el día de hoy pero verificar que la información solicitada se encuentra disponible.

Se cubre información sobre el tema eléctrico en la PTAR ya que se incluye este tema dentro de la reformulación y que tanto la alcaldía como la empresa de servicios públicos tengan en conocimiento la información a presentar en la reformulación.

Se propone reunión de socialización de la reformulación entre el contratista y la administración municipal, propuesta para antes del día viernes 5 de julio de 2024

FECHA:

02/07/2024

No. ACTA:

COMPROMISOS

	Descripción	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.	Entrega y verificación de información del anterior permiso de ocupación radicado	Alvaro Vargas, Municipio Felipe Pedrosa	02/07/2024
2.	Reunión de socialización entre administración municipal y contratista de la reformulación	Germán Villalba Municipio	05/07/2024
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

ELABORÓ

APROBÓ

NOMBRE:

NOMBRE:

CARGO:

CARGO:

FIRMA:

FIRMA:
