

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 7 - Julio 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 25 de Julio de 2024.
HORA:	10:30 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto Tanque Cajicá.
3. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
5. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

EPC informa que el contratista de Obra e Interventoría se encuentran realizando los ajustes de la reformulación No. 1, para entrega de la solicitud e información a EPC y su posterior radicación en el Ministerio de Vivienda Ciudad y territorio, para el 15 de agosto de 2024.

El martes 30 de julio de 2024, a las 10 a.m., se realiza reunión en EPC con Municipio para revisar avance de tramite con Corporinoquia y entrega de información.

2. Proyecto Tanque Cajicá.

El contratista presento ajuste a la programación de obra, porque estaba incluyendo en el avance la construcción y tiempo de entrega del tanque en Colombia desde actividad de avance del tanque

Reunión de EPC con Contratista de obra e Interventoría, ampliando viga perimetral

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El concepto de modificación técnica de viga perimetral la Interventoría lo entrega para revisión de EPC Cajicá y consultor el 21 de junio de 2024.

El 16 de julio de 2024, El contratista de interventoría entrego a EPC Cajicá, informe técnico de variación en diámetro de tanque de 10.000 m3. Para ser revisado y avalado por el consultor del proyecto.

Con Informe semanal de Interventoría periodo 33 de 14-07-24 a 20-07-24, con reprogramación de obra se tiene un avance ejecutado del 9,16% contra un programado del 12,13%. Se tiene un avance financiero del 9,16% contra un programado de 12,13% y pagado 0 %.

En trámite de acta parcial No. 1 por parte del contratista.

El contratista solicita suspensión del contrato indicando que a la fecha no ha recibido la totalidad del anticipo.

Reunión Cajicá el martes 30 de julio a las 10:00 a.m.

3. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca

Para el 25 de julio de 2024, el Municipio y EcoSiecha (Operación planta se encuentra en trámite de proceso mínima cuantía para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio), optimización de 18 a 32 lts.

El Municipio esta organizando la infraestructura para el funcionamiento temporal del laboratorio, bodega y baños.

El Municipio esta adquiriendo terreno para ampliar el área en la que se construye la infraestructura porque el área actual del predio es insuficiente para el proyecto.

4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

EPC informa que el contrato de obra inicial tenia el diseño de 6 pasos elevados tipo, se incluye el diseño de 22 pasos elevados puntuales y los jurídicos, solicitan acta de mayores y menores cantidades cambiando de 6 pasos elevados tipo por 22 pasos elevados puntuales.

El contratista ejecuta los estudios y diseños de los pasos elevados y EPC realizara la revisión técnica de los diseños de los 22 pasos elevados y entregara al contratista de Obra, para su ejecución.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

EPC cita a reunión con el Municipio de San Bernardo para el martes 30 de julio de 2024, para realizar seguimiento a obras fase I por parte del Municipio, que se debían terminar el 12 de julio de 2024.

Con la información de los diseños y valor de pasos elevados EPC presenta reformulación correspondiente al Ministerio.

5. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte Cundinamarca, Departamento De Cundinamarca

EPC informa que en la ejecución del alcantarillado sanitario del corredor de la carrera 18 entre calle 2 y calle 8a, se construyeron 7 acometidas domiciliarias de alcantarillado específicamente entre la calle 4 y diagonal 7. Que se ha avanzado en un 70% y actividad que se termina el 31 de julio de 2024.

EPC programo visita de recibo de las observaciones realizadas por el Municipio para el 2 de agosto de 2024.

6. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Sylvania el Departamento de Cundinamarca

El 25 de julio de 2024 en reunión de seguimiento EPC informa; que la tubería de 24" de concreto existente, fue reemplazada por tubería de 24" en PVC, para el descole final del proyecto.

EPC realiza visita el 24 de julio de 2024, está pendiente construcción de muro previo aledaño al proyecto, con entrega el 2 de agosto de 2024.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	• Se programa visita el 30 de julio de 2024, revisión de reformulación No. 1.	EPC- Contratista de Obra e Interventoría, Municipio Paratebueno	30-07-2024
2	Reunión el 30 de julio de 2024 de revisión del proyecto en EPC	EPC- Cajicá- Cundinamarca- Contratista De Obra e	30-07-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

		Interventoría, Municipio de Cajicá	
3	Proceso mínima cuantía para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio)	Municipio de Guasca	12-07-2024
4	Adquirir terreno para el proyecto de Guasca	Municipio Guasca	Lo más pronto posible
5	EPC cita a reunión con el Municipio de San Bernardo	EPC- MUNICIPIO	30-07-2024

FIRMAS:

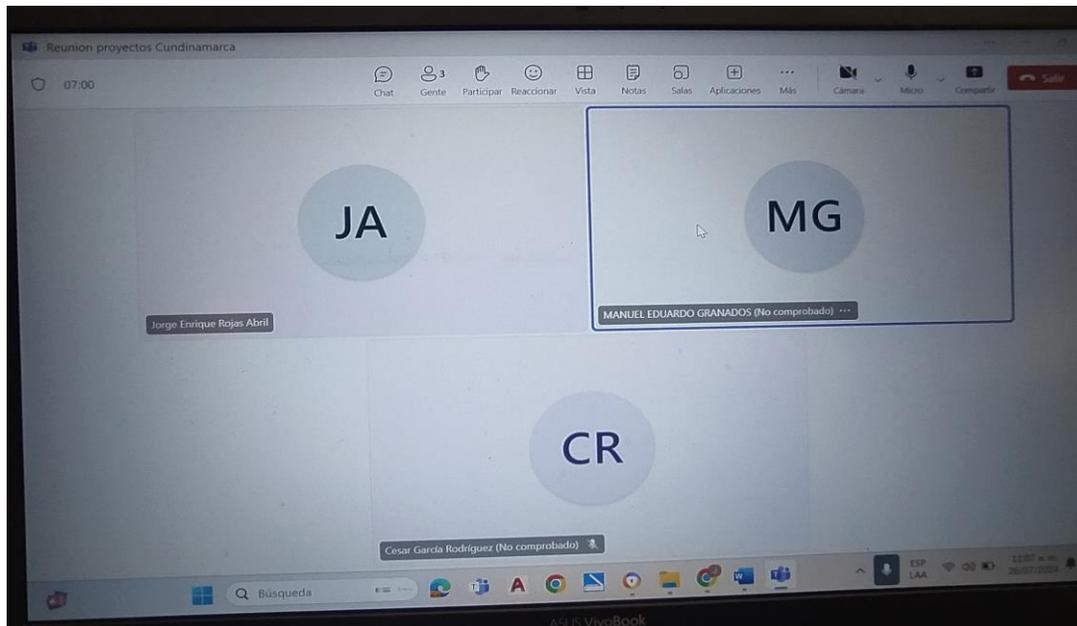

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Fecha: 25 de julio de 2024
