

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No.2 – SEPTIEMBRE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 6 de septiembre de 2024.
HORA:	8:00 a.m. a 9:00 a.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

### ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto alcantarillado Sylvania
6. Proyecto Acueducto urbano Zipaquirá.

### DESARROLLO:

#### 1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

Se realiza reunión el martes 3 de septiembre de 2024 con las siguientes conclusiones:

1. El 11 de septiembre de 2024 la Interventoría entrega reformulación No. 1 a EPC y Ministerio para iniciar la revisión correspondiente.

Se programa reunión para el 27 de septiembre de 2024, para revisión de avances reformulación No. 1

#### Agua Potable Guasca

EPC informa el 29 de agosto de 2024 que el Municipio está realizando la última revisión para realizar trámite de proceso para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio), la planta de optimización de 18 se demuele y se construye la de 32 lts.

El Municipio está organizando la infraestructura para el funcionamiento temporal del laboratorio, bodega y baños.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Municipio está adquiriendo terreno para ampliar el área en la que se construye la infraestructura porque el área actual del predio es insuficiente para el proyecto.

#### **4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo**

EPC en reunión de seguimiento el 6 de septiembre de 2024 informa: Que se realizó reunión de seguimiento con el Alcalde, el cual informo que se prorrogó el convenio suscrito por la junta de acción comunal por 2 meses y adición de 9.998.561. del contrato con la veeduría para fase I. El Municipio informa que realizó contrato de suministro con el Hidrante el 30 de agosto de 2024 para el suministro de materiales para arreglo de fase I, por valor de 36.400.000. Se realiza solicitud a la dirección de aseguramiento de EPC para visitar y verificar el estado de la Ptap ubicada en la vereda del Carmen. Se tramita por EPC solicitud de prórroga 5 meses del contrato de Interventoría.

El contratista entrega los diseños, en noviembre de 2024, para revisión de especialista de EPC para inicios de diciembre de 2024.

Con la información de los diseños y valor de pasos elevados EPC presenta reformulación correspondiente al Ministerio. Con la información de los diseños y valor de pasos elevados EPC presenta reformulación correspondiente al Ministerio.

#### **5. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca**

El contratista está terminando los arreglos finales de domiciliarias el 2 de septiembre de 2024, para iniciar revisión final por EPC a las observaciones solicitadas por el Municipio el 13 de septiembre de 2024.

#### **6. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Silvania el Departamento de Cundinamarca**

El 29 de agosto de 2024 en reunión de seguimiento EPC informa; que, de acuerdo con los recorridos realizados entre el Municipio y Contratista se deben arreglar tapas de pozos, el contratista inicia el arreglo y termina el 20 de septiembre de 2024, para revisión de EPC.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## 7. Construcción Y Optimización Del Sistema De Acueducto Urbano Del Municipio De Zipaquirá


En reunión de seguimiento del 29 de agosto de 2024, Findeter- ing. Juan Pablo Payares informa que pasa a comete técnico el 30 de agosto de 2024 la solicitud de afectación de póliza de estabilidad de obra. El interventor realiza concepto acerca del concepto del contratista de obra que indica que la responsabilidad es de los diseños iniciales, para el 13 de septiembre de 2024. Comité fiduciario ya recibió por parte de la Interventoría, respuesta y valor tasa del siniestro por 514 millones de pesos.

### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega reformulación No. 1 a EPC	Interventoría	11-09-2024
2	Revisión y aval de los componentes de la reformulación No. 1- Paratebueno.	EPC – Contratista de Obra e Interventoría	27-09-2024
3	Proceso mínima cuantía para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio	Municipio de Guasca	30-09-24
4	Adquirir terreno para el proyecto de Guasca	Municipio Guasca	Lo más pronto posible
5	Concepto interventor Zipaquirá	Interventor	13-09-24
6	Terminar recorridos Municipio- contratista -por ejecutar arreglo de tapas de pozos.	Municipio-Contratista	13-09-2024

### FIRMAS:

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

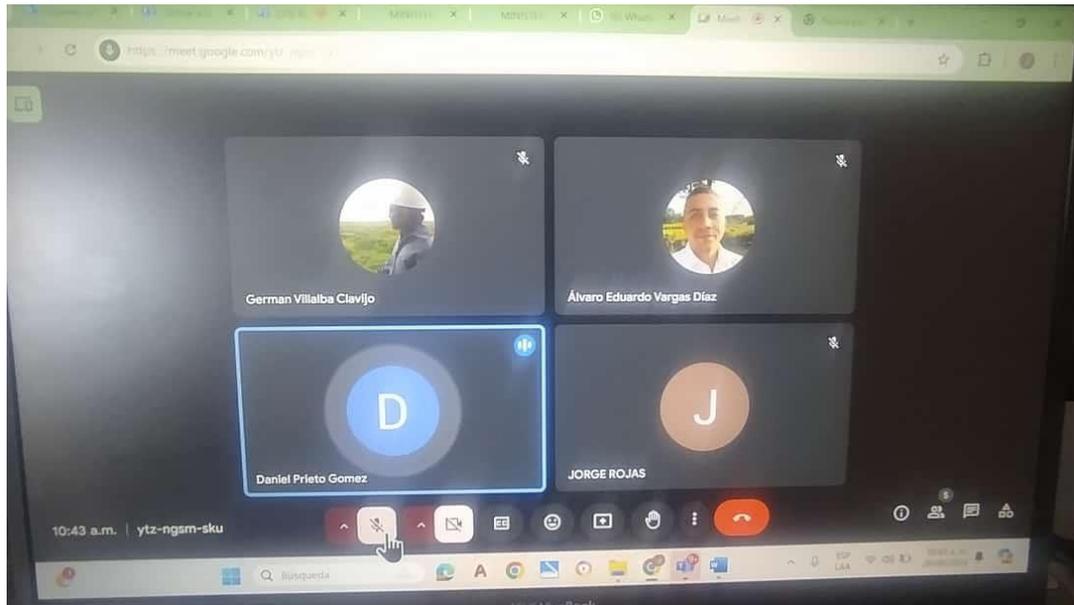

Elaboró: Jorge Enrique Rojas   
Revisó:  
Fecha: 6 de septiembre de 2024
