

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No.5 – SEPTIEMBRE 2024**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, Colombia, 20 de septiembre de 2024.
HORA:	10:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto alcantarillado Silvania
6. Proyecto Acueducto urbano Zipaquirá.

### **DESARROLLO:**

#### **1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.**

No se entrega por EPC, la reformulación No. 1 al Ministerio.

Se realiza reunión el 20 de septiembre de 2024, EPC informa que se revisó cantidades por inmobiliaria e Interventoría y remitieron a EPC el 12 de sep. De 2024. EPC realiza observaciones en reunión del 18 de sep. 2024.

Inmobiliaria se encuentra en trámite de revisión de observaciones realizadas por EPC y entrega respuesta el 30 de septiembre de 2024.

Epc y contratista inician mesas de trabajo de la reformulación no. 1 el lunes 23 de septiembre de 2024 a las 10.am.

EPC informa que la contraloría solicito documentación del proyecto e indica que el proyecto no es funcional

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## Agua Potable Guasca

EPC informa el 20 de septiembre de 2024 que el Municipio publico proceso para reubicación de caseta de operaciones y se encuentra en trámite de contratación.

### 4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

La Contraloría realiza visita el 24 y 25 de septiembre de 2024, al proyecto en compañía de EPC, Municipio, contratista de obra e Interventoría.

La contraloría la documentación del proyecto la cual fue enviada por EPC, el 13 de septiembre de 2024.

El Municipio está trabajando en la recuperación de la Fase I.

EPC inicia con los diseños de pasos elevados el 7 de octubre de 2024.

### 5. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

Se terminaron los arreglos, EPC realizo reunión el 18 de septiembre de 2024 con el Municipio y quedaron pendiente del siguiente entregable:

- Informe contratista e interventor de las actividades de la red domiciliaria y red sanitaria.
- Informe supervisión de EPC
- Informe final de obra e Interventoría del proyecto.
- Ajuste acta de entrega y custodia.
- Coordenadas georreferenciadas de la colilla de domiciliaria.

### 6. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Silvania el Departamento de Cundinamarca

El 20 de septiembre de 2024 en reunión de seguimiento EPC informa:

Que ya se terminó los arreglos solicitados por el municipio y se terminaron los recorridos entre contratista obra e Interventoría y municipio.

EPC tramita acta de recibo para lo cual tendrá reunión el 25 de septiembre de 2024 con contratista de obra e Interventoría.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## 7. Construcción Y Optimización Del Sistema De Acueducto Urbano Del Municipio De Zipaquirá


En reunión de seguimiento del 20 de agosto de 2024, Findeter- ing. Juan Pablo Payares informa que pasa a comete técnico el 30 de agosto de 2024 la solicitud de afectación de póliza de estabilidad de obra. El interventor realiza concepto acerca del concepto del contratista de obra que indica que la responsabilidad es de los diseños iniciales, para el 13 de septiembre de 2024. Comité fiduciario ya recibió por parte de la Interventoría, respuesta y valor tasa del siniestro por 514 millones de pesos.

### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión y aval de los componentes de la reformulación No. 1- Paratebueno.	Inmobiliaria	30-09-2024
2	Reunión revisión reformulación No. 1 Paratebueno	EPC – Contratista de Obra e Interventoría, mvct.	23-09-24
3	Proceso mínima cuantía para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio)	Municipio de Guasca	30-09-24
4	Adquirir terreno para el proyecto de Guasca	Municipio Guasca	Lo más pronto posible
5	Reunión y visita de obra San Bernardo.	EPC- Municipio de San Bernardo - Contraloría	24-25 -09-24
6	Reunión Municipio-contratista. Silvania	Municipio-Contratista	28-09-2024

### FIRMAS:

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

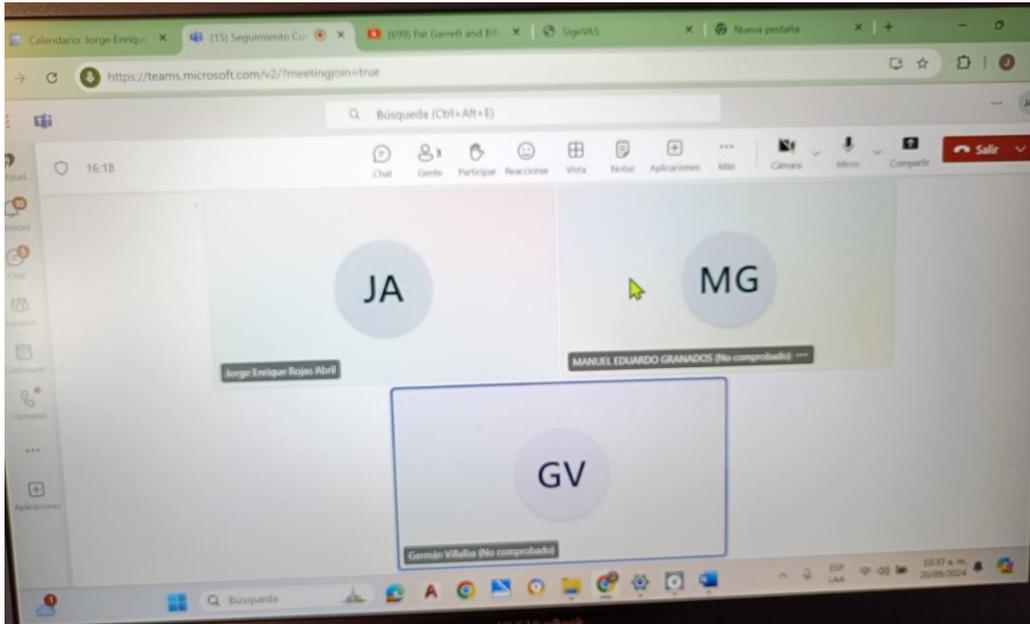

Elaboró: Jorge Enrique Rojas   
Revisó:  
Fecha: 20 de Septiembre de 2024
