

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 3 - Agosto 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 9 de agosto de 2024.
HORA:	8:00 a.m. a 9:00 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

La ESANT – Ing. luz Yaneth Niño informa que la Esant presiona al Municipio para que se tramiten las servidumbres faltantes.

Reunión programada por el Municipio, la ESANT, Contratista de Obra e Interventoría y MVCT para el 1 y 2 de agosto de 2024, visita por todas las partes, no se realizó, el Ministerio no pudo asistir, pero el municipio debe tramitar las servidumbres correspondientes.

2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

El contratista solicita acta mayores y menores cantidades en la entrega de la información, con aval de la Interventoría, ESANT revisa el tema técnico y jurídico. El sistema está en operación por Aguas del Socorro, La Esant entrega respuesta a acta de mayores y menores cantidades en informe el 16 de agosto de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Ministerio solicita el acta de entrega del proyecto, acta de funcionalidad y liquidación del convenio.

3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

La ESANT - Ing. Luz Yaneth Niño informa:

La Esant Realizo visita a la obra el 4 de julio de 2024 con compromiso de radicar documentos de permiso de ocupación de cauce. Por entregar 4 vertimientos en la quebrada palenque, que generan un solo vertimiento final en sector de la vereda 12 ejidos.

La Esant radico al Municipio el 18 de julio de 2024, todos temas técnicos incluyen diseño implantación, caudal, cantidades planos para que el Municipio radique ante la Corporación autónoma de Santander (CAS), visita y permiso de ocupación de cauce.

ESANT se encuentra en trámite legalización de modificación No. 10 de adicional en plazo y valor y ajuste de cronograma a partir del 12 de agosto de 2024, con un adicional de 11 meses.

Que el contratista está en ejecución de obras menores como sumideros, empalmes, atendiendo quejas de la comunidad, arreglo de andenes, por ferias y fiestas en el Municipio, con inicio de actividades de la Cra 6 el 12 de agosto de 2024.

Se continua frente de trabajo con piedra Barichara en La cll 11 entre 7 y 8, de acuerdo con avance se debe terminar el 16 de agosto de 2024.

3 puntos de quebrada necesitan ocupación de cauce, Esant entrega al municipio para radicar a CAS corporación autónoma de Santander

Se construyen cabezotes, escalonados Cra 5 con 6. el pluvial se conecta a la nueva estructura, se encuentran viviendas dentro del lecho y se construye pedraplén.

La Veeduría solicito 2 estructuras nuevas.

El muro de la Cll12 con Cra 5 pegado al coliseo de ferias está en falla, puede colapsar, el municipio levanta el muro del coliseo y arregla la tubería, para construir estructura de separación.

En los rediseños, por las carreras va el sistema pluvial y por las calles el sistema sanitario. Se construyen estructuras de separación Cra 5 con cll6 y cll6 con Cra 3 y entrega de Cra 6 con 6

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Existe fallo en predio sra Hilda bonce, imposición para ingreso arreglar tubería y apelo derecho a pago por la propietaria al Municipio.

Con informe semanal de 5 de agosto de 2024 se tiene un avance físico de 81,58%. Contra un programado de 99,20%

4. Proyecto Acueducto Lebrija

El 9 de agosto de 2024 se realiza reunión de seguimiento entre Findeter y el Ministerio, Findeter informa:

El consultor de ajuste estudios y diseños ha entregado 3 productos para revisión de Interventoría. El valor de asfalto para los 3450 mts, en el casco urbano de Bucaramanga tiene un valor aproximado de 4.500 millones. El contratista presenta presupuesto por 40.665.242.069 de valor de obra total de acuerdo con ajuste de diseños y la Interventoría y Findeter inician su revisión.

5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

El Ministerio tramito otrosí No. 1 de solicitud por parte del Municipio de Mogotes, La Esant S.A E.S.P. de ampliación del plazo del convenio 1373 de 2024 por once (11) meses, del 1 de agosto de 2024 hasta el 30 de junio de 2025.

Con informe 11 semanal del 19-07-2024, se tiene avance del 15,40% ejecutado contra un 16,24 % programado. Se realiza actividades para la conducción de la bocatoma a planta de tratamiento:

- Excavación manual en material común (90%)
- Excavación manual en roca (10%)
- Relleno y compactación manual con material proveniente de la excavación
- Relleno en arena e=15cm para encamado de tubería
- Suministro e Instalación de tubería PVC presión 4" RDE 21
- Suministro e Instalación de codos PVC de 4" 11.25°
- Suministro e Instalación de codos PVC de 4" 22.5°
- Suministro e Instalación de codos PVC de 4" 45°
- Se realiza actividades para la optimización de la red de distribución
- Excavación manual en material común en seco
- Excavación manual en roca
- Excavación manual en material saturado
- Relleno y compactación manual con material proveniente de la excavación
- Relleno en arena e=15cm para encamado de tubería
- Corte y demolición tramos en concreto existente e=12cm

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Retiro de tubería existente (Incluye desconexión y entrega al Prestador del servicio)
- Suministro e Instalación de tubería PVC presión 3" RDE 21
- Reducción/Ampliación 3" x 2" PVC PRESIÓN
- Intervención de domiciliarias en tubería PF+UAD de 1/2"
- Suministro e instalación de collar de derivación en PVC 3"x1/2"
- Suministro e instalación de registro de incorporación de 1/2"

El 24 de julio 2024 solicitud de suspensión por el contratista, avalada por la Interventoría. La Esant envía oficio al contratista de obra e Interventoría el 4 de agosto de 2024, solicitando ejecución de actividades contractuales. El 8 de agosto de 2024 Esant realizo visita de revisión de obras ejecutadas y obras que competen a la reformulación.

Se programa reunión de seguimiento a la reformulación no. 1 para el 14 de agosto de 2024 a las 10 a.m.

La comunidad no permite continuar con el proyecto, porque la Bocatoma no cumple con la provisión de agua, solicitan acompañamiento de la personaría, se debe solicitar apoyo al CAS mediante oficio por parte de la ESANT. Esant Solicita mediante oficio al consultor del proyecto.

La Esant se encuentra preparando la entrega de reformulación No. 1 al Ministerio para finales de agosto de 2024.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión acta de mayores y menores cantidades Socorro	La Esant	16-08-2024
2	Reunión contratista obra e interventoría con Esant-MVCT, de	Contratista de Obra e Interventoría-Esant	14-08-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	revisión entrega reformulación nro. 1 Mogotes.		
3	Inicio obras Cra 6 proyecto PMAA de Vélez	Contratista de obra.	16-08-2024
4.	Revisión presupuesto actualización de estudios y diseños. Lebrija	Findeter	23-08-2024

FIRMAS:

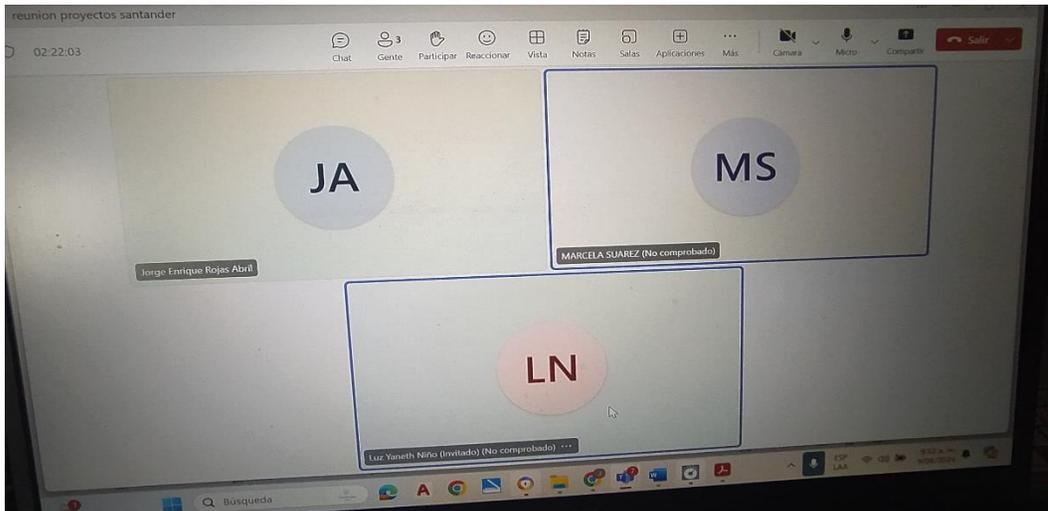

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: agosto 9 de 2024
