

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 4 – Agosto 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 9 de Agosto de 2024.
HORA:	9:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto Tanque Cajicá.
3. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
5. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
6. Proyecto alcantarillado Sylvania
7. Proyecto Acueducto urbano Zipaquirá.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

En reunión de seguimiento del 9 de agosto de 2024 EPC informa:

1. Ya se tiene toda la información por el municipio y contratista para Radicar a Corporinoquia solicitud de permisos, se define fecha en reunión del 13 de agosto, con posible entrega a Corporinoquia el 23 de agosto de 2024.

Para la reformulación No. 1:

El 8 de agosto de 2024 el contratista entrega a la Interventoría para revisión y aprobación, ítems no previstos -25 und.

El 9 de agosto entrega acta modificatoria con balance a Interventoría para revisión.

El 13 de agosto reunión y seguimiento con epc, verificar compromisos de acta del 6 y 9 de agosto de 2024.

2. Proyecto Tanque Cajicá.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

EPC informa que Interventoría se comunicó con el consultor informando que da su aprobación a modificación de filtro en el muro de contención, el filtro quedo a 2 aguas, de la viga perimetral no se ha dado respuesta, la contratista continua en ejecución.

3. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca

Para el 25 de julio de 2024, el Municipio y EcoSiecha (Operación planta se encuentra en trámite de proceso mínima cuantía para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio), optimización de 18 a 32 lts.

El Municipio está organizando la infraestructura para el funcionamiento temporal del laboratorio, bodega y baños.

El Municipio está adquiriendo terreno para ampliar el área en la que se construye la infraestructura porque el área actual del predio es insuficiente para el proyecto.

4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

El 30 de julio de 2024 se realiza reunión en EPC con presencia del alcalde del Municipio informando que se amplió contrato de reparación de la fase I hasta el 16 de agosto de 2024. compromisos: 1. El Municipio debe iniciar con la carga, revisión y prueba de las redes de fase I para puesta en operación. 2. El Municipio solicita apoyo a EPC de especialista hidráulico. 3. próximo comité 20 de agosto de 2024. El 30 de agosto el Municipio entrega informe de avance puesta en marcha de fase I.

EPC en reunión de seguimiento el 9 de agosto de 2024 informa: Se tramita por EPC solicitud de prorroga 3 meses del contrato de Interventoría.

El contratista entrega los diseños, en noviembre de 2024, para revisión de especialista de EPC para inicios de diciembre de 2024.

Con la información de los diseños y valor de pasos elevados EPC presenta reformulación correspondiente al Ministerio. Con la información de los diseños y valor de pasos elevados EPC presenta reformulación correspondiente al Ministerio.

5. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El contratista está terminando los arreglos finales de domiciliarias el 14 de agosto de 2024, para iniciar revisión final por EPC a las observaciones solicitadas por el Municipio.

6. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Silvania el Departamento de Cundinamarca

El 09 de agosto de 2024 en reunión de seguimiento EPC informa; que se iniciaron recorridos el 6 de agosto de 2024, entre el municipio, contratista de recibo de la infraestructura por tramos. Se terminan recorridos el 16 de agosto de 2024, en concepto de EPC el proyecto es funcional.

7. CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

En reunión de seguimiento del 9 de agosto de 2024, Findeter informa que ya recibió por parte de la Interventoría, respuesta y valor tasa del siniestro por 514 millones de pesos, e indicando que la Interventoría no ha recibido respuesta del contratista a la solicitud de observaciones realizadas por EAAAZ a obras ejecutadas.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicar en Corporinoquia solicitud permisos Paratebueno	Municipio Paratebueno	23-08-2024
2	Concepto técnico consultor viga perimetral Cajicá.	EPC – Cajicá y Consultor.	31-08-2024
3	Proceso mínima cuantía para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio)	Municipio de Guasca	31-08-24

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

4	Adquirir terreno para el proyecto de Guasca	Municipio Guasca	Lo más pronto posible
5	EPC cita a reunión con el Municipio de San Bernardo	EPC- Municipio de San Bernardo - MVCT	20-08-2024
6.	Informe puesta en marcha fase I - San Bernardo	Municipio de San Bernardo	30-08-2024
5	Terminan recorridos Municipio- contratista -obras ejecutadas - Silvania	Municipio de Silvania	16-08-2024

FIRMAS:

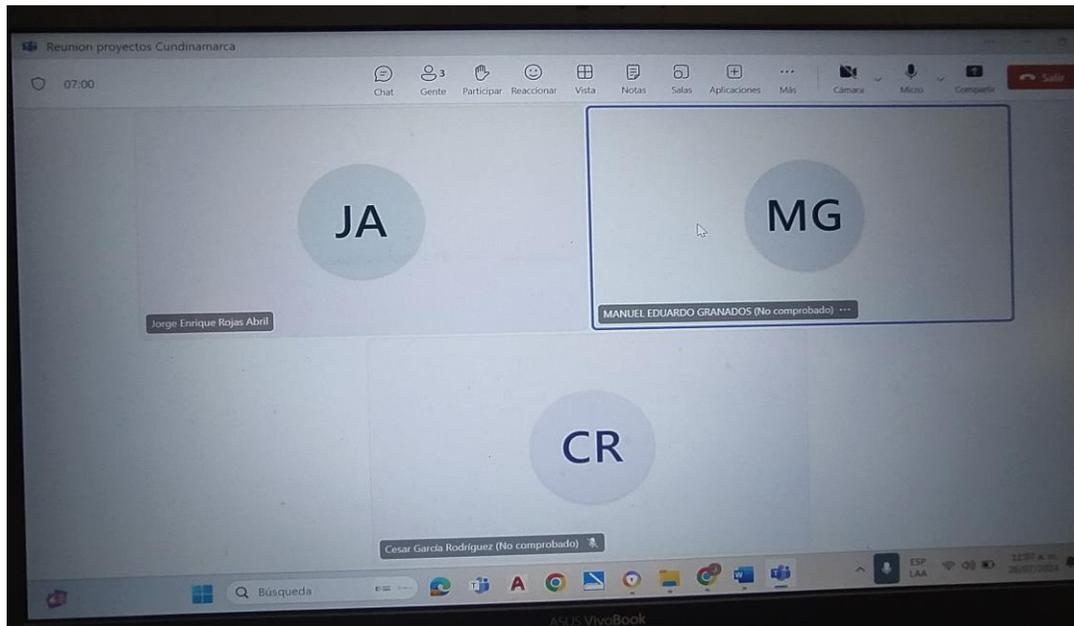

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: 09 de Agosto de 2024
