

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 5 – Agosto 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 15 de Agosto de 2024.
HORA:	9:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto Tanque Cajicá.
3. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
5. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
6. Proyecto alcantarillado Silvania
7. Proyecto Acueducto urbano Zipaquirá.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

En reunión de seguimiento del 15 de agosto de 2024 EPC informa:

1. Ya se tiene toda la información por el Municipio y contratista para Radicar a Corporinoquia solicitud de permisos, se define fecha entrega a Corporinoquia el 15 de agosto de 2024, por parte del Municipio.

Para la reformulación No. 1:

2. El contratista solicito reajuste a precios en el suministro de tubería
El capítulo 4. 1 ajuste a análisis de precios unitarios del suministro de tubería a partir de cantidades no ejecutados.

2. Proyecto Tanque Cajicá.

EPC informa que envío informe de Interventoría a la ingeniera María Alejandra Castro Bolaños, nuevo apoyo a la supervisión por parte del MVCT.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca

Para el 12 de agosto de 2024, el Municipio y EcoSiecha (Operación planta se encuentra en trámite de proceso mínima cuantía para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio), optimización de 18 a 32 lts.

El Municipio está organizando la infraestructura para el funcionamiento temporal del laboratorio, bodega y baños.

El Municipio está adquiriendo terreno para ampliar el área en la que se construye la infraestructura porque el área actual del predio es insuficiente para el proyecto.

4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

EPC en reunión de seguimiento el 9 de agosto de 2024 informa: Se tramita por EPC solicitud de prórroga 3 meses del contrato de Interventoría.

El contratista entrega los diseños, en noviembre de 2024, para revisión de especialista de EPC para inicios de diciembre de 2024.

Con la información de los diseños y valor de pasos elevados EPC presenta reformulación correspondiente al Ministerio. Con la información de los diseños y valor de pasos elevados EPC presenta reformulación correspondiente al Ministerio.

Se tiene reunión de seguimiento con el alcalde el 20 de agosto de 2024.

5. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

El contratista termina los arreglos finales de domiciliarias para el 20 de agosto de 2024 e iniciar revisión final por EPC a las observaciones solicitadas por el Municipio, a finales del mes de agosto de 2024

6. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Sylvania el Departamento de Cundinamarca

El 09 de agosto de 2024 en reunión de seguimiento EPC informa; que se iniciaron recorridos el 6 de agosto de 2024, entre el municipio, contratista de recibo de la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

infraestructura por tramos. Se terminan recorridos el 16 de agosto de 2024, en concepto de EPC el proyecto es funcional.

7. CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA


En reunión de seguimiento del 9 de agosto de 2024, Findeter informa que ya recibió por parte de la Interventoría, respuesta y valor tasa del siniestro por 514 millones de pesos, e indicando que la Interventoría no ha recibido respuesta del contratista a la solicitud de observaciones realizadas por EAAAZ a obras ejecutadas.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicar en Corporinoquia solicitud permisos Paratebueno	Municipio Paratebueno	23-08-2024
2	Concepto técnico consultor viga perimetral Cajicá.	EPC – Cajicá y Consultor.	31-08-2024
3	Proceso mínima cuantía para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio	Municipio de Guasca	31-08-24
4	Adquirir terreno para el proyecto de Guasca	Municipio Guasca	Lo más pronto posible
5	EPC cita a reunión con el Municipio de San Bernardo	EPC- Municipio de San Bernardo - MVCT	20-08-2024
6.	Informe puesta en marcha fase I - San Bernardo	Municipio de San Bernardo	30-08-2024
5	Terminan recorridos Municipio- contratista -obras ejecutadas - Silvania	Municipio de Silvania	16-08-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:

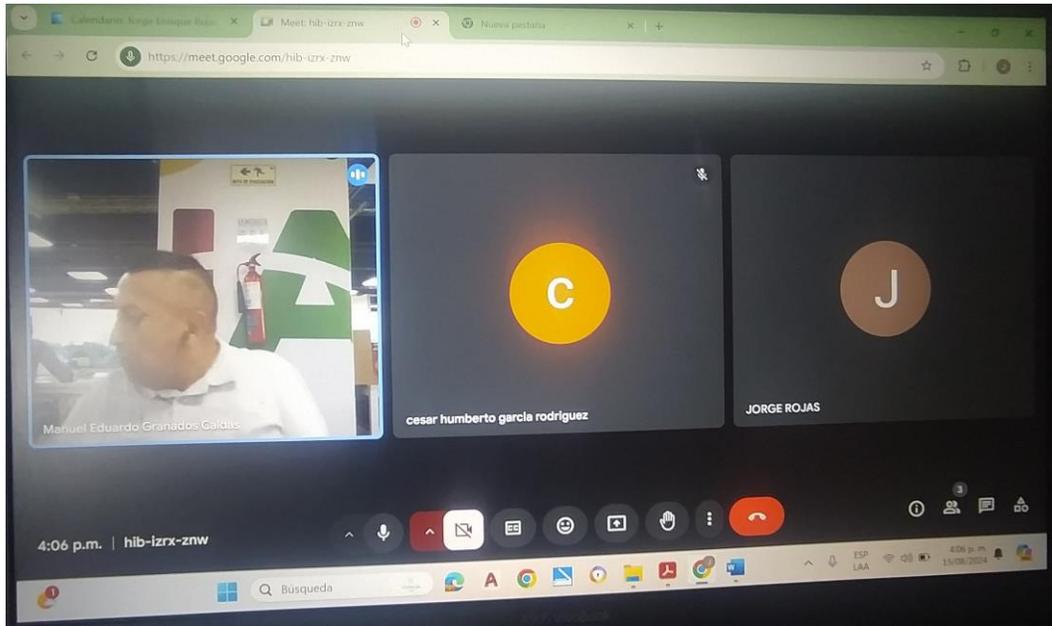

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: 15 de Agosto de 2024
