

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 9 – Agosto 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 23 de Agosto de 2024.
HORA:	10:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto Tanque Cajicá.
3. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
5. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
6. Proyecto alcantarillado Sylvania
7. Proyecto Acueducto urbano Zipaquirá.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

En reunión de seguimiento del 16 de agosto de 2024 EPC y contratista informa:

1. EPC informa que tiene reunión el 27 de agosto de 2024, para revisar radicación del municipio a Corporinoquia y avance de presentación de reformulación No. 1 al Ministerio.
2. El contratista solicito reajuste a precios en el suministro de tubería
El capítulo 4. 1 ajuste a análisis de precios unitarios del suministro de tubería a partir de cantidades no ejecutados.
3. Se entrega reformulación No. 1, en el mes de septiembre 2024.
4. El contratista debe hacer análisis con el ICOSI, presentar cotizaciones y lista de referencia para ajuste de precios.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca

Para el 23 de agosto de 2024, EPC informa que el Municipio elabora pliegos para traslado de caseta de operaciones para publicación en la última semana de agosto, para traslado de caseta de operaciones.

El Municipio está organizando la infraestructura para el funcionamiento temporal del laboratorio, bodega y baños.

El Municipio está adquiriendo terreno para ampliar el área en la que se construye la infraestructura porque el área actual del predio es insuficiente para el proyecto.

4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

EPC informa que la reunión del 20 de agosto de 2024 se reprogramo para el martes 27 de agosto a las 10 a.m. en EPC con el Municipio.

El contratista entrega los diseños, en noviembre de 2024, para revisión de especialista de EPC para inicios de diciembre de 2024.

Con la información de los diseños y valor de pasos elevados EPC presenta reformulación correspondiente al Ministerio. Con la información de los diseños y valor de pasos elevados EPC presenta reformulación correspondiente al Ministerio.

5. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

El contratista termino los arreglos finales de domiciliarias, está pendiente hacer tapón en domiciliaria que termina en la semana del 30 de agosto de 2024. El contratista entrego pólizas a EPC, quien solicita recibo de pago e inicia con programación de visita de revisión e inicio de actas de recibo de las observaciones presentadas por el Municipio.

6. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Svania el Departamento de Cundinamarca

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El 23 de agosto de 2024 en reunión de seguimiento EPC informa; que se iniciaron recorridos el 6 de agosto de 2024, entre el municipio, contratista de recibo de la infraestructura por tramos. Se terminan recorridos la primera semana de septiembre de 2024.

7. CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA


En reunión de seguimiento el Ing. Juan Fernando Payares informa que el contratista entregó respuesta al interventor indicando que las fallas corresponden a los diseños iniciales. Se está en trámite de concepto por el interventor. Findeter informa que inicio siniestro el contratista.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión radicación Corporinoquia al Municipio. Paratebueno	Municipio	27-08-2024
3	Proceso mínima cuantía para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio)	Municipio de Guasca	31-08-24
4	Adquirir terreno para el proyecto de Guasca	Municipio Guasca	Lo más pronto posible
5	EPC cita a reprogramación de reunión con el Municipio de San Bernardo	EPC- Municipio de San Bernardo - MVCT	27-08-2024
65	Terminan recorridos Municipio- contratista -obras ejecutadas - Silvania	Municipio de Silvania	6-09-2024

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

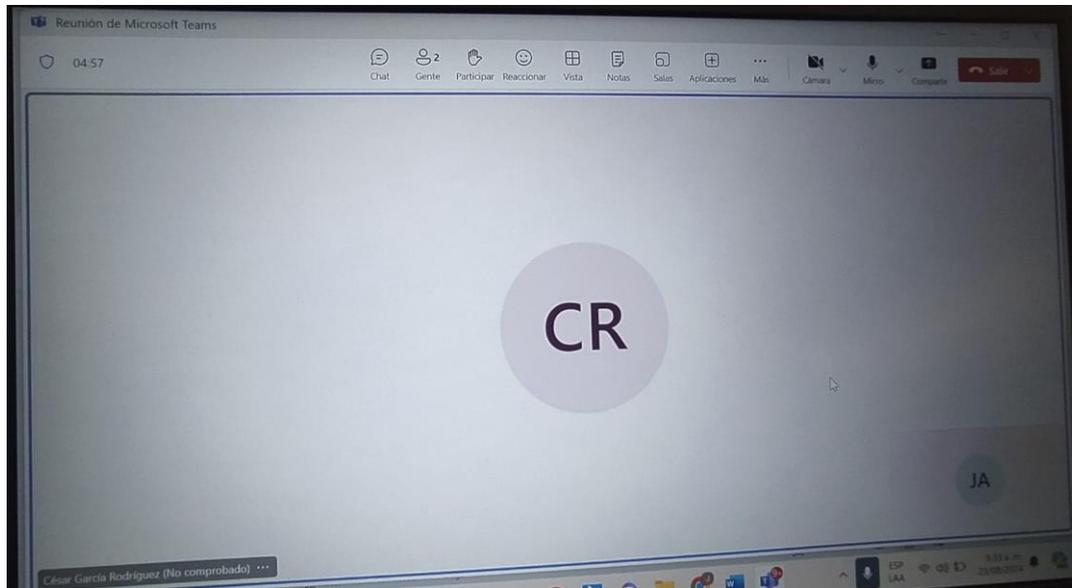

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: 23 de Agosto de 2024
