

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 7 – Agosto 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 29 de Agosto de 2024.
HORA:	10:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto alcantarillado Silvania
6. Proyecto Acueducto urbano Zipaquirá.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

Se realiza reunión virtual, con presencia del Municipio, EPC, Ministerio, Contratista de Obra e Interventoría, se revisan compromisos:

1. El Municipio indica que con radicado 202414118 del 23 de agosto de 2024, a Corporinoquia, solicita permiso para 4 estructuras.
Para el permiso de vertimiento informa el Ing. Edwar Andrés Sepúlveda, R.L. del contratista que ya se tiene el tramite de vertimiento y que, para el ajuste de coordenadas por el nuevo sitio, cuando se reinicie el proyecto se reinicia el trámite.
2. Se tramita Acta Modificatoria de cantidades de acuerdo con revisión del proyecto y reformulación No. 1, en revisión por Interventoría.
3. Ítems no previstos en revisión por Interventoría.
4. Actualización de precios para suministro de tubería no instalada solicitado por el contratista en revisión por parte de Interventoría.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5. Se programa por EPC, mesa técnica para revisar solicitud del contratista de ajuste de precio de tubería no instalada para el martes 3 de septiembre a las 3p.m.

6. La Interventoría se encuentra en revisión de diseños Hidráulico, Estructural y Eléctrico.

7. EPC oficia a Contratista de Interventoría, solicitando con urgencia se entregue la información revisada y validada para poder revisar y radicar la reformulación No. 1 al Ministerio.

2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca

EPC informa el 29 de agosto de 2024 que el Municipio está realizando la última revisión para realizar trámite de proceso para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio), la planta de optimización de 18 de demuele y se construye la 32 lts.

El Municipio está organizando la infraestructura para el funcionamiento temporal del laboratorio, bodega y baños.

El Municipio está adquiriendo terreno para ampliar el área en la que se construye la infraestructura porque el área actual del predio es insuficiente para el proyecto.

4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

EPC en reunión de seguimiento el 29 de agosto de 2024 informa:
Que se reprograma reunión por solicitud del Alcalde por tener revisión de Contraloría para el 3 de septiembre de 2024 a las 2:00 p. en las oficinas de EPC, para revisar avances de la fase No. 1 del Proyecto.

Se tramita por EPC solicitud de prórroga 3 meses del contrato de Interventoría.

El contratista entrega los diseños, en noviembre de 2024, para revisión de especialista de EPC para inicios de diciembre de 2024.

Con la información de los diseños y valor de pasos elevados EPC presenta reformulación correspondiente al Ministerio. Con la información de los diseños y valor de pasos elevados EPC presenta reformulación correspondiente al Ministerio.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

El contratista está terminando los arreglos finales de domiciliarias el 2 de septiembre de 2024, para iniciar revisión final por EPC a las observaciones solicitadas por el Municipio el 13 de septiembre de 2024.

6. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Silvania el Departamento de Cundinamarca

El 29 de agosto de 2024 en reunión de seguimiento EPC informa; que, de acuerdo con los recorridos realizados entre el Municipio y Contratista se deben arreglar tapas de pozos, el contratista inicia el arreglo y termina el 20 de septiembre de 2024, para revisión de EPC.

7. CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

En reunión de seguimiento del 29 de agosto de 2024, Findeter- ing. Juan Pablo Payares informa que pasa a comete técnico el 30 de agosto de 2024 la solicitud de afectación de póliza de estabilidad de obra. El interventor realiza concepto acerca del concepto del contratista de obra que indica que la responsabilidad es de los diseños iniciales, para el 13 de septiembre de 2024. Comité fiduciario ya recibió por parte de la Interventoría, respuesta y valor tasa del siniestro por 514 millones de pesos.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión y aval de los componentes de la reformulación No. 1- Paratebueno.	Interventoría	15-09-2024
2	Reunión revisión Solicitud de mayores precios para Suministro de Tubería	EPC – Contratista de Obra e Interventoría	3-09-2024 a las 3:00 p.m.
3	Proceso mínima cuantía para alquiler de container para trasladar lo que está	Municipio de Guasca	30-09-24

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio)		
4	Adquirir terreno para el proyecto de Guasca	Municipio Guasca	Lo más pronto posible
5	EPC cita a reunión con el Municipio de San Bernardo	EPC- Municipio de San Bernardo - MVCT	03-09-2024 2: p.m
6	Terminar recorridos Municipio- contratista -por ejecutar arreglo de tapas de pozos.	Municipio-Contratista	20-09-2024

FIRMAS:

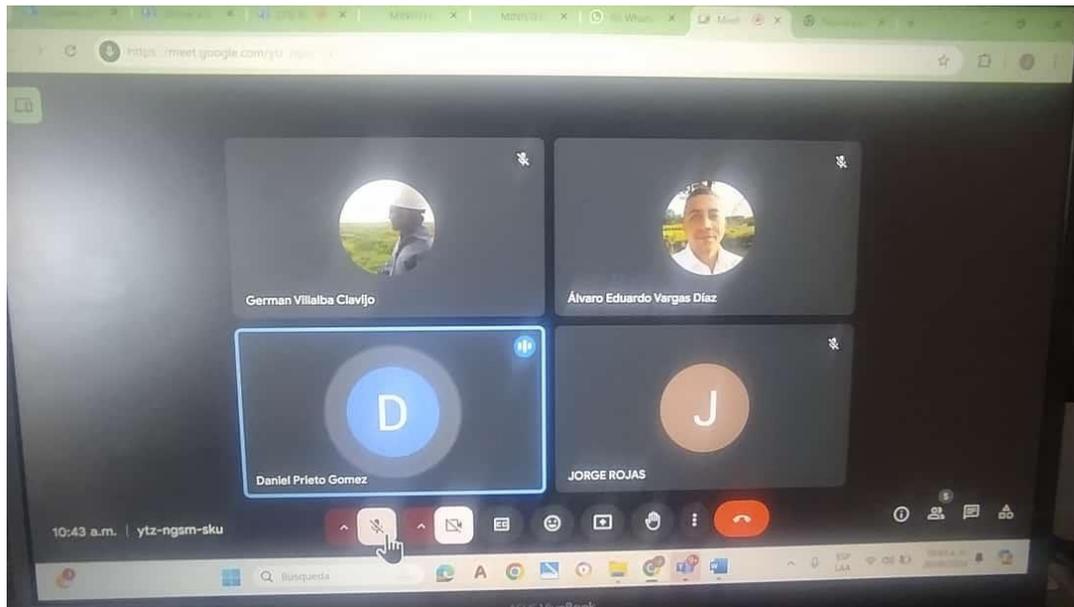

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: 29 de Agosto de 2024
