



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 8 de octubre de 2024
HORA:	De 1:00pm a 2:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo a la supervisión – Subdirección de proyectos – MVCT Edison Javid Quintero- Subgerente Técnico de Aguas de Bolívar Ever José Anaya Suarez - Aguas de Bolívar Ian Carlos Puerta - Consorcio fase 2 San Juan Luis Carlos Aguaran - Inter alcantarillado fase 2 Francisco Taborda - Inter alcantarillado fase 2
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida
1. Inducción al tema a tratar
2. Compromisos.

DESARROLLO:

Durante la reunión semanal, el ingeniero Luis Carlos Iguaran detalló las actividades realizadas en la obra entre el 2 y el 8 de octubre. Informó que el contratista decidió no emitir actas de cobro por el mes de septiembre debido al bajo porcentaje de avance, prefiriendo consolidar los avances de septiembre y octubre en una sola acta. Se expusieron las actividades específicas de instalación de tuberías, fundición de manholes, y avances en la EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales), así como en la compactación y reposición de pavimento. Las evidencias de cada actividad se presentaron mediante fotografías.


CONCLUSIONES:

- Existen atrasos acumulados en el contrato, y se planteó la necesidad de conocer su magnitud.
- Se evidenció la necesidad de reforzar el componente eléctrico en la EBAR y dar seguimiento a las compras y al personal activo.
- Compromisos: presentar un cuadro con detalles de frentes de obra, maquinaria y suministros; incluir reportes de días de lluvia y problemáticas comunitarias; y enviar un reporte semanal por correo.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	se debe realizar un cuadro con los frentes de obra de septiembre y los que están actualmente, maquinaria y suministros	Interventoría	09/10/2024
2	continuar incluyendo los días de lluvia dentro de las diapositivas		Diapositivas semanales
3	realizar registro semanal de problemas presentados en la comunidad o cualquier otra área	Contratista	
4	reporte pasarlo semanal al correo	Interventoría	

FIRMAS:

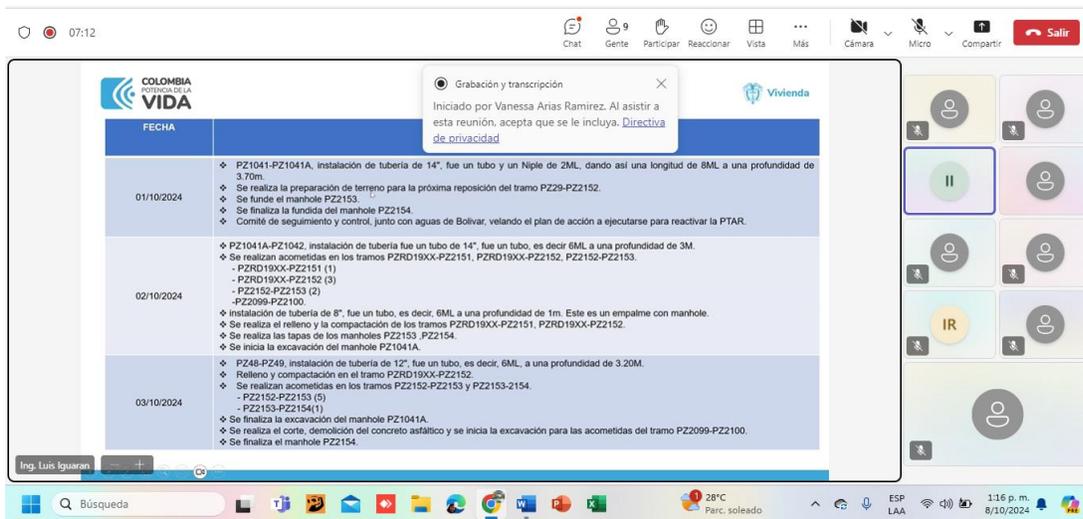

The screenshot shows a meeting recording interface with a table of dates and activities. The table has three columns: 'FECHA', 'Actividad', and 'Responsable'. The activities are detailed with specific tasks and dates.

FECHA	Actividad	Responsable
01/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> PZ1041-PZ1041A, instalación de tubería de 14", fue un tubo y un Niple de 2ML, dando así una longitud de 8ML a una profundidad de 3.70m. Se realiza la preparación de terreno para la próxima reposición del tramo PZ29-PZ2152. Se funde el manhole PZ2153. Se finaliza la fundida del manhole PZ2154. Comité de seguimiento y control, junto con aguas de Bolívar, velando el plan de acción a ejecutarse para reactivar la PTAR. 	
02/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> PZ1041A-PZ1042, instalación de tubería fue un tubo de 14", fue un tubo, es decir 6ML a una profundidad de 3M. Se realizan acometidas en los tramos PZRD19XX-PZ2151, PZRD19XX-PZ2152, PZ2152-PZ2153. - PZRD19XX-PZ2151 (1) - PZRD19XX-PZ2152 (3) - PZ2152-PZ2153 (2) -PZ2099-PZ2100. Instalación de tubería de 8", fue un tubo, es decir, 6ML a una profundidad de 1m. Este es un empalme con manhole. Se realiza el relleno y la compactación de los tramos PZRD19XX-PZ2151, PZRD19XX-PZ2152. Se realiza las tapas de los manholes PZ2153 -PZ2154. Se inicia la excavación del manhole PZ1041A. 	
03/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> PZ46-PZ49, instalación de tubería de 12", fue un tubo, es decir, 6ML, a una profundidad de 3.20M. Relleno y compactación en el tramo PZRD19XX-PZ2152. Se realizan acometidas en los tramos PZ2152-PZ2153 y PZ2153-2154. - PZ2152-PZ2153 (5) - PZ2153-PZ2154(1) Se finaliza la excavación del manhole PZ1041A. Se realiza el corte, demolición del concreto asfáltico y se inicia la excavación para las acometidas del tramo PZ2099-PZ2100. Se finaliza el manhole PZ2154. 	

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
 Fecha: 10/10/2024
