

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 1366 DE 2023.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 24 de octubre de 2024
HORA:	De 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual – Municipio de El Copey – Mesa técnica de seguimiento al proyecto que se ejecuta bajo el CUR 1366 de 2023.
ASISTENTES:	Por el MVCT: Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB Por el Municipio: Blas Andrés Gamarra – Secretario de Infraestructura Municipio de El Copey – Cesar, Supervisor proyecto CUR 1366 de 2023. Contratista de interventoría – Consorcio INTERGAR - RL Andrés Amador García Rueda
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Municipio de El Copey CUR 1366 de 2023 – Seguimiento a la ejecución del proyecto “OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR”.



- Avance físico y financiero del proyecto.
- Subsanacones a los requerimientos hidráulicos y de presupuesto para continuidad de reformulación del proyecto.

DESARROLLO:

1. Avance físico y financiero del proyecto: Se realizó por parte de la interventoría Consorcio INTERGAR, una presentación de avance del proyecto, en la cual se da el estado de avance del proyecto con corte al 24 de octubre de 2024, donde se tiene un avance físico ejecutado para el proyecto del 67,44% frente a un programado del 68,55%, lo que representa un atraso frente a la programación de la obra de 1,11%. El atraso se debe a la temporada de lluvias que se presenta a nivel nacional, donde el municipio de El Copey no ha sido ajeno a la situación climática que se está presentado (temporada de lluvias), situación que ha generado afectaciones en las excavaciones, en la conformación de los llenos de

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

las brechas donde se instalan las tuberías de acueducto y el reparcho de vías con el pavimento hidráulico. Se presentan imágenes de la presentación realizada por la interventoría del proyecto.

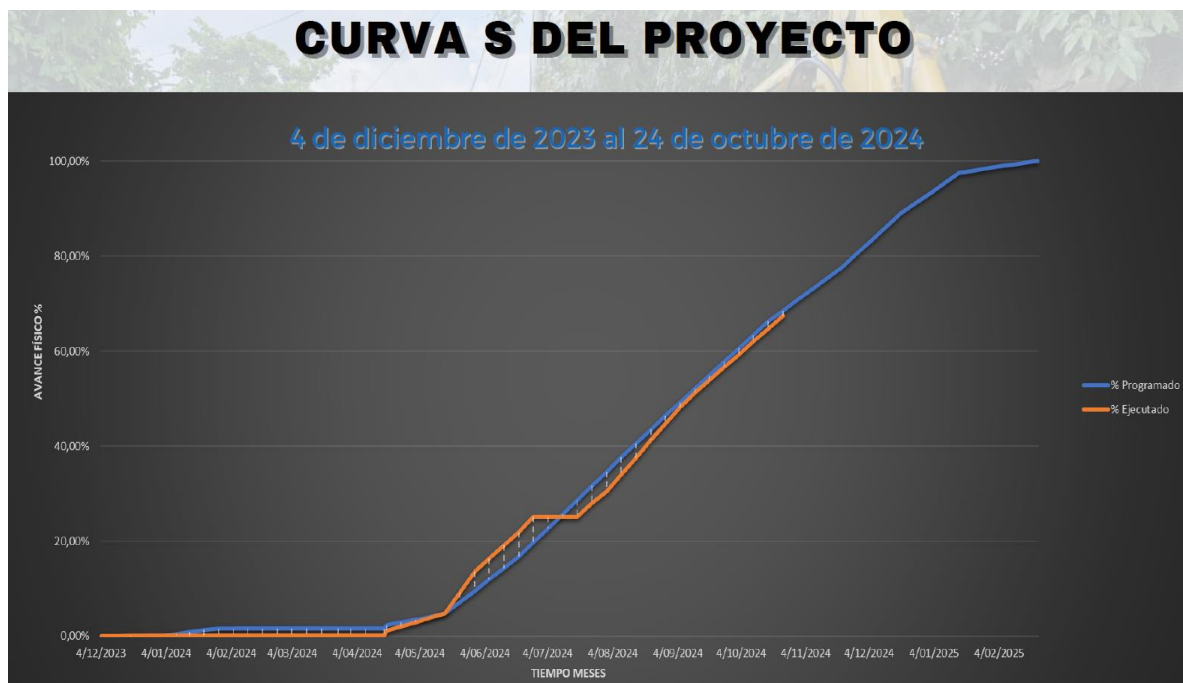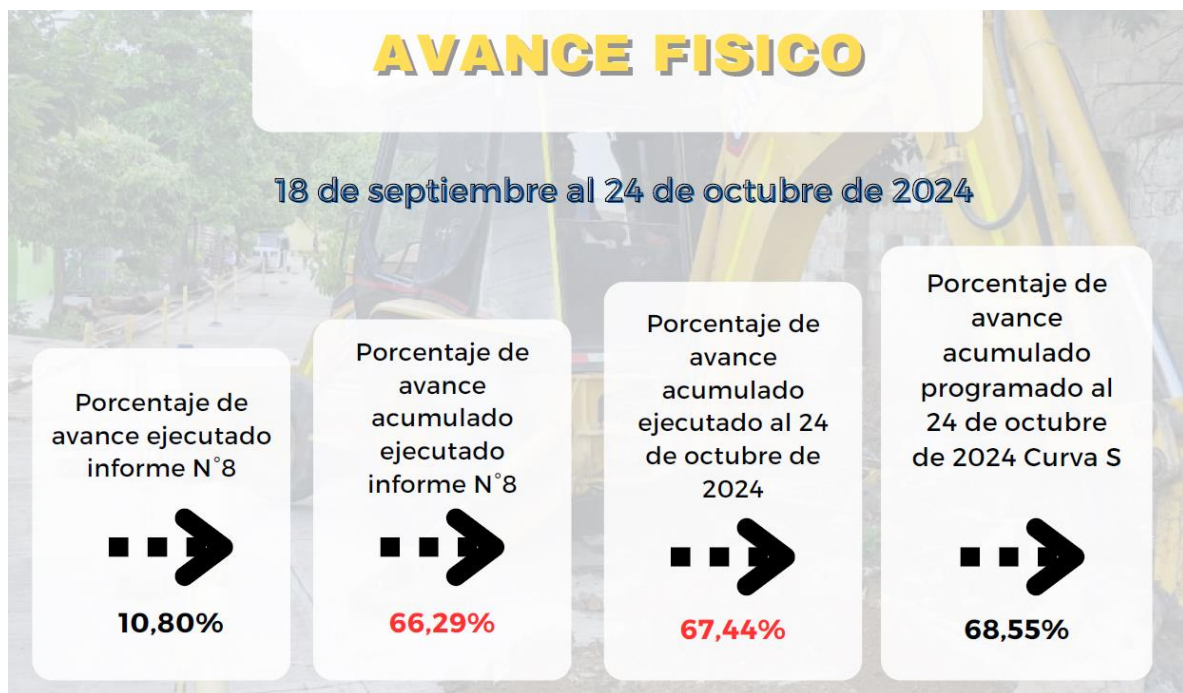

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01


IMPREVISTOS



Los sectores intervenidos a la fecha son:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

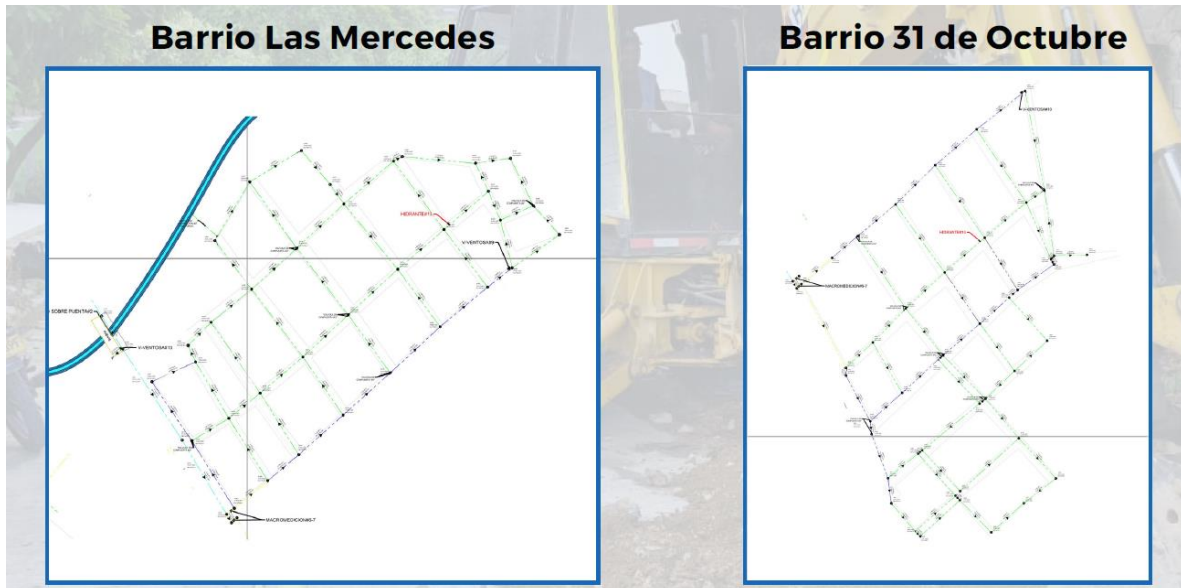

Se informó que la mano de obra no calificada que labora en el proyecto toda es del municipio de El Copey, lo anterior debido a que en los diferentes sectores que se están interviniendo los líderes sociales han solicitado la inclusión de personal, lo cual se viene desarrollando conforme a las vacantes que se vayan presentando.

Además, se vienen realizando las pruebas hidráulicas a los sectores donde se desarrollan las actividades físicas en su totalidad para ir recibiendo los sectores por parte de la interventoría, a continuación, se muestran imágenes de las pruebas realizadas y el funcionamiento de un hidrante instalado en el barrio Santo Domingo.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN



También en el proyecto una vez se instalan las tuberías de acueducto y se inicia el relleno y compactación de las brechas, estas se dejan identificadas con la respectiva cinta azul indicando que en esta se encuentran las redes de agua potable.

EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN



2. Avances proceso para la reformulación del proyecto: Por parte del apoyo a la supervisión del convenio del MVCT, se informó que la información técnica correspondiente al presupuesto y el componente hidráulico se encuentra a la espera de las subsanaciones por parte del ejecutor para cumplir con los requerimientos de los evaluadores del MVCT, una vez se tengan las subsanaciones a las observaciones a estos componentes serán remitidas a los evaluadores para obtener el concepto de favorabilidad y poder continuar el trámite respectivo ante el MVCT.

También evidencia la interventoría que conforme se han instalado los micromedidores del proyecto, se tiene proyectada una cantidad mayor a la que actualmente se requiere, por lo anterior esta variación se tendrá en cuenta para la reformulación que esta en trámite ante el MVCT.

En la parte social, la interventoría solicita apoyo al municipio para realizar labores sociales y de ejecución de las obras en algunos sectores del municipio, por temas de seguridad. Para ello el secretario de infraestructura informa que brindara el apoyo y el acompañamiento para adelantar las actividades requeridas en dichos sectores.

3. Varios: Se reitera al municipio que se debe emitir respuesta al oficio radicado con Nro. 2024EE0052836 donde se realizó un llamado de carácter urgente al Municipio para que, en el marco del principio de cooperación y coordinación armónica entre entidades administrativas, se dé prioridad al proyecto de constitución de empresa de servicios públicos para la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y sus actividades complementarias en el municipio de El Copey – Cesar.

Se plantea la solicitud de prórroga al convenio ya que el mismo vence el 12 de enero de 2025 y los contratos derivados conforme a las eventualidades contractuales que se tienen su fecha de finalización esta para el 22 de febrero de 2025, por lo anterior se solicita al municipio ir adelantando la solicitud de prórroga y los documentos requeridos para realizar el trámite, el cual se debe presentar ante el MVCT a más tardar el 20 de noviembre de 2024.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Subsanaciones al presupuesto y componente hidráulico del proyecto para trámite de reformulación ante el MVCT.	Municipio de El Copey (Contratos derivados)	29 de octubre de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Solicitud y soportes documentales para prórroga al CUR 1366 de 2023.	Municipio de El Copey	20 de noviembre de 2024.

Asistencia a la reunión virtual

 **Comité de seguimiento CUR 1366 de 2023** Chat Compartida Detalles Asistente para progra... Resumen **Asistencia** Pizarra de reunión +2 

jueves, 24 de octubre de 2024 3:04 p. m. - 4:05 p. m. 

4

Asistieron

3:04 p. m. - 4:05 p. m.

Hora de inicio y finalización

1h 1m 36s

Duración de la reunión

42m 56s

Tiempo medio de

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	3:08 p. m.	4:05 p. m.	57m 29s	Organizador
 ANDRES AMADOR GARCIA RU... andres.garcia03@ustabuca.edu.co	3:08 p. m.	4:05 p. m.	57m 11s	Moderador
 BLAS ANDRES GA... (No comprobado)	3:08 p. m.	3:11 p. m.	3m	Moderador
 BLAS ANDRES GA... (No comprobado)	3:11 p. m.	4:05 p. m.	54m 4s	Moderador

Enlace de grabación de la reunión:

[Comité de seguimiento CUR 1366 de 2023-20241024_151315-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero
