



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 3 DE OCTUBRE DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	3 de Octubre de 2024
HORA:	De 2:30 pm a 3:30pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes - Ing. Supervisión FINDETER Fernanda Villegas – Auxiliar de Obra Grupo More Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz – Residente Grupo MORE Oscar Aranda – Director Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Obra Grupo MORE Carlos Soto - Interventoría INTER JCD Elizabeth Duarte – Social Interventoría INTER JCD Luisa González - Contratista Interventoría INTER JCD Mario Triana – SST Interventoría Jesús Ruiz – Supervisor EMCASERVICIOS S.A Carlos Zapata – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Olaya Larrahondo - Emquilichao E.S.P
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El día de 3 octubre de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Informe de avance del contrato de obra PAT-ATF-O-043-2023
4. Compromisos

DESARROLLO:

Inicia la presentación del avance de obra mediante la proyección simultanea de diapositivas, en lo cual se evidencia en el periodo semanal comprendido entre el 23 al 29 de septiembre, los porcentajes de avance de obra corresponde a los siguientes:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1. Porcentaje de obra programada esta semana es del 88,56%.
2. Porcentaje de obra ejecutado y aprobado por la Interventoría es de 87,15%, con lo cual, se tiene un retraso de 1.41%.

Las actividades que se están ejecutando actualmente en obra, son:

1. En la estructura del tanque de almacenamiento: se continuó en instalación del Geodren en el perímetro de la estructura, además de, la instalación de la grava $\frac{3}{4}$ "para el proceso de filtración, sumado a esto, se inicia con el relleno y compactación de material in-situ al 90% P.M.
2. En las estructuras correspondiente al Tanque de Filtros, se inició con el armado y encofrado de las pasarelas conforme a los planos. Por otra parte, en el Tanque de Sedimentador, se inició con el armado y fundición de la losa del canal de agua sedimentada que conecta con el tanque de Filtros.
3. En la estructura del Tanque de Cloración, se continua con el retiro de los puntales y elementos internos empleados para la fundición de la losa de cierre del tanque en mención.
4. En la estructura Tanque de Floculador, durante la semana se inició con la implantación del tanque, además de, la excavación de los canales que conforman la estructuras, así mismo, es pertinente mencionar que, se realizó el lleno y compactación de la brecha existente en los tanques de Filtros y Sedimentador que colindan con el Floculador.
5. Por otro lado, en la estructura de las casetas de sala de juntas y oficina, se culmina la fundición de la viga cinta, además de, iniciar el 30 de Septiembre con las actividades de revestimiento con mortero en las paredes, y continuar con la instalación de la tubería sanitaria y de presión, adicionalmente, se inicia con la construcción de las cajas de inspección.
6. Por otra parte, se inicia la implantación y excavación de las casetas de dosificadora de cloro y bodega de químicos.
7. En cuanto al cerramiento perimetral, en el tramo oeste, se inicia la excavación de un tramo de 6,25 metros lineales, además de, realizar la fundición del concreto ciclópeo y la viga de amarre, así mismo, en el tramo este, se culmina la viga de amarre y se inicia con la pega de mampostería e instalación de la tubería Galvanizada.
8. En la estructura del tanque de floculación, se realizó implantación del tanque.

9. Se inicia con la excavación para la instalación de la tubería que conecta el tanque de cloración y el tanque de almacenamiento.

10. En cuanto al componente social, se realiza el sexto (6) comité de sostenibilidad con la participación activa de la Interventoría, Contratista de obra, Emquilichao, Findeter en representación del Ingeniero Paredes y la comunidad. Por otra parte, se realiza recorrido con el Ing. Paredes para verificación del avance físico del proyecto., Así mismo, se realiza séptimo comité de Gestión Social en articulación con Findeter, Contratista de obra e Interventoría.

11. Por otra parte, se realiza reunión con la Alcaldía Municipal de obra, Emquilichao y Contratista de obra para evaluación de aspectos del proyecto.

12. En el componente de seguridad y salud en el trabajo, se verificó la señalización interna en cada uno de los frentes de trabajo, además de, la realización de charlas y/o pausas activas a los trabajadores.

13. El día de 04 de Octubre, se llevará a comité técnico la propuesta de cambio de material de las guillotinas que había propuesto y solicitado el contratista de obra en comités anteriores, además mediante oficio enviado a la interventoría y Findeter el día 31 de Julio de 2024.

14. Durante la semana en mención, no se presentaron acontecimientos que atrasarán y/o afectarán el desarrollo normal de las actividades


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mejorar la instalación de la valla informativa, teniendo en cuenta que, está quede empotrada o fijada a un sistema rígido, evitando de esta manera que, la valla pueda desplomarse, ocasionando algún tipo de accidente o incidente en obra	Contratista de Obra	10/10/2024
2	Recepcionar las facturas actualizadas de las actas parciales tanto de Interventoría como Contratista de obra, ante la Fiduciaria para el pronto desembolso de las mismas.	EMCASERVICIOS	10/10/2024
3	Recepcionar lista con la respectiva información concerniente al personal de la empresa que se	EMQUILICHAO	10/10/2024

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	capacitará para el manejo y/o operatividad de la planta.		
4	solicitar al contratista e inspeccionar que se realicen eficazmente, los resanes y terminaciones finales en cada una de las estructuras ya existentes, además de los corbatines en los pasamuros instalados.	Contratista de Interventoría	10/10/2024

FIRMAS: Reunión Virtual

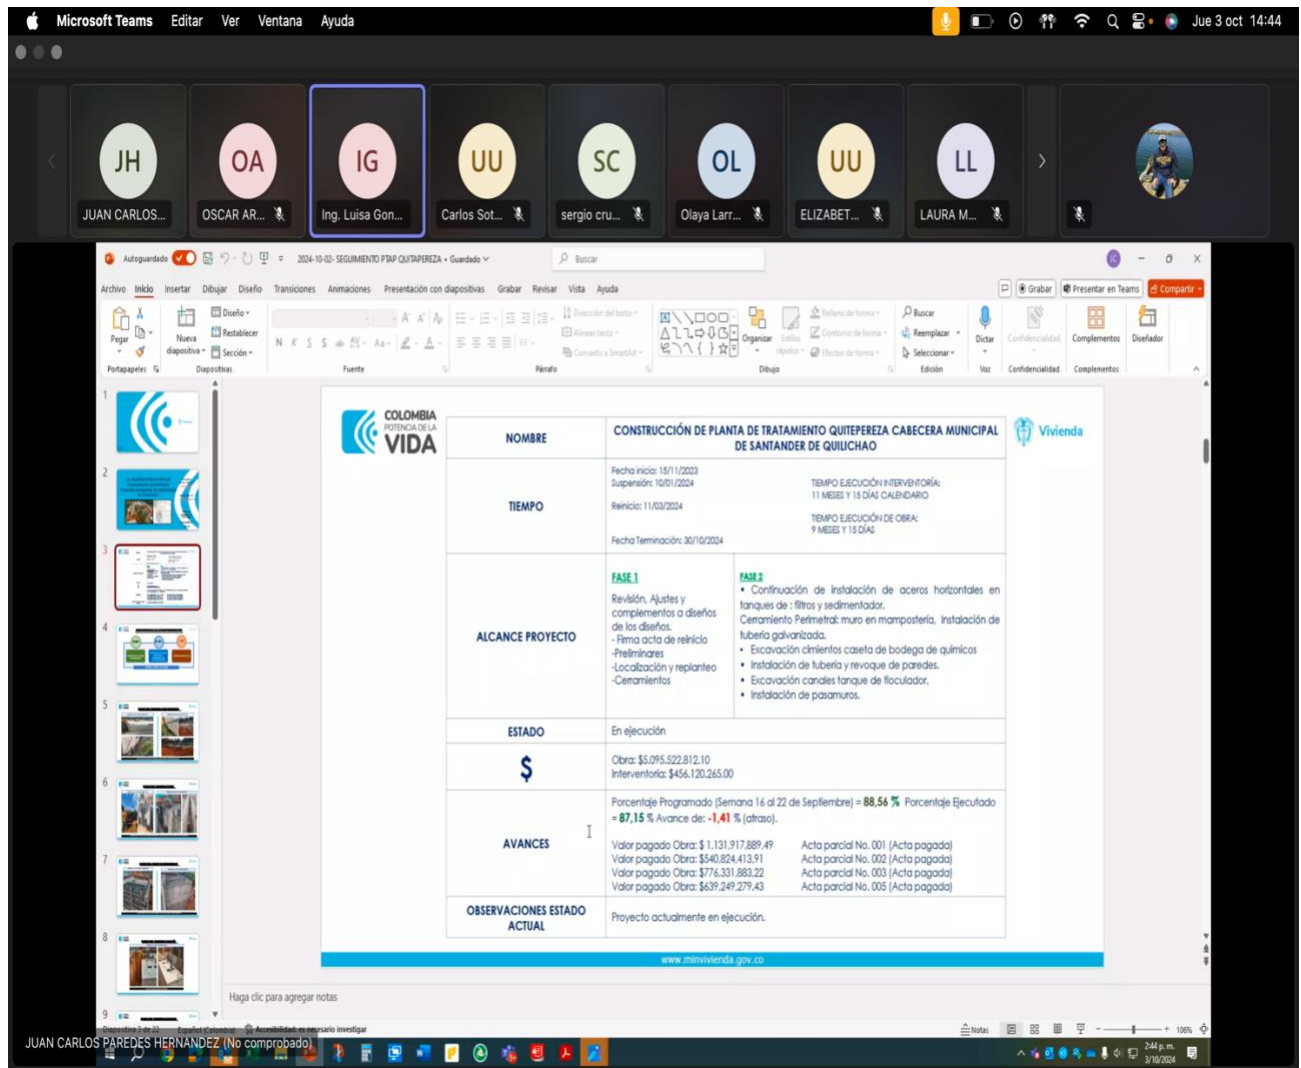

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. At the top, there's a header bar with the Microsoft Teams logo and menu options: Editar, Ver, Ventana, Ayuda. Below this is a grid of participant avatars with initials: JH (JUAN CARLOS...), OA (OSCAR AR...), IG (Ing. Luisa Gon...), UU (Carlos Sot...), SC (sergio cru...), OL (Olaya Larr...), UU (ELIZABET...), LL (LAURA M...). The main window displays a presentation slide from 'COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA' and 'Vivienda'. The slide title is 'CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEPEZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILCHAO'. The slide content includes a table with the following data:

NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEPEZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILCHAO
TIEMPO	Fecha inicio: 18/11/2023 Suspensión: 10/01/2024 Inicio: 11/03/2024 Fecha Terminación: 30/10/2024 TIEMPO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA: 11 MESES Y 13 DÍAS CALENDARIO TIEMPO EJECUCIÓN DE OBRA: 9 MESES Y 15 DÍAS
ALCANCE PROYECTO	FASE 1 Revisión, Ajustes y complementos a diseños de los diseños. -Firma acta de reinicio -Preliminares -Localización y replanteo -Cercamientos FASE 2 • Continuación de instalación de aceros horizontales en tanques de : filtros y sedimentador. Cercamiento Perimetral: muro en mampostería, instalación de tubería galvanizada. • Excavación chimletos caseta de bodega de químicos • Instalación de tubería y revoque de paredes. • Excavación canales tanque de floculador. • Instalación de paramuros.
ESTADO	En ejecución
\$	Obra: \$5.075.522.812,10 Interventoría: \$456.120.265,00
AVANCES	Porcentaje Programado (Semana 14 al 22 de Septiembre) = 88,56 % Porcentaje Ejecutado = 87,15 % Avance de: -1,41 % (atraso). Valor pagado Obra: \$ 1.131.917.889,49 Valor pagado Obra: \$540.824.413,91 Valor pagado Obra: \$776.331.883,22 Valor pagado Obra: \$639.249.279,43 Acta parcial No. 001 (Acta pagada) Acta parcial No. 002 (Acta pagada) Acta parcial No. 003 (Acta pagada) Acta parcial No. 005 (Acta pagada)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Proyecto actualmente en ejecución.

At the bottom of the slide, there's a URL: www.mmvivienda.gov.co. The Teams interface also shows a sidebar with a list of slides and a bottom status bar with the name 'JUAN CARLOS PAREDES HERNANDEZ (No comprobado)'.
