



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	02 de octubre de 2024
HORA:	De 4:30 pm a 5:20 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">1. Plan Departamental de Aguas: Eduardo Sáenz- Apoyo Área Técnica2. Contratos Derivados: Miguel Tamayo- Consorcio Construir 2021 Consorcio Interayapel3. MVCT: William Ricardo Gómez A – Apoyo supervisión del convenio Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

1. Reunión de seguimiento al proyecto Convenio CUR 1134-2020 - ETAPA I DE LA REHABILITACION AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL.
2. Gestiones por tramitar
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se realiza reunión virtual de seguimiento al avance del proyectos.

Desde el PDA, se realiza presentación del estado actual del proyecto, resaltando los siguientes datos relevantes:

- ✓ Fecha Terminación Convenio 18 de diciembre de 2024.

CONTRATOS DERIVADOS

- ✓ Contrato de Obra 186-2021, Fecha de Terminación: 21 de octubre de 2024.
- ✓ Contrato de Interventoría 185-2021, Fecha de Terminación: 21 de octubre de 2024.
- ✓ Avance Físico a 30/09/2024: 98% vs Avance Programado 98%

Desde el PDA se informa que el contratista presentó un Plan de Contingencia como parte de la terminación del proyecto, a fin de culminar las obras pendientes y dentro de las cuales se incluyen las siguientes actividades:

CONDICIONES PLAN DE CONTINGENCIA						
ITEM	ACTIVIDADES	# PROFESIONALES	# OFICIAL	# AYUDANTES	FECHA INICIO	FECHA DE ENTREGA
1	IMPERMEABILIZACIONES TANQUES DE ALMACENAMIENTO		4		13/08/2024	5/10/2024
2	INSTALACION DE MULTIPLES EN CASET EBAP POZO 3	1	1	3	20/09/2024	30/09/2024
3	INSTALACION DE TABLEROS CCM2 POZO 2 Y POZO 3	1	4		18/09/2024	4/10/2024
4	INSTALACION DE TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS	1	4		11/09/2024	27/09/2024
5	INSTALACION DE VALVULAS VENTOSAS Y PURGAS		1	3	30/08/2024	5/10/2024
6	INSTALACION DE HIDRANTES		1	3	25/09/2024	19/10/2024
7	INSTALACION DE MICROMEDIDORES		1	5	20/09/2024	17/10/2024
8	INSTALACION DE PASOS SOBRE PUENTES		1	2	13/09/2024	11/10/2024

Por otra parte se informa que en el aplicativo SIGEVAS se encuentran reportados todos los informes mensuales de Interventoría, así como todos los actos administrativos asociados a los contratos derivados.

Se informa que el estado de las pólizas tramitadas como parte del modificadorio 4 se encuentran en proceso de revisión y se presenta registro fotográfico de las actividades adelantadas como parte de la ejecución del proyecto.

Desde MVCT se resalta la importancia de dar cierre a los permisos y demás gestiones que se hayan adelantado durante el desarrollo del contrato, esto a fin iniciar el proceso para la liquidación respectiva, así como los certificados de funcionalidad del proyecto, de entrega y recibo de las obras por parte del municipio y posteriormente al operador, las pólizas respectivas, manuales de operación y mantenimiento, planos as-built, así como todos los demás que determine el PDA (Ejecutor).

2 Gestiones por tramitar

Desde el PDA se informa está en trámite:

- ✓ Con la CVS está en trámite el permiso de concesión de aguas para operar los pozos subterráneos.
- ✓ AFINIA: Tramitar permisos de energización de los pozos.


Lo anterior es indispensable para poner en operación del proyecto.

Contratista de Obra informa que el día 02 de octubre de 2024 delegado de AFINIA realizó visita técnica al proyecto junto con especialista en redes del contratista, la cual tuvo como objetivo hacer revisión de las obras, y como resultado desde AFINIA realizará un informe técnico con las observaciones a ser atendidas por parte del contratista. Gestiones que están siendo tramitadas de la oficina de Planeación del Municipio.

3 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Gestionar mesa Intersectorial con AFINIA y CVS a fin de revisar el estado de los procesos en desarrollo.	MVCT	07 Oct 2024
2	Proponer nueva reunión de seguimiento frente al Avance, que participe el Municipio.	MVCT	07 oct 2024

FIRMAS:

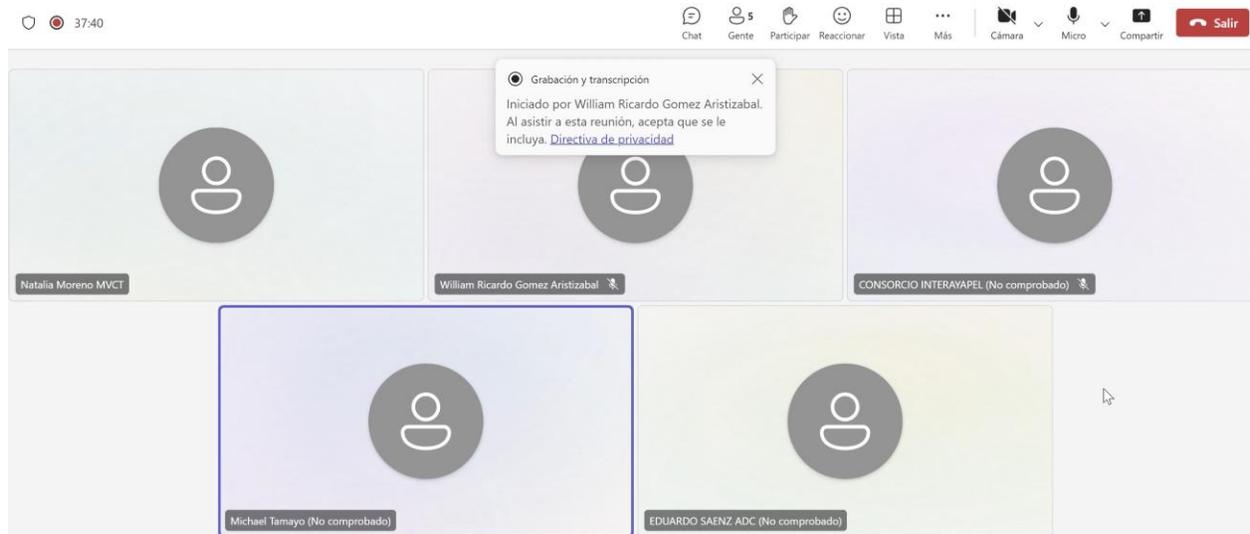

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT
 Revisó: -
 Fecha: 03 de octubre de 2024
