



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de octubre de 2024
HORA:	De 3:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">Plan Departamental de Aguas: Lina Reyes- Apoyo Área Técnica a la supervisión Rubén Ely- Jefe Área TécnicaContratos Derivados Contrato de Obra- Daniel Díaz Contrato de Interventoría- Duván Petro HernándezMVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño - Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

- Mesa técnica de seguimiento al Convenio CUR 897-2021 - OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
- Compromisos.

DESARROLLO:

- Se realiza Mesa técnica de seguimiento virtual de seguimiento al avance del proyecto, de modo que las partes presenten el estado de cumplimiento a los compromisos anteriores:

El PDA remitió el 16 de octubre de 2024 copia a MVCT del comunicado generado por la interventoría que sustenta la solicitud de prórroga, por lo que en la presente mesa técnica Ejecutor e Interventoría explicarán el plan de contingencia asociado a la solicitud de prórroga. (Documentos remitidos al MVCT mediante correo electrónico).

Desde el PDA informan que, con la solicitud de prórroga realizada por parte del contratista y el aval de la interventoría junto con los soportes, esta información



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

que fue tramitada en el área de contratación a fin de elaborar el documento modificadorio de prórroga respectivo, y por tanto, se emitirán previo al 22 de octubre de 2024, fecha actual de terminación.

Por otra parte, contratista de obra e interventoría informan que los empalmes de la tubería de conducción se terminaron y por tanto se cuenta con la conexión desde el tanque de la estación Río Nuevo hasta el tanque existente, incluido el cruce en la vía principal. Quedando pendiente el empalme del tanque Semienterrado, con la alberca de succión, que implica romper el muro de la alberca y usar concreto acelerado para que no se vayan a presentar filtraciones; asimismo, se encuentra por ejecutar el empalme de la tubería de bajada del tanque elevado existente en donde se instalará un macro-medidor. Estas dos actividades ya se encuentran en gestión con la empresa prestadora de agua ya que implica corte del servicio.

Respecto a las actividades establecidas en el Plan de Contingencia a solicitud del MVCT contratista explica que se cuenta con la planeación y logística de esta actividad, y se tiene previsto realizar la fundida de concreto el lunes 21 de octubre de 2024.

MVCT indica que, dentro del plazo de terminación del convenio debe generarse la entrega al municipio y operador. Al respecto, contratista informa que se han empezado gestiones para entrega al operador, coordinando con la empresa las sectorizaciones realizadas donde en acompañamiento del delegado se instalaron las válvulas requeridas. Por lo que de parte de la empresa hay conocimiento de las obras desarrolladas y por tanto solo quedará la entrega formal mediante documentos.

Desde el MVCT se recalca la importancia de que la liquidación de los contratos derivados debe generarse dentro del plazo del convenio, lo cual debe incluir pruebas, entrega al municipio, entrega al operador, certificados de funcionalidad y demás información que requieran de manera específica desde el PDA.

2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Suscribir documentos de prórroga para contratos de obra e interventoría	PDA	22-Oct-2024
2	Ejecutar Plan de Contingencia que soporta la solicitud de prórroga	Contratista e Interventoría	21- Oct-2024



Vivienda

FORMATO: ACTA


PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
3	Programar mesa técnica de seguimiento del proyecto	MVCT	23 Oct 2024

Link de reunión: [Seguimiento convenio CUR 897-2021 Valencia-20241016 151458-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:

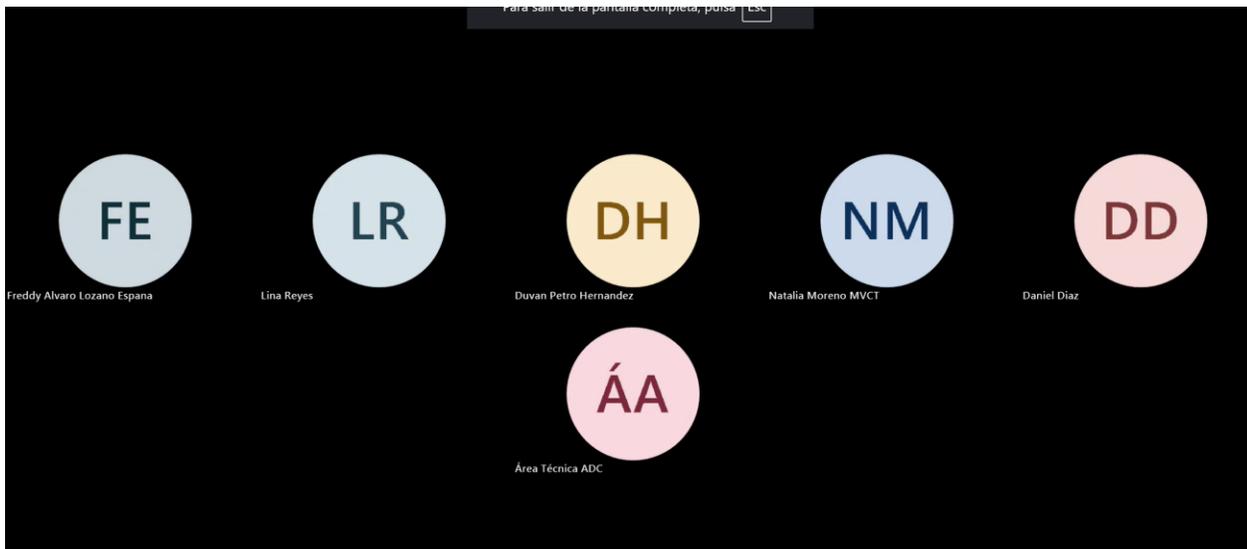

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 18 de octubre de 2024
