



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de octubre de 2024
HORA:	De 3:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">Plan Departamental de Aguas: Lina Reyes- Apoyo Área Técnica a la supervisiónContratos Derivados Contrato de Obra- Daniel Díaz Contrato de Interventoría- Duván Petro HernándezMVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño - Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

- Mesa técnica de seguimiento al Convenio CUR 897-2021 - OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
- Compromisos.

DESARROLLO:

1. AGENDA PROPUESTA

Revisión de compromisos adquiridos en Mesa Técnica de Seguimiento CUR 897-2024 del 16 de octubre de 2024.

Desde el PDA informa que se suscribieron las prórrogas, cuyos documentos se encuentran cargados en el SECOP y en plataforma SIGEVAS, cargados 23 de octubre de 2024.



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Con los documentos modificatorios suscritos, Interventoría realizó solicitud de actualización de pólizas al contratista, las cuales se encuentran en trámite.

- Seguimiento actividades Plan de contingencia.

Interventoría informa que se tenía previsto fundir primera parte del tanque elevado el 21 de octubre de 2024, sin embargo, por problemas con la concretera (disponibilidad de la autobomba) esta actividad se realizó el día 23 de octubre de 2024 en horas de la mañana, interventoría aclara que el atraso no genera afectación en las actividades posteriores planteadas en el Plan de contingencia.

Referente a los empalmes que no requerían corte del servicio ya se realizaron, por lo tanto, se encuentran pendientes el empalme en la PTAP del tanque enterrado nuevo con la alberca de succión de las bombas y el empalme de la salida del tanque elevado existente hacia las redes de distribución. Si bien estas actividades ya se habían gestionado con la empresa operadora, se presentó una fuga la cual fue localizada y atendida, lo que implica que se re programe el corte de servicio, ya que se requiere de socialización con al menos tres días previo a la comunidad. Se resalta que para adelantar estas maniobras es necesario habilitar la tubería de conducción de 14" instalada como parte del proyecto a fin de hacer el bombeo.

Desde el PDA aclara que, según el Plan de contingencia presentado, los empalmes deben quedar finalizados el 26 de octubre de 2024.

Desde el MVCT se solicita a las partes informar si se tienen gestiones o actividades adicionales dentro de la ruta crítica para exponer en la presente mesa técnica, de modo que se pueda adelantar con antelación las respectivas gestiones.

Contratista al respecto informa que a fin de implementar el plan de contingencia dentro de los plazos previstos se realizó la adquisición de materiales, por tanto, para la tubería de acero ya se cuentan con todos los accesorios dispuestos en obra, y para las demás actividades de igual manera se tiene la mayoría de los materiales requeridos, asimismo se está trabajando con concretos acelerados a fin de adelantar los tiempos de fraguado. Así mismo y teniendo en cuenta que se va a usar la tubería de 14" para el bombeo, esto implica adelantar las pruebas frente a la empresa operadora como parte del recibo, tal es el caso que se adelantará en coordinación con el operador la presurización de red hasta el tanque elevado antiguo.



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Desde el MVCT, solicita que si a corte del 31 de octubre de 2024 no se han realizado los empalmes se comunique a las partes, a fin de convocar a la próxima mesa de asistencia técnica a un representante o delegado de la Empresa Aguas de Valencia y poder avanzar en las gestiones del caso.

Desde el MVCT se recalca la importancia de que la liquidación de los contratos derivados debe generarse dentro del plazo del convenio, lo cual debe incluir pruebas, entrega al municipio, entrega al operador, certificados de funcionalidad y demás información que requieran de manera específica desde el PDA. Por lo anterior se recomienda adelantar el proceso de estructuración y elaboración de planos, informes y consolidación de documentos

2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar Pólizas al PDA	Interventoría	24-Oct-2024
2	Enviar Pólizas al PDA	Contratista	-Oct-2024 (Depende de respuesta de aseguradora)
3	Ejecutar empalmes pendientes (Según Plan de Contingencia 26-oct-2024).	Contratista	31- Oct-2024
4	Informar sobre avance en la realización de empalmes a fin de determinar si se requiere convocar a la empresa operadora en la próxima mesa de asistencia técnica.	PDA	01-Nov-2024
5	En caso de no contar con programación de empalmes se deberá citar al Gerente de agua de Valencia	MVCT	01-Nov -2024
6	Entregar como parte del cierre del contrato los soportes de las pruebas realizadas.	Contratos Derivados	Como parte del proceso de entrega.
7	Programar mesa técnica de seguimiento del proyecto martes 06 de noviembre de 2024	MVCT	06- Nov- 2024




Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

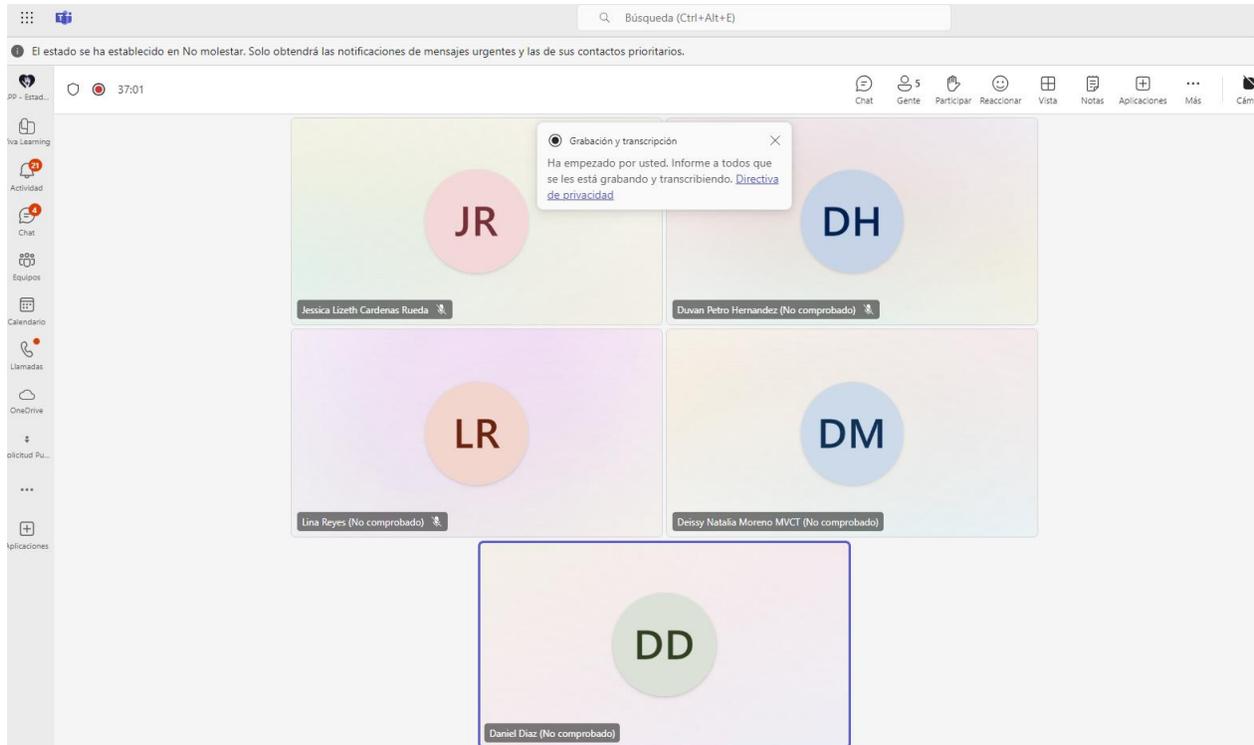

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 28 de octubre de 2024
