



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	06 de noviembre de 2024
HORA:	De 3:00 pm a 3:30 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	- Plan Departamental de Aguas: Lina Reyes- Apoyo Área Técnica Rubén Ely Noriega- Jefe Área Técnica - Contratos Derivados Contrato de Obra- Daniel Díaz Contrato de Interventoría- Duván Petro Hernández - MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento al Convenio CUR 897-2021 - OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
2. Compromisos.

DESARROLLO:

1. AGENDA PROPUESTA

Revisión de compromisos adquiridos en Mesa Técnica de Seguimiento CUR 897-2024 del 23 de octubre de 2024.

- Desde el PDA informa que con motivo de la suscripción de prórrogas, contratista e interventoría remitieron las pólizas, las cuales fueron aprobadas por el ejecutor y se encuentran en cargue a la plataforma SECOP.
- Seguimiento actividades Plan de contingencia- Ejecución de empalmes

Contratista informa que se encuentra en las instalaciones de la empresa operadora, Aguas de Valencia, a fin de coordinar la ejecución de empalmes,



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

indicando que la empresa ha solicitado la puesta en operación de la tubería nueva de conducción para poder realizar los empalmes requeridos, ya que se han presentado algunas contingencias por fugas en la línea actual.

- Estado Pruebas

Contratista informa que de manera paralela a la instalación de la tubería de conducción que ha solicitado la empresa el inicio de operación se fueron adelantando las pruebas que se requerían por tramos según la instalación de accesorios, por lo que a la fecha se adelantan las pruebas al total de tubería de conducción que han generado adelantar algunos trabajos mínimos a fin de poner a punto la infraestructura.

Por otra parte, y como seguimiento al proyecto, PDA informa que el porcentaje planeado corresponde al 90.41% mientras el ejecutado es 91,09% con corte al día de la presente mesa de trabajo. Asimismo, Interventoría informa que en seguimiento al Plan de Contingencia presentado contratista realizó la fundida del primer tramo del tanque elevado en la fecha prevista, la segunda fundida está prevista realizar el 11 de noviembre de 2024.

Contratista de obra indica se presenta restricción para esa fecha en la circulación de vehículos de carga con motivo del Festivo, por lo que se está viabilizando un permiso de circulación especial, o reprogramar la actividad para el día 12 de noviembre de 2024. Desde el PDA solicita evaluar si es posible adelantar la fundida para el viernes 08 de noviembre previo a que inicie la restricción de circulación. Contratista informa se está utilizando concreto acelerado a 7 días.

PDA informa que el desarrollo de actividades está conforme al Plan de Contingencia presentado por el contratista y avalado por la interventoría. Asimismo, se están desarrollando acercamientos con el gerente de las empresas públicas para los empalmes que hacen falta dentro de la planta, y que última fundida está prevista realizarse para el día 26 de noviembre de 2024, y con esto se terminaría esta actividad.

Desde el MVCT se recalca la importancia de que la liquidación de los contratos derivados debe generarse dentro del plazo del convenio, lo cual debe incluir pruebas, entrega al municipio, entrega al operador, certificados de funcionalidad y demás información que requieran de manera específica desde el PDA. Por lo anterior se recomienda adelantar el proceso de estructuración y elaboración de planos, informes y consolidación de documentos, considerando además que la fecha de terminación de los contratos derivados es el 06 de diciembre de 2024.



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL


Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar gestiones de empalmes pendientes (Según Plan de Contingencia 26-oct-2024). Puesta en operación tubería de conducción y pruebas requeridas.	Contratista	12- Nov-2024
2	Seguimiento al avance de tareas definidas en plan de contingencia teniendo en cuenta la fecha de terminación de los contratos derivados 06 de noviembre de 2024.	PDA	11-Nov-2024 (próxima fundida)
3	Programar mesa técnica de seguimiento del proyecto martes 18 de noviembre de 2024	MVCT	12- Nov- 2024

Link de reunión: [Mesa Técnica de Seguimiento CUR 897-2021-20241106 150804-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:

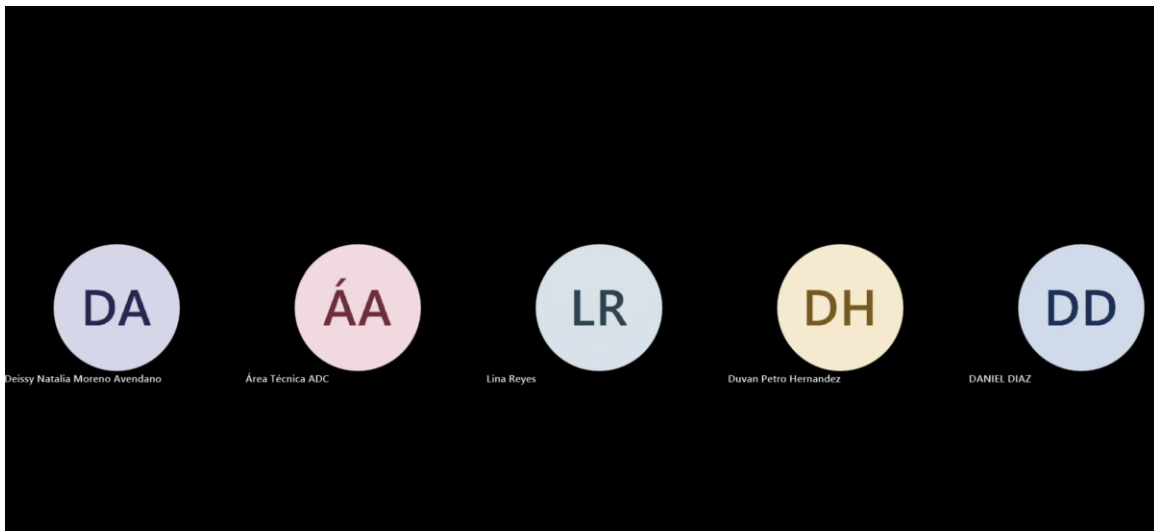

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 11 de noviembre de 2024
