



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

### DATOS GENERALES

FECHA:	12 de noviembre de 2024
HORA:	De 08:00 am a 09:10 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Municipio Ayapel Angela Domínguez- secretaria de Planeación</li><li>2. Plan Departamental de Aguas: Eduardo Sáenz- Apoyo Área Técnica</li><li>3. Contratos Derivados: Michael Tamayo- Consorcio Construir 2021 Barley Irene Banda Nieto- Consorcio Interayapel</li><li>4. MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño - Apoyo supervisión del convenio</li></ol>

### ORDEN DEL DIA:

**1.** Mesa técnica de seguimiento en el marco del desarrollo del Convenio CUR 1134-2020 - ETAPA I DE LA REHABILITACION AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL. -Revisión a compromisos frente a gestiones con la CVS y AFINIA.

- Reporte de visita al proyecto- PDA
- Reporte de Pruebas
- Proceso de entrega a Municipios y empresa Operadora.
- Permiso CVS Concesión de aguas subterráneas
- Permiso AFINIA energización
- Proceso de liquidación contratos derivados PDA



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Seguimiento a compromisos de Mesas Técnica seguimiento 16 de octubre de 2024.

## 2. Compromisos.

### DESARROLLO:

#### 1. Desarrollo de Agenda

- Reporte de visita al proyecto- PDA

Desde el PDA se informa se realizó visita al proyecto en acompañamiento de la Gobernación, la Alcaldía y el PDA a fin de constatar el funcionamiento y operación de la infraestructura construida.

- Reporte de Pruebas

Desde El PDA se informa que como parte del desarrollo de pruebas, se han evidenciado algunas fugas en el sistema que están siendo atendidas por parte del contratista como parte de la puesta a Punto de la infraestructura, y una vez se tengan los ajustes respectivos se procederá con el proceso de entrega al Municipio y a la comunidad.

- Proceso de entrega a Municipios y empresa Operadora.

PDA indica que una vez se tengan los ajustes respecto a las fugas presentadas, se procederá con el proceso de entrega al Municipio y respectivamente a la empresa operadora, por lo que se espera poder entregar el proyecto a finales del mes de noviembre.

Interventoría recalca que se han adelantado trabajos coordinados con la empresa operadora (Administración Pública Cooperativa de Ayapel) como parte del ajuste en las fugas presentadas. De igual manera se está a la espera de realizar capacitación por parte del subcontratista respecto a la operación de los sistemas de cloración.

- Permiso CVS Concesión de aguas subterráneas

Secretaria de Planeación indica aún se está a la espera de que el laboratorio remita los resultados del ensayo de clorofosfato ya que por el procedimiento definido normativamente estos resultados tienen un tiempo establecido en la ejecución. Y una vez se cuente con esta información se procederá a radicar en la CVS toda la información de manera consolidada.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Permiso AFINIA energización

Contratista informa que el día 31 de octubre se recibió visita de delegado de AFINIA, de la cual se está a la espera que se emita el respectivo informe, de tal manera que de generarse observaciones se puedan gestionar respectivamente. Lo anterior teniendo en cuenta que en el recorrido se hicieron algunas observaciones adicionales por lo que el ingeniero del área eléctrica procederá a realizar la subsanación y cargar evidencias de modo que la información quede ajustada el día 13 de noviembre de 2024. Desde MVCT se solicita gestionar de forma que se pueda conocer el acta que generó el delegado de AFINIA frente a la visita realizada.

- Proceso de liquidación contratos derivados PDA

PDA informa que se hizo solicitud tanto al contratista como a la interventoría frente a la documentación requerida como parte del proceso de liquidación; sin embargo, esta información no se ha allegado. Se realizarán los requerimientos del caso. Interventoría indica que se está en proceso de recopilación y organización de la información requerida para entrega a más tardar el día viernes 15 de noviembre de 2024.

- Seguimiento a compromisos de Mesas Técnica seguimiento 16 de octubre de 2024.

Los diferentes compromisos ya fueron tratados en la presente mesa de seguimiento, no obstante, interventoría complementa indicando que respecto al impase presentado con la bomba lapicero 3, se hizo visita de acompañamiento con el proveedor por temas de soporte técnico, y se hicieron los ajustes del caso teniendo en cuenta que existía una desviación en las conexiones al variador de la bomba.

Respecto a la conexión eléctrica provisional contratista indica que para adelantar las pruebas se está operando a través de las plantas de emergencia de energía. Ya que generar una conexión provisional implicaba generar un trámite adicional.

Respecto al informe final de interventoría, y la documentación inicial para iniciar el proceso de liquidación interventoría informa se presentará el día viernes 15 de noviembre de 2024.

Desde el MVCT se recalca la importancia de entregar la documentación dentro de los plazos previstos a fin de hacer la entrega a la Alcaldía y la empresa prestadora y liquidación de los contratos derivados dentro del plazo del convenio. Esto teniendo en cuenta que ya corrió 1 mes desde que se terminó el plazo de los contratos derivados.


Secretaría de Planeación solicita retomar el proceso de verificación de los micromedidores. Desde interventoría se indica se está adelantando el proceso de cierre de las actas de vecindad, por lo que se ha ido subsanando las solicitudes de la comunidad. Se comparte contacto telefónico de la persona que se encuentra en campo para realizar las verificaciones requeridas.

## 2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reportar seguimiento al desarrollo de pruebas y puesta a punto del sistema (por fugas)	PDA- Contratista	Próxima reunión de seguimiento.
2	Dejar las respectivas trazabilidades frente a los ajustes por fugas.	PDA	-
3	Adelantar gestiones para entrega del Proyecto al Municipio y a la empresa operadora	PDA	Finalizando el mes de noviembre
4	Gestionar el desarrollo de laboratorios fisicoquímicos.	Secretaría de Planeación- Ayapel	09 oct 2024
5	Cargar en plataforma subsanación de observaciones adicionales generadas por AFINIA	Contratista	13/Nov/2024
6	Gestionar acta generada por delegado de AFINIA frente a la visita desarrollada.	Contratista	13/Nov/2024
7	Entrega de información recopilada para liquidación.	Interventoría	15/Nov/2024
8	Informe final de Interventoría	Interventoría	15/ Nov/2024
9	Realizar consolidación de documentos como parte del proceso de liquidación	Contratista- Interventoría	Seguimiento en próximo comité
10	Informar programación de capacitación sobre tema de proceso de cloración.	Interventoría-PDA	Según programación
11	Retomar el proceso de verificación de los micromedidores	Alcaldía- Contrato de Obra e Interventoría	Según programación

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
12	Generar acta de Reunión y programar mesa técnica de seguimiento para verificación de compromisos adquiridos.	MVCT	19/Nov/ 2024

**FIRMAS:**

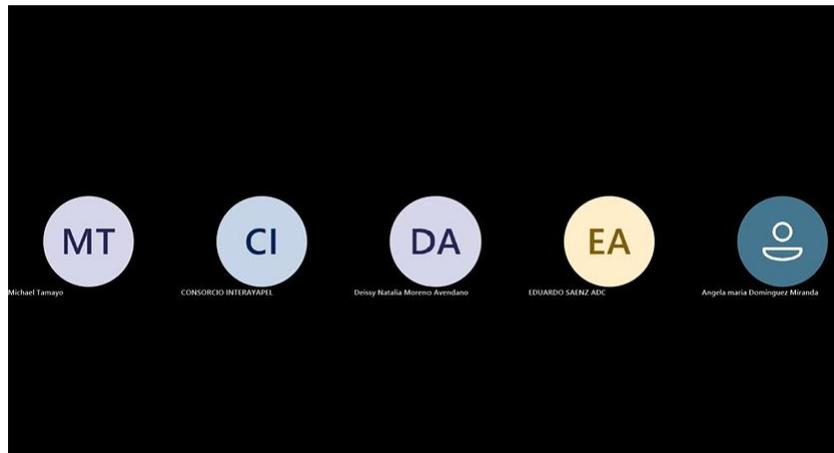

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 18 de noviembre de 2024
