



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de noviembre de 2024
HORA:	De 3:20 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">Plan Departamental de Aguas- Ejecutor: Rubén Ely- Jefe Área Técnica PDA Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisiónMunicipio Cereté- Getulio Padrón San Carlos- Fray Monterrosa AlcaldeContratos Derivados: Consorcio Interacueducto- Coordinador Interventoría Camal Bejarano Consorcio Cereté San Carlos- Contratista de Obra Luis Guillermo GuzmánMVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

- Mesa técnica de seguimiento al Convenio CUR 1095-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
- Compromisos.

DESARROLLO:

- Avance en las gestiones de pruebas y entrega del proyecto al Municipio y empresa Operadora:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Contratista de obra informa no se han realizado pruebas al sistema según lo tratado en mesa previa de seguimiento, al respecto PDA solicita a los delegados de los municipios, Cereté y San Carlos adelantar las gestiones pertinentes a fin de que el operador agilice el proceso de pruebas tanto con el suministro de agua como con el encendido de las bombas.

Delegado de Aqualia informa que la semana pasada se hizo pruebas hacia el sector de las tinajas, la cual será complementada el día de mañana 19 de noviembre de 2024, lo que ha requerido la instalación de accesorios adicionales para garantizar el servicio a todas las viviendas.

Respecto a las pruebas con carga de 16", delegado Aqualia informa que se va a realizar la prueba entre miércoles y jueves de noviembre de 2024. MVCT solicita allegar evidencias que han generado la reprogramación de las pruebas.

MVCT recalca que ya han pasado dos (02) meses desde que se terminaron los plazos contractuales de los contratos derivados sin que a la fecha se hayan terminado las pruebas y se pueda hacer entrega del proyecto a los Municipios y respectivamente a la empresa operadora. Por lo que solicita al ejecutor iniciar las acciones requeridas para cumplir con las actividades dentro de los plazos previstos.

Alcalde del Municipio de San Carlos indica que si bien no se había conectado a las reuniones previas de seguimiento, se cuenta con el conocimiento del alcance ejecutado y se estará atento a la puesta en operación y prestación de servicio a la comunidad.

2. Respecto a los compromisos planteados en la mesa anterior:


1. Desde el MVCT se realizó programación de la presente mesa de trabajo en la cual se invitó a los Municipios de Cereté, San Carlos y delegado de la empresa Operadora Aqualia.
2. Frente a los certificados de paz y salvo de parafiscales se mantiene como faltante por parte del contratista el certificado de Fondo de la Industria y la Construcción – FIC que expide el SENA. Al respecto contratista informa que se hará entrega el día miércoles 22 de noviembre de 2024.

2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Reporte de resultado de pruebas sector las Tinas	PDA	19/Nov/2024
2	Desarrollo de pruebas de carga	Contratista- Interventoría Aqualia Municipio	20- 21/Nov/2024
3	Presentar trazabilidad en gestiones de Pruebas	PDA	22/Nov/2024
4	Complemento de certificados de Paz y Salvo de Parafiscales (Fondo de la Industria y la Construcción – FIC) que expide el SENA.	Contratista de Obra	22- Nov- 2024
5	Citar comité de seguimiento	MVCT	27/Nov/2024

Link de grabación: [Convenio 1095-2020 Cereté- San Carlos Mesa Técnica de Seguimiento-20241118 152541-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:

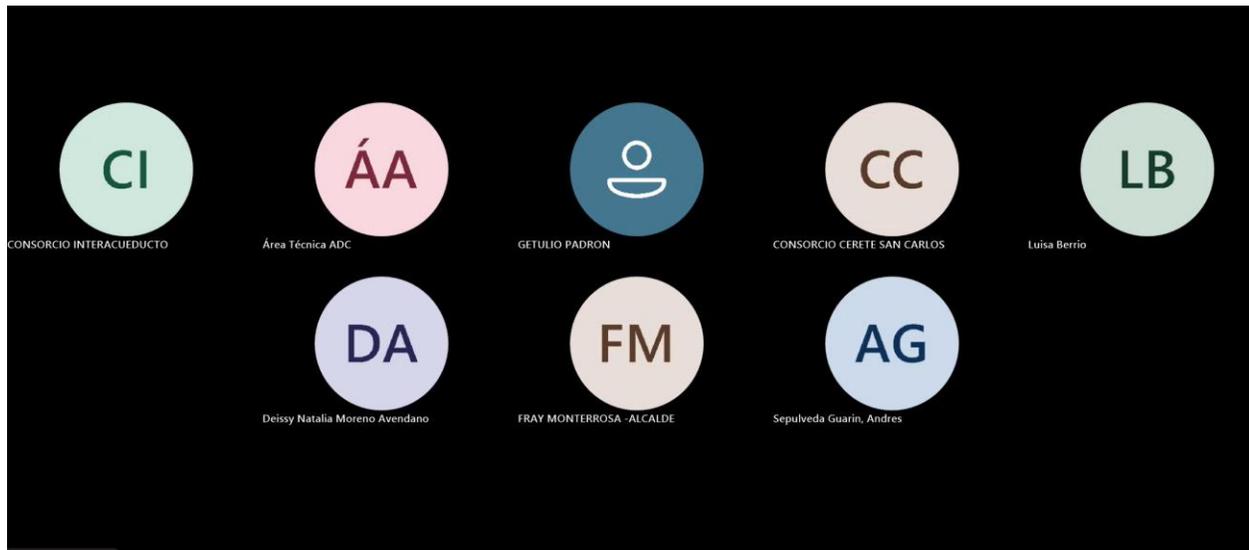

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT
 Revisó: -
 Fecha: 21 de Noviembre de 2024
