



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 08 DE NOVIEMBRE DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	8 de noviembre de 2024
HORA:	De 8:00 am a 9:00am
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Juan Carlos Paredes - Ing. Supervisión FINDETER Fernanda Villegas – Auxiliar de Obra Grupo More Oscar Aranda – Director Grupo MORE Jader Carbonero – Contratista Obra Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Obra Grupo MORE Carlos Soto - Interventoría INTER JCD Luisa González - Contratista Interventoría INTER JCD Mario Triana – SST Interventoría Jesús Ruiz - Supervisión EMCASERVICIOS S.A Carlos Zapata – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas - Apoyo EMCASERVICIOS S.A Olaya Larrahondo - Emquilichao E.S.P Edwin Salcedo – Municipio de S. de Quilichao
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El día de 8 noviembre de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Informe de avance del contrato de obra PAT-ATF-O-043-2023
4. Compromisos

DESARROLLO:

Inicia la presentación del avance de obra mediante la proyección simultanea de diapositivas, en lo cual se evidencia en el periodo semanal comprendido entre el 28 de octubre al 3 de noviembre, los porcentajes de avance de obra corresponde a los siguientes:

1. Porcentaje de obra programada esta semana es del 98%.

2. Porcentaje de obra ejecutado y aprobado por la Interventoría es de 98,20%, con lo cual, se tiene un adelanto de 0,20%.

LAS ACTIVIDADES EJECUTADA EN OBRA DURANTE LA SEMANA EN MENCIÓN, SON:

1. En la estructura del tanque de almacenamiento: se realiza armado de la caja de entrada y fundición de la losa de fondo del elemento.
2. En la estructura correspondiente al Tanque de Filtros, se realizó el armado y fundición de pasarelas para la instalación de los vástagos que complementan las guillotinas y compuertas en el tanque, así como, la instalación de las mismas, e inicio encofrado para el bordillo en accesos internos de la estructura.
3. En cuanto al Tanque de sedimentador, se efectúa la instalación de las compuertas en la caja que conecta la estructura con el canal de floculación, además de, la zona de salida que conecta con la estructura de filtros. Por otro lado, se realizó la conformación de las vigas para el canal de desagüe de lodos.
4. En la estructura del Tanque de Floculación, se realiza el 06 de noviembre la fundición de los muros de la estructura, y posteriormente, el día 07 se inicia con el desencofrado de los mismos.
5. Para la jornada de fundición del 06 de noviembre, se utilizó un total de 32.50 m³, los cuales, se distribuyeron, de la siguiente manera: se destinó 29,07 m³ de concreto premezclado para los muros del tanque de floculación, 2,17 m³ para la losa de contrapiso y 1,26 m³ para la losa de fondo de la caja de entrada del tanque de almacenamiento., al concreto, se le realizó las respectivas pruebas y ensayos de calidad.
6. En la estructura del Tanque de Cloración, se efectúa la fundición de la losa de cierre superior de la caja de inspección de la zona del vertedero, así mismo, se realiza encofrado para fundición de bordillo para los accesos internos de la losa superior de cierre.
7. Consecuentemente, en la zona destinada para la dosificadora de cloro, se continuó con la pega de mampostería en la zona inmediatamente superior a la viga aérea, así mismo, se inicia con el revestimiento con mortero en las paredes internas, por otra parte, se realiza adecuación del terreno e instalación de malla electrosoldada de diámetro 5.5mm, y consecuentemente, la conformación de la losa de contrapiso. Así mismo, la instalación de la tubería y tablero para el sistema eléctrico.
8. En cuanto a, la caseta de Oficina y Vestier, se culmina con la instalación de la teja termoacústica para la cubierta, adicional a esto, se inicia la instalación de las puertas metálicas, y tubería en la zona de la cubierta donde se dispondrá el cielo falso. Con

respecto al Laboratorio, se continua con la pega de mampostería e instalación de tubería para sistema eléctrico.

9. Con respecto a la bodega de químicos, se realizó la conformación de la viga aérea, así como, la continuación de mampostería en la zona superior, de igual manera, se realiza instalación de tubería para sistema eléctrico.

10. En cuanto al cerramiento perimetral, se continua con la conformación de la alfajía en concreto.

11. Con respecto al suministro de materiales, el día 02 de noviembre llegó tubería proveniente de la empresa PAVCO, así mismo, el 04 de noviembre llegan 7 puertas metálicas para la caseta de oficina y Vestier, el día 07 de noviembre llegan 7 postes en concreto de 9 metros de altura, los cuales, se realiza su instalación el mismo.

12. En cuanto al componente de seguridad y salud en el trabajo, se continua con la realización de charlas al personal, en cuanto, a el uso y cuidado de Epps, así mismo, se verifica la documentación de los vehículos y maquinaria que se emplearon en la jornada de fundición del día 06 de noviembre.

13. En cuanto al componente social, el día 02 de noviembre se lleva a cabo el séptimo (7) comité de sostenibilidad en conjunto con la comunidad, así mismo, se remite la respuesta a la Sra. Florinda Casamachi y se hace entrega de la misma a la señora, así mismo, se realiza reunión con la Sra. Laura Salazar para para coordinar actividades de apropiación de la obra.

14. Las entidades involucradas del proyecto, realizaran visita al lugar de ejecución de obra (fecha tentativa entre el día 19 o 20 de noviembre).

15. En el comité de sostenibilidad la comunidad expresa inquietudes que continúan con respecto al suministro del agua tratada, por lo cual, la entidad de Emquilichao manifiesta que, estas se aclararan en la reunión que se realizará con la comunidad, donde se socializará el trazado para la vereda de Quitapereza, en el cual, también expresa que el contrato de consultoría ya se firmó.

16. La entidad Emcaservicios manifiesta que la Fiduciaria para la entidad hace cierre hasta el día 20 de noviembre, por lo cual, los saldos pendientes de contratista de obra e Interventoría, se deben tramitar antes de la fecha, teniendo en cuenta, el tiempo de proceso de revisión y radicación de las actas parciales.


17. Las actas parciales de Interventoría y contratista de obra, no se presentarán en este mes en el PDA, el saldo de facturará en el mes de diciembre (sin embargo, se revisará la circular de la fecha de cierre para el trámite).

18. Durante la semana en mención, no se presentaron acontecimientos que atrasarán y/o afectarán el desarrollo normal de las actividades

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Notificar al municipio y a la secretaría de Planeación e Infraestructura el caso de la Sra. Florinda Casamachi.	Contratista de Obra, Interventoría	15/11/2024
2	Remitir la circular interna con la notificación donde se define la fecha de trámite de pago hasta el 20 de noviembre para vigencia anual.	EMCASERVICIOS	12/11/2024
3	El contratista deberá recepcionar a la Interventoría el manual de operaciones de cada estructura.	EMQUILICHAO	22/11/2024
4	El contratista de obra, este encargado de realizar la reinstalación de la valla informativa.	Contratista de Obra	15/11/2024
5	Programar prueba de estanqueidad y extender la invitación a los entes involucrados del proyecto para su participación y constatación.	Contratista de obra e interventoría	22/11/2024

FIRMAS: Reunión Virtual

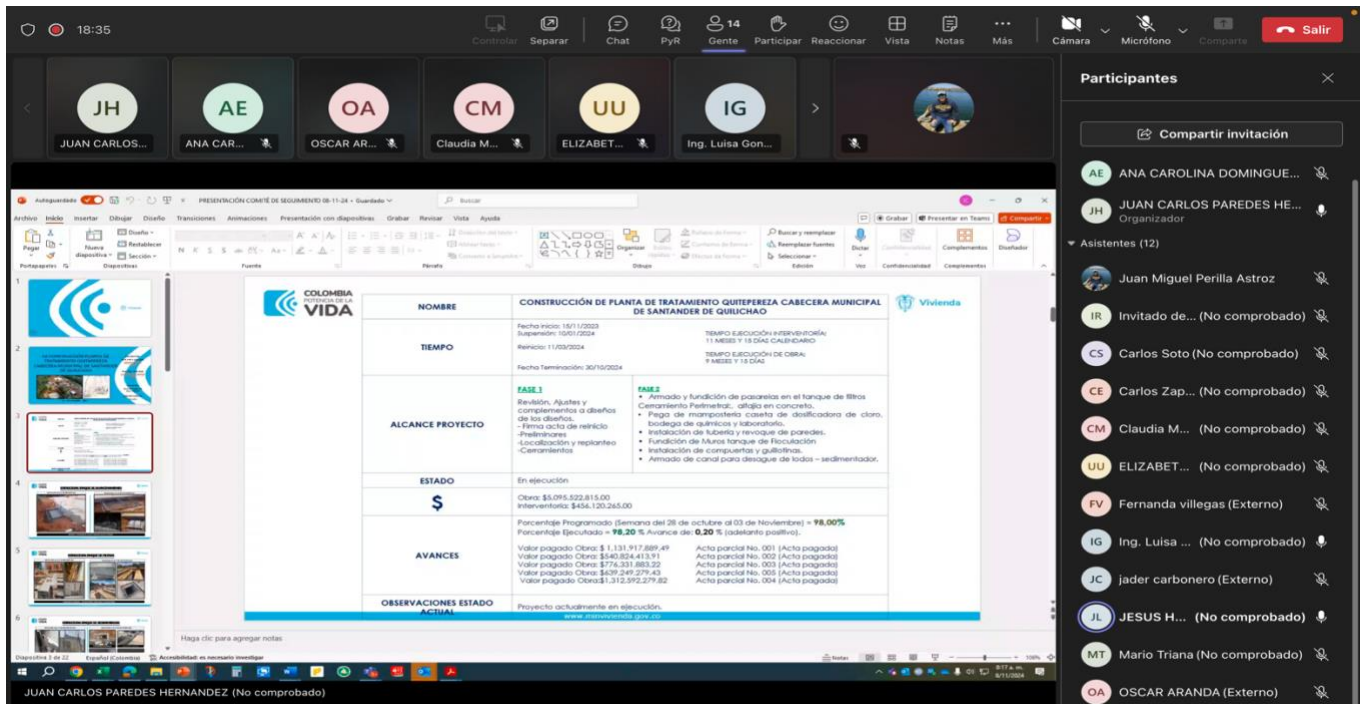

The screenshot shows a virtual meeting interface with a top bar containing icons for various functions like 'Controlar', 'Separar', 'Chat', 'PyR', 'Gente', 'Participar', 'Reaccionar', 'Vista', 'Notas', 'Más', 'Cámara', 'Micrófono', 'Compartir', and 'Salir'. Below the top bar, there is a row of participant avatars with initials: JH (JUAN CARLOS...), AE (ANA CAR...), OA (OSCAR AR...), CM (Claudia M...), UU (ELIZABET...), and IG (Ing. Luisa Gon...). To the right, a 'Participantes' panel lists participants and assistants, including ANA CAROLINA DOMINGUE..., JUAN CARLOS PAREDES HE..., and others. The main area displays a presentation slide titled 'CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO GUITEPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO'. The slide contains a table with project details:

NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO GUITEPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO
FECHA INICIO	18/11/2023
SUSPENSIÓN	16/05/2024
FECHA TERMINACIÓN	30/10/2024
FECHA INICIO	18/11/2023
FECHA TERMINACIÓN	30/10/2024
ALCANCE PROYECTO	FASE 1 - Revisión, Ajustes y complementos a diseños de los diseños. - Emisión acta de inicio. - Inspección y replanteo. - Cimentación. FASE 2 - Armado y fundición de pilas en el tanque de filtros. - Cimentación Perimetral, aligro en concreto. - Pago de mampostería casado de clasificadora de cloro. - Botadero de químicos y laboratorio. - Instalación de tubería y revestido de paredes. - Fundición de Muros tanque de floculación. - Instalación de compuertas y guías. - Armado de canal para desague de todos - sedimentador.
ESTADO	En ejecución
\$	Obra \$5,095,022,815.00 Interventoría \$434,120,265.00 Porcentaje Programado (Semana del 26 de octubre al 03 de Noviembre) = 98.00% Porcentaje Ejecutado = 98.20 % Avance de 0.20 % (adelanto positivo).
AVANCES	Valor pagado Obra \$ 1,131,917,889.49 Valor pagado Obra \$540,824,413.91 Valor pagado Obra \$776,331,883.22 Valor pagado Obra \$437,247,279.43 Valor pagado Obra \$1,312,392,279.82 Acta parcial No. 001 (Acta pagada) Acta parcial No. 002 (Acta pagada) Acta parcial No. 003 (Acta pagada) Acta parcial No. 004 (Acta pagada)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Proyecto actualmente en ejecución.
