



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 **Fecha:** 10/07/2024 **Código:** GDC-F-01

ACTA No. --

DATOS GENERALES

FECHA:	20 de diciembre de 2024
HORA:	De 11:00 a 12:00pm
LUGAR:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT»
ASISTENTES :	ACUATODOS S.A. E.S.P. MUNICIPIO MONTERREY (CASANARE)
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB» - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial «DIDE» - Subdirección de Proyectos «SP». Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1109 de 2020. SIGEVAS 2-2019-99. Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA Casanare. Proyecto Construcción Planta de Tratamiento de Agua Residual y Optimización de Alcantarillado Sanitario, Centro Poblado de Villacarola Municipio Monterrey (Casanare).

Avance de obra.

DESARROLLO:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT» inicia su intervención, efectuando una presentación de las partes intervinientes en la mesa de trabajo.

Por parte del Municipio, participa el señor Nelson Carranza. Por parte de Acuatodos, la Ing. Andrea Acevedo.

El MVCT solicita conocer que frentes de obra se encuentran activos, dado que el reinicio del contrato de obra sucedió el pasado 20 de noviembre de 2024.

El Ejecutor reporta que se trabaja en la tubería del emisario final que se ubica aguas abajo de la vía intermunicipal.

MVCT solicita conocer información más actualizada acerca de la renovación del permiso de Corporinoquia, a lo cual el Municipio gestionará para que la autoridad ambiental se pronuncie antes del 31Dic2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 **Fecha:** 10/07/2024 **Código:** GDC-F-01

MVCT solicita que se cargue en Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico «SIGEVAS», el Informe Mensual Ejecutor del mes de noviembre de 2024, el cual se encuentra pendiente a la fecha. El Ejecutor se compromete a su cargue antes del 24Dic2024.

MVCT solicita conocer el estado de los modificatorios contractuales de adición que hayan sido practicados a los contratos de obra e interventoría de obra, pr cuanto el Consorcio FIA (Fiduciarias Bancolombia, BBVA Asset Management y Fiduciaria Bogotá), ya expidió los Certificado de Registro «CDR» de las reformulaciones 1 y 2.

El Ejecutor reporta que el 27Nov2024 fueron suscritos dichos contratos adicionales, y que también se cuenta con pólizas de cumplimiento actualizadas.

MVCT solicita conocer estado actualizado del permiso subvial ANI. El Ejecutor recuerda que este trámite comienza con una visita de la ANI, de la cual se deriva un Acta y un aval para que el Municipio proceda a la compra de las pólizas de garantía. Con estas pólizas, se firma un Acta de Inicio de Obra, en la cual se dan 45 días calendario para que se construyan. Según Cronograma de Obra, se espera que hacia finales de febrero de 2024 se inicien estos trabajos.

MVCT también recuerda que se encuentran pendiente el reintegro de los Rendimientos Financieros «RF» de la fiducia del Anticipo, los cuales fueron erradamente reintegrados al Patrimonio Autónomo FIA. El Constructor se compromete a practicar correctamente este reembolso a mas tardar el 31Dic2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha Límite de Cumplimiento
1	Reintegro de los RF del Anticipo	Constructor	31Dic2024
2	Inf. Mensual Ejecutor Nov-2024	Ejecutor	24Dic2024




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 **Fecha:** 10/07/2024 **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:

Listado de Asistencia

Elaboró: Ing. Alex Duque - Seguimiento

LISTADO DE ASISTENCIA

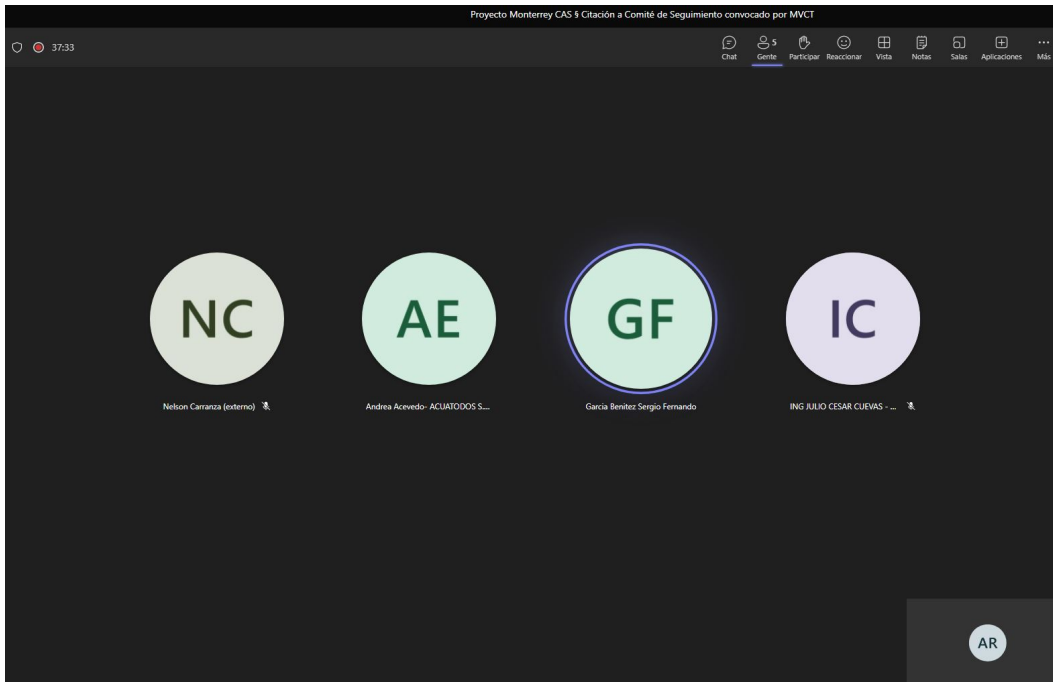



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 **Fecha:** 10/07/2024 **Código:** GDC-F-01
