



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 8 - DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 20 de Diciembre de 2024.
HORA:	2:00 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto "OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"

DESARROLLO:

reunión programada por la Contraloría General de la Nación.

Se inicia la reunión con presentación por parte de la Contraloría indicando que el proyecto se encuentra en observación teniendo en cuenta que se tiene un avance ejecutado del 37,16% y fecha de terminación el 16 de octubre de 2024.

La Contraloría cede la palabra al Ing. Jorge Rojas, apoyo a la supervisión del Ministerio quien aclara a la contraloría que la información que tienen no es la correcta de acuerdo a lo siguiente:

1. El 29 de noviembre de 2024 se recibe informe semanal No. 27 del 18 al 24 de noviembre de 2024 con avance físico del 65,05% contra un programado del 64,48% Durante esta semana se realizaron actividades de excavación, instalación de tubería, rellenos 2. Se realiza el traslado de la tubería y accesorios del punto almacenamiento hasta la zona de intervención de difícil acceso 3. Se realiza la instalación de accesorios codos en HD, uniones y la construcción de sus atraques en concreto 4. Se realizan las buenas prácticas de instalación de la tubería de PVC de 20", utilizando lubricantes especiales para el acople entre espigo y campana

2. La nueva fecha de terminación de los contratos derivados es el 16 de febrero de 2024 de acuerdo con la siguiente trazabilidad:

DESCRIPCION	ACTA-PRORROGA -OTROSI	TIEMPO (Mes)	DE	HASTA	FECHA NUEVA DE TERMINACION
INTERV. 317/2021	Acta de suspensión No.1	0,6	22/03/2024	8/04/2024	12/08/2024
	Prorroga No. 1 Acta de suspensión No.1	2	9/04/2024	9/06/2024	12/10/2024
	Acta de reinicio		10/06/2024	16/10/2024	16/10/2024
	Prorroga No. 2	4	16/10/2024	16/02/2025	16/02/2025
OBRA - 316/2023	Acta de suspensión No.1	0,5			12/08/2024
	Prorroga No. 1 Acta de suspensión No.1	2	9/04/2024	9/06/2024	12/10/2024
	Acta de reinicio		10/06/2024	16/10/2024	16/10/2024
	Prorroga No. 2	4	16/10/2024	16/02/2025	16/02/2025
CONVENIO- 1371-2023	OTROSI No.1	7	1/06/2024	31/12/2024	31/12/2024

El ministerio solicita a la Contraloría actualice los datos que tienen con la información suministrada.

Se realiza presentación del proyecto en donde el Ministerio a través del registro fotográfico informa de los inconvenientes y retrasos presentados por las condiciones de acceso al sitio de trabajo y la incomodidad en la ejecución de las obras por estar en zona de camino de ancho de 1,50 mts de ancho y talud de montaña al lado izquierdo que necesita tablestacado y talud al lado derecho que conecta con el rio, haciendo la labor muy lenta y peligrosa, lo anterior hace que el contratista tenga un bajo rendimiento de obra y se amplie los plazos de ejecución.

Se informa por parte del Ministerio que la información solicitada por la Contraloría fue remitida por Piedecuestana el 20 de diciembre de 2024.


COMPROMISOS (Si aplica)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	información solicitada por Contraloría	Piedecuestana	20-12-2024
2	Reunión tercera semana enero 2025	Contraloría MVCT-Piedecuestana	Tercera semana enero 2025

FIRMAS:

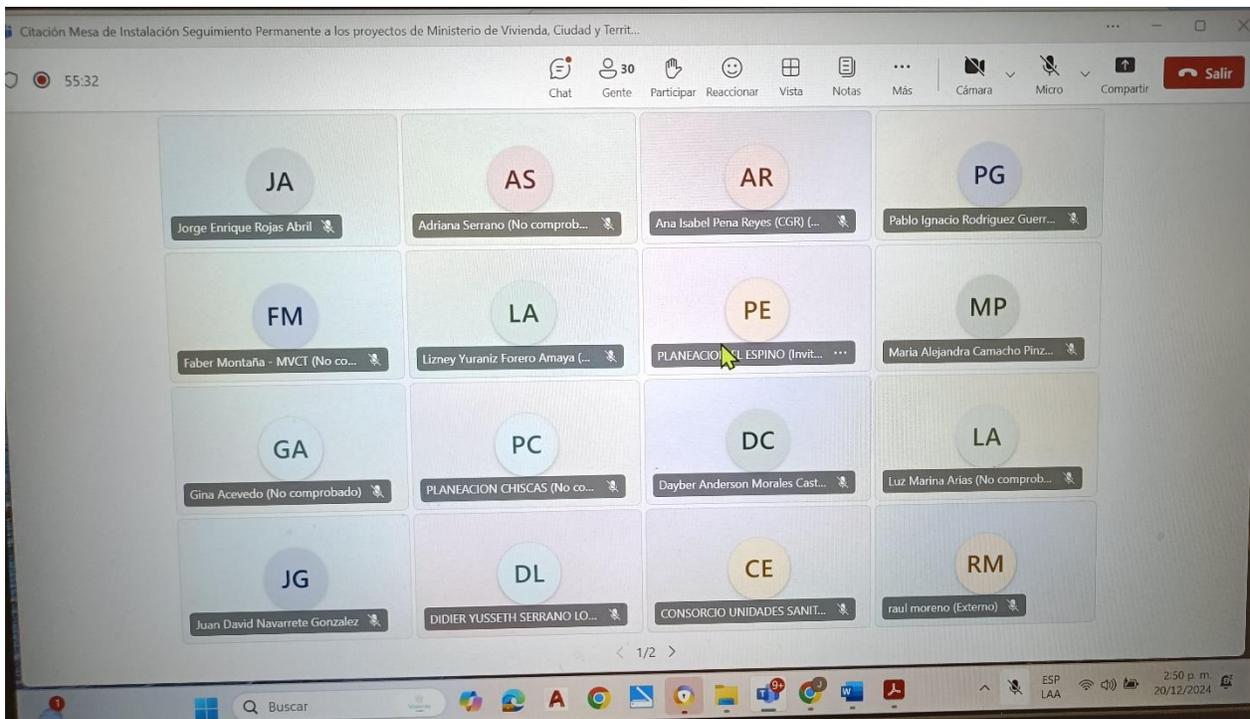

Anexos: (Opcional)

Elaboró: JORGE ROJAS
Fecha: 20-12-24
